




编号: LZGF-JLYB-003

监 理 月 报

工程名称: 常州金坛禾一新能源有限公司建设贝特瑞(江苏)新材料科技有限公司屋顶 4.8MW 分布式光伏电站一期

2020 年 3 月第 1 期

项目监理部(章):



总监理工程师: 刘士发

报告日期: 2020 年 3 月 31 日



扫描全能王 创建

监 理 月 报

工程名称：常州金坛禾一新能源有限公司建设贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司屋顶 4.8MW 分布式光伏电站一期

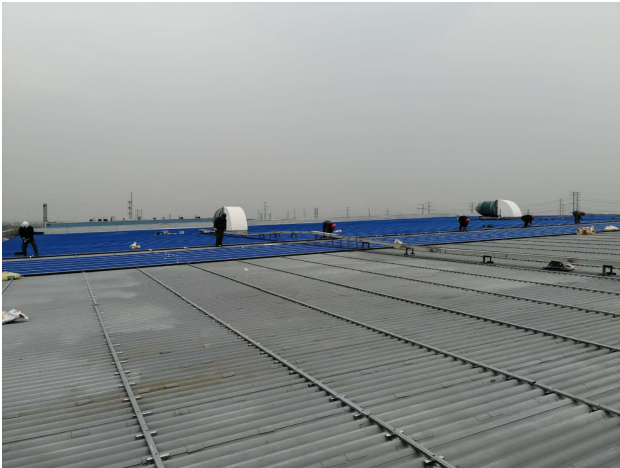
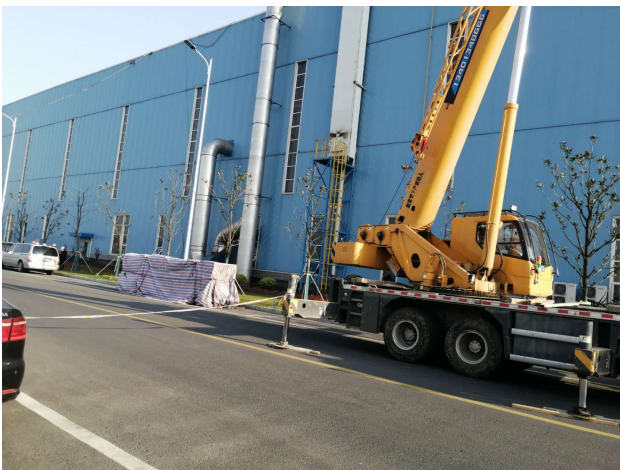
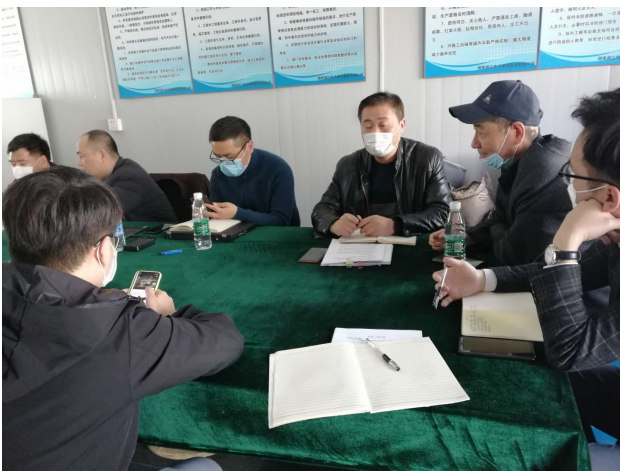
开始时间： 2019 年 12 月 30 日

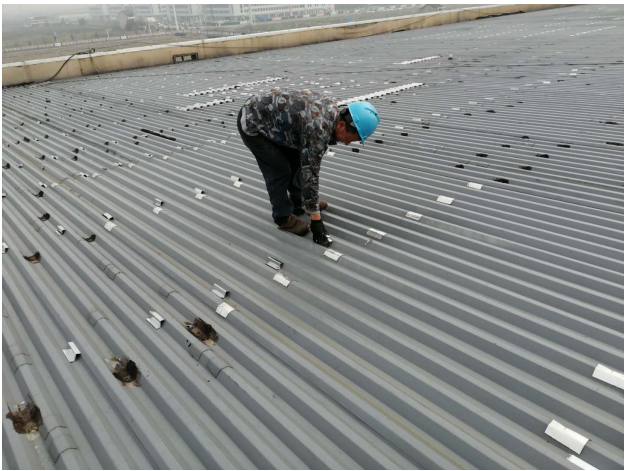
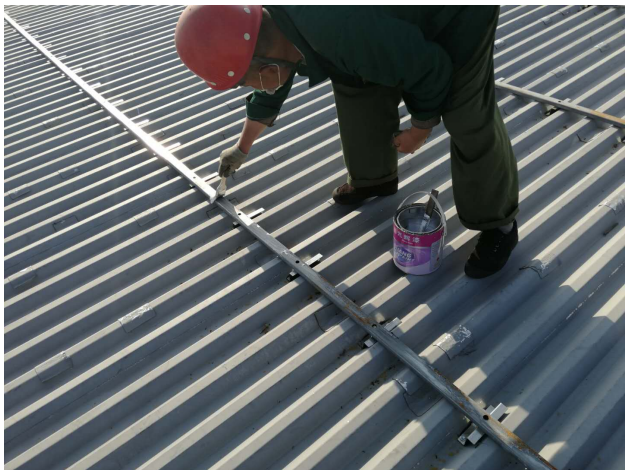
监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司

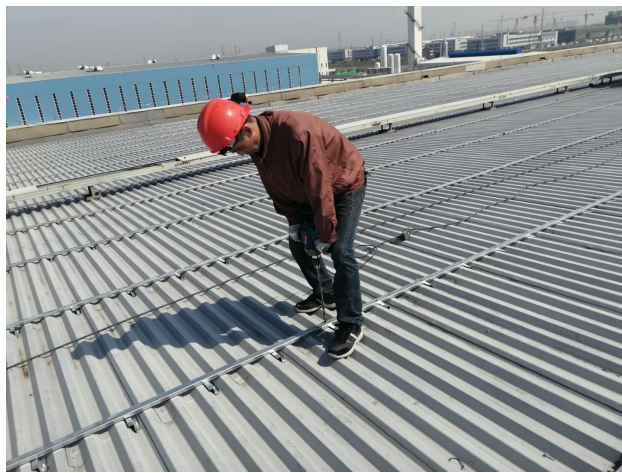
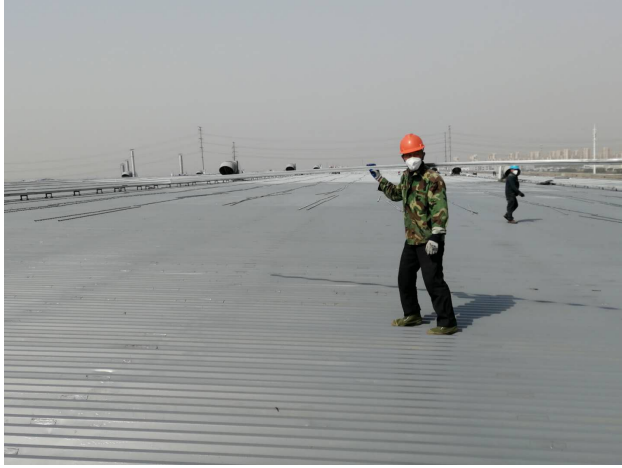
一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工单位名称	资料类型	资料数量	备注
1	常州金坛禾一新能源有限公司建设贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司屋顶 4.8MW 分布式光伏电站一期	江苏天目建设有限公司	影像	80 张	

二、监理重点工作情况

专 业	事 项	本月重点工作情况	下月重点工作 计划
进 度	  	1、1#楼南坡已完成覆盖彩钢瓦 100%，风机口防水处理已完成 100%。 2、1#楼北坡已完成安装 Z 型支架、固定檩条 100%，现已开始覆盖彩钢瓦。到本月底完成 30%。 3、完成对缺少的办公用品进行补齐与办公用品的放置。 4、本月召开 1 次开工启动会，2 次监理例会，并将资料打印，上次传至监理云平台。 4、本月进行彩钢瓦吊装 3 次，4#楼檩条吊装 1 次，已做好安全旁站记录，并将资料打印，上传至监理云平台。监理对施工现场覆盖彩钢瓦每天巡视并做好旁站。 5、本月监理完成对 1#楼南坡的初步验收。 6、本月提出工程中的安全问题需极度重视。对现场临时用电的电缆线禁止私	对光伏区道路进行优化。对陆续进场的光伏支架材料、以及电缆进行施工，做好对施工过程中各隐蔽工程的旁站，安全旁站进行，每天坚持巡视项目施工点，做好检查记录等工作。

	  	拉乱接、宿舍内的临时用电安全、以及施工现场安全。 8、前期策划文件等报审资料不足,已下发联系单002,等待施工方提交、报审。 9、本月发出监理工作联系单 1 份、监理通知单 3 份。	
--	--	--	--



安	 		
	材料、设备交付进度	本月进场材料彩钢瓦,z型垫片, 监理方已到场验收, 先仍缺失材料出厂证明, 合格证	
	设计交付进度	未完成	
	施工图会审	未完成	
	设计交底	未完成	
	方案审查	未完成	
	技术交底	未完成	
	设计变更		
安	安全培训情况		
