



正衡监理

编号：DLMP-ZHJL-YB-01

监 理 月 报

工程名称：合肥大陆马牌轮胎（中国）有限公司 8.3MW 分布式光伏发电项目

2020年4月

项目监理部（章）：

总监理工程师： 刘士发

报告日期：2020年4月30日

监 理 月 报


工程名称: 合肥大陆马牌轮胎(中国)有限公司 8.3MW 分布式光伏发电项目 月次 第 1
次

月报开始时间 2020 年 4 月 1 日 结束日期 2020 年 4 月 30 日

监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	合肥大陆马牌轮胎(中国)有限公司 8.3MW 分布式光伏发电项目		照片	19	进度、质量、安全

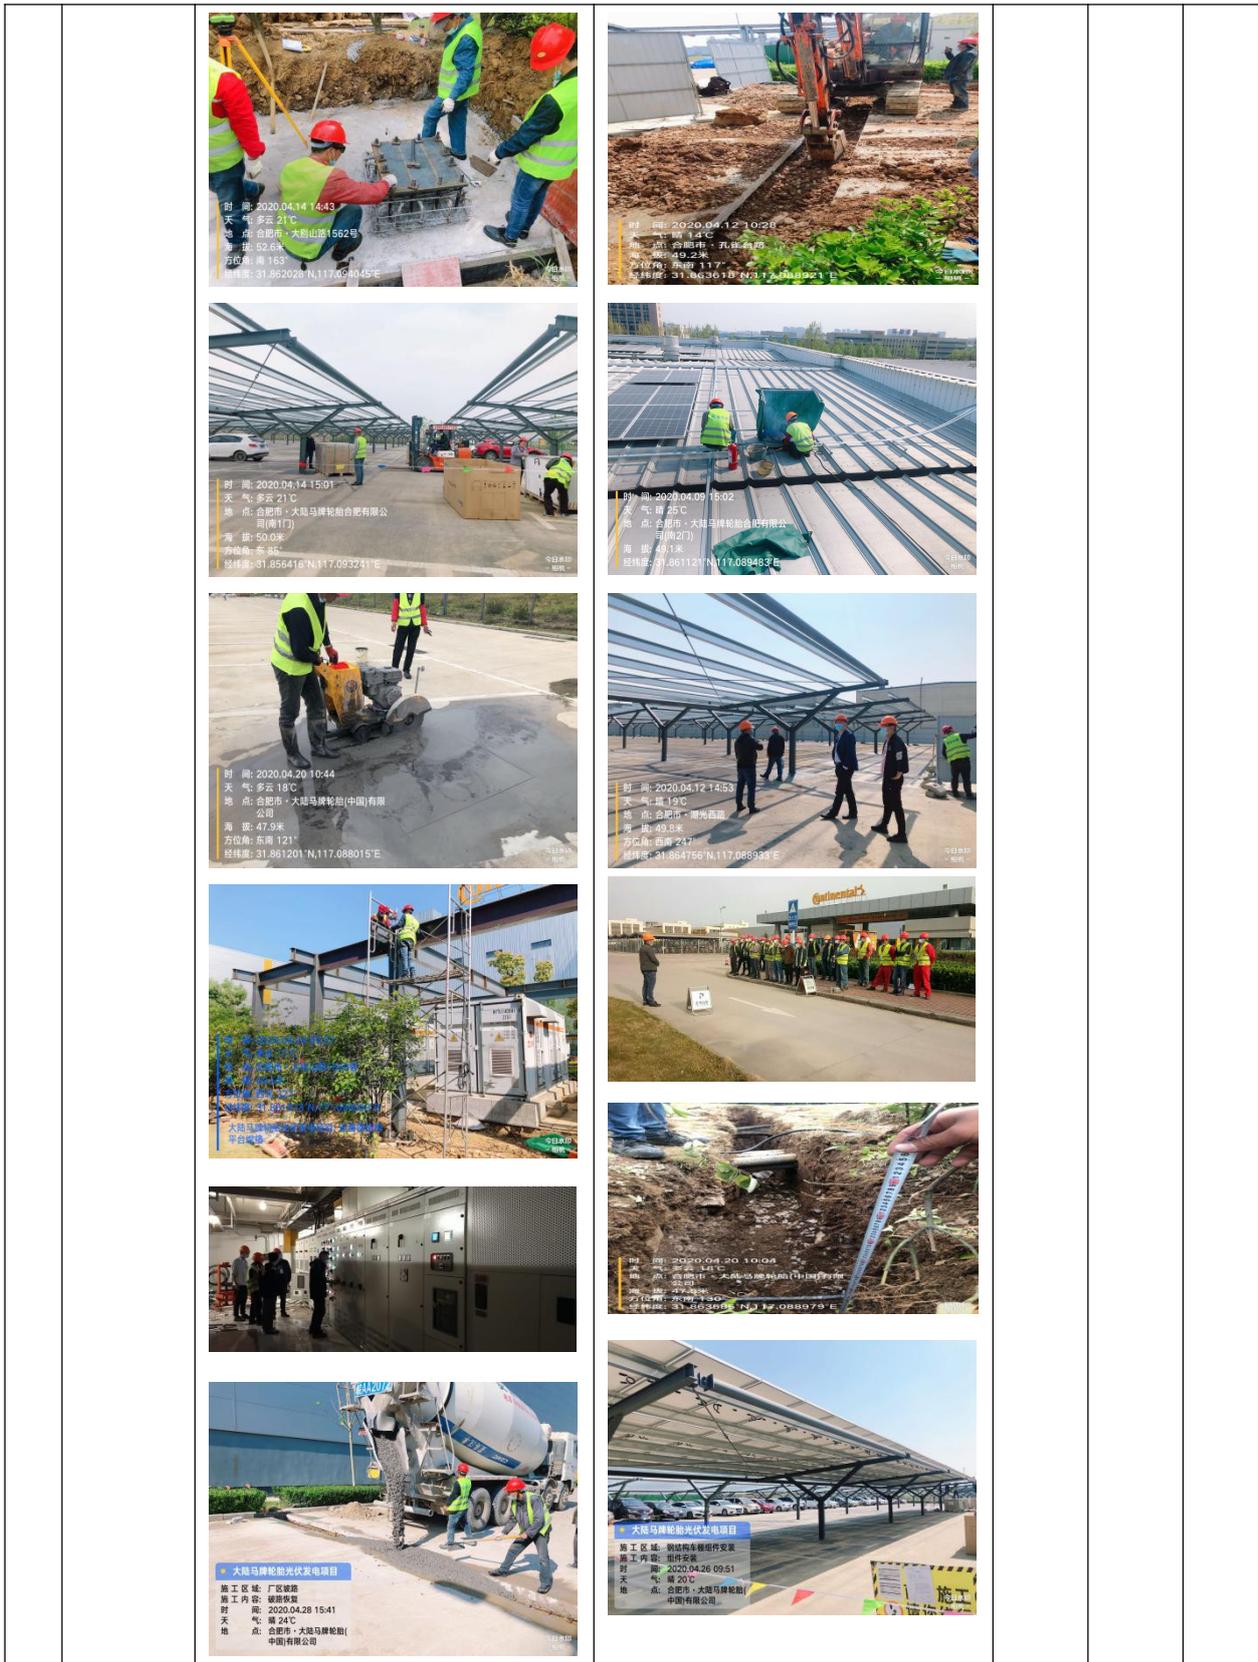

二、监理重点工作情况

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
----	----	----------	----------

	设备交付进度	二区钢结构车棚安装完成 组件安装约 6.3MW 厂区停电并柜改造完成	并网 各工序检查验收 对验收存在的问题及时督促整改 协助完成施工资料编制审核工作
	质量体系运作情况	质量体系健全，运行良好落实质量保证体系，并对运行情况进行检查	继续加强检查，发现问题即时督促整改。
	施工图会审	无	无
	方案审查	钢结构安装已报审	督促施工单位报审其他资料
	技术交底	无	/
	设计变更	无	/
安全	安全培训情况	新进场员工已进行安全培训	组织新进场员工安全培训
	安全交底情况	设备安装临时用电、工器具等安全文明施工进行监督检查。	对设备安装、组件安装登高作业等安全文明施工进行监督检查。
	安全措施落实情况	认真做好巡视检查，发现问题及时整改。	认真做好巡视检查，发现问题及时整改。
	安全文明施工情况	巡视检查施工人员安全防护穿戴情况，安全帽、劳保鞋、反光马甲佩戴齐全。无裸露裤腿、手臂现象。	继续加强现场安全管理力度
质量	主要工序质量	检查车棚基础、车棚接地、车棚埋管、电缆沟、屋面组件安装、电气等施工质量	对现场施工质量等要求进行管理，发现问题要求及时整改
	主要原材料质量	组件、变压器、逆变器、电缆	组件、变压器、逆变器、电缆
	设备质量	基本符合要求	对设备进行检查
	质量验评情况	工序施工符合要求，加强过程检查力度，加大工序报验抽查	加强过程检查力度，加大工序报验抽查力度

		力度	
--	--	----	--

三、本月进度情况

- 1、2 区车棚钢结构施工完成，组件安装完成 0.5MW
- 2、各屋面组件安装完成约 6MW
- 3、厂区停电并柜改造已完成
- 4、逆变器等设备进行电缆头制作；
- 5、屋面电气施工完成 45%

四、下月进度计划

- 1、并网验收
- 2、钢结构车棚均已完成钢构及组件安装工作
- 3、组件安装及屋面电气施工完成

五、安全文明施工情况

事故（起）			编制安全 策划文件 （份）	施工 人数	安全分包情况			
人身 重伤	机械设 备	电网 事故			分包队 伍数量	分包队 伍人数	系统外包 队伍数量	系统外队 伍人数
无	无	无		34 人	2	/	/	/

六、施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管 理	督促施工单位优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性	优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性
安全管	督促施工单位报审《安全文明施工	监督施工项目部施工安全管理人员、特

理	管理制度》，安委会要定期对现场进行安全检查；对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。审查施工项目部《安全文明措施》及施工项目部施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件，实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。	殊工种、特殊作业人员资格证明文件，实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。
质量管理	督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。	单位工程重点部位施工进行旁站；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。
技术管理	/	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。
造价管理	/	对施工单位申请的工程款及时进行评审
物资供应	/	协助建设单位做好建设物资进场工作，督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。

常州正衡电力工程监理有限公司

合肥大陆马牌轮胎（中国）有限公司 8.3MW 分布式光伏发电项目

2020年4月30日
