



监 理 月 报

工程名称：珠海特灵通通讯设备有限公司分布式光伏发电项目

2020 年 10 月 第 1 期

监理项目部（章）：

总监理工程师：

珠海特灵通通讯设备有限公司分布式光伏发电项目监理项目部

报告日期： 2020 年 10 月 25 日

监 理 月 报


工程名称：珠海特灵通讯设备有限公司分布式光伏发电项目 月次 第 1 次 月报开始时间 2020 年


09 月 26 日 结束日期 2020 年 10 月 25 日 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司


一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工单位名称	资料类型	资料数量	备注
1	珠海特灵通讯设备有限公司分布式光伏发电项目	友联绿建工程建设有限公司 先能电力工程有限公司	影像	6 张	

一、 监理重点工作情况

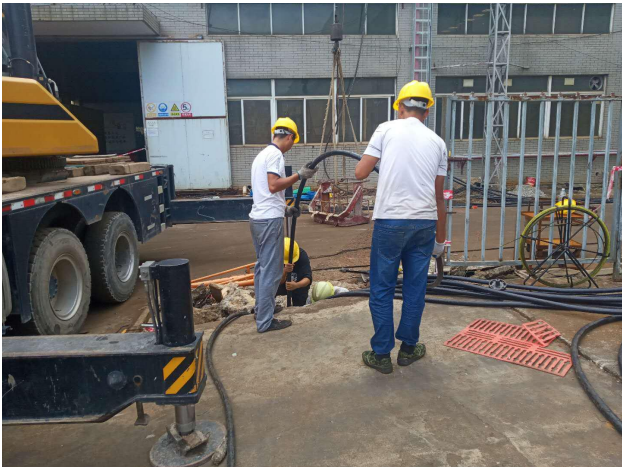专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度		检修通道安装，桥架安装，组件安装，电缆展放，电缆敷设，环网接地焊接，电缆终端制作。	电缆接线、设备调试，全额并网与消缺。

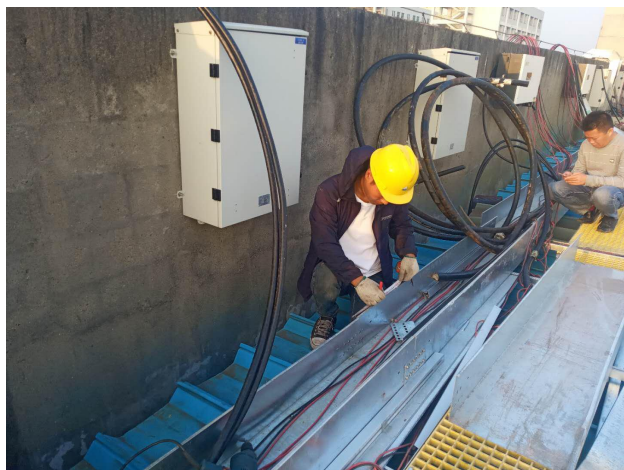

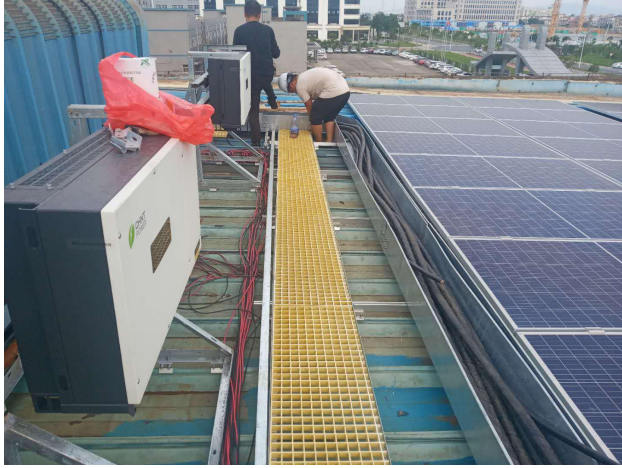

 			
设备交付进度	设备齐全		
设计交付进度	图纸完整		
质量体系运作情况	质量体系健全， 运行良好	落实质量保证 体系，并对运 行情况进行检 查	
施工图会审			
设计交底	无		

	方案审查	完成	施工单位前期 资料报审资料
	技术交底	完成	完成
	设计变更	无	无
安全	安全培训情况	新进场员工已进 行安全培训	督促施工单位 对进场新员工 进行安全教育
	安全交底情况	督促施工单位对 危险作业点进行 班前交底	继续督促施工 单位进行班前 交底
	安全措施落实情况	落实不彻底，已 要求施工单位认 真落实	监督施工单位 认真落实安全 措施
	安全文明施工情况	现场安全、文明 措施良好	加强现场安全 管理力度
质量	主要工序质量	对组件安装、电 缆展放、电缆敷 设、电缆终端制 作等工序检查	督促施工方并 网前各项检 查，发现问题 及时整改
	主要原材料质量	接地扁铁符合要 求	对主要材料进 场平行检验
	构（配）件质量	进场材料质量合 格	把控好进场材 料质量关
	设备质量	进行进场报验、 开箱检查	
	质量验评情况	工序施工符合要 求	加强过程检查 力度，加大工 序报验抽查力 度

投资	资金情况	/	/
	款项支付情况	/	/
	预算外签证	无	/
合同	合同签订情况	施工合同签订	/
	合同执行情况	按合同执行	做好合同执行工作

二、 本月进度情况

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	本月实际完成（完成量 / 总量）	累计完成（完成量 / 总量）	备注
1	定位放线	2020.07.20	2020.08.10	2020.07.20	2020.08.25	100%	100%	
2	支架安装	2020.07.28	2020.08.15	2020.07.28	2020.09.14	100%	100%	
3	组件安装	2020.08.05	2020.08.23	2020.08.25	2020.10.15	100%	100%	
4	电缆桥架	2020.08.10	2020.08.20	2020.08.10	2020.10	90%	90%	
5	直流电缆 4mm ²	2020.08.21	2020.08.25	2020.10.03	2020.10.25	100%	100%	
6	电缆放线	2020.08.23	2020.08.28	2020.10.03	2020.10.23	100%	100%	
7	逆变器安装	2020.08.17	2020.08.20	2020.10.08	2020.10.20	100%	100%	
8	汇流箱安装	2020.08.17	2020.08.20	2020.10.02	2020.10.09	100%	100%	
9	开关柜	2020.07.27	2020.07.29	2020.08.30	2020.10.25	安装完成 100%	安装完成 100%	

三、 下月进度计划

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	下月计划完成（完成量 / 总量）	本月实际完成（完成量 / 总量）	备注
1	定位放线	2020.07.20	2020.08.10	2020.07.20	2020.08.25	100%	100%	
2	支架安装	2020.07.28	2020.08.15	2020.07.28	2020.08.26	100%	100%	
3	组件安装	2020.08.05	2020.08.23	2020.08.28	2020.09.15	100%	100%	
4	电缆桥架	2020.08.10	2020.08.20	2020.08.10		90%	90%	
5	直流电缆 4mm ²	2020.08.21	2020.08.25	2020.09.01	2020.09.08	100%	100%	

6	电缆放线	2020.08.23	2020.08.28	2020.09.08	2020.09.18	100%	100%	
7	逆变器	2020.08.17	2020.08.20	2020.09.05	2020.09.12	100%	100%	
8	汇流箱	2020.08.17	2020.08.20	2020.09.05	2020.09.12	100%	100%	
9	开关柜	2020.07.27	2020.07.29	2020.09.20	2020.09.22	100%	100%	

四、安全文明施工情况

事故（起）			编制安全策	施工	安全分包情况			
人身重	机械设	电网事	划文件(份)	人数	分包队	分包队	系统外	系统外
伤	备	故			伍数量	伍人数	包队伍	队伍人
							数量	数
无	无	无		9 人	/	/	/	/

五、施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	夹具支架安装，桥架安装，电缆沟施工	组件安装，汇流箱逆变器安装，电缆接线并网。
安全管理	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，安委会要定期对现场进行安全检查；对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。	审查施工项目部<<安全文明措施>>及施工项目部施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件，实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。
质量管理	单位工程重点部位施工进行旁站；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。	督促施工单位按照正泰技术协议规范要求进行施工
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。	参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，监督检查执行情况。
造价管理	无	对工程量实施计量，及时审核施工项目部报送的工程量清单、进度款支付申请
物资供应	协助建设单位做好建设物资现场管理，督促施工单位做好物资保管工作，要求施工	督促施工单位按照工期的要求，安排人员、机具进行施工。

	单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。	
--	--------------------------	--

常州正衡电力工程监理有限公司
珠海特灵通通讯设备有限公司分布式光伏发电项目监理部
2020 年 10 月 25 日
