



监 理 月 报

工程名称：珠海特灵通通讯设备有限公司分布式光伏发电项目

2020 年 09 月 第 1 期

监理项目部（章）：

总监理工程师：

珠海特灵通通讯设备有限公司分布式光伏发电项目监理项目部

报告日期： 2020 年 09 月 25 日

监 理 月 报

工程名称：珠海特灵通通讯设备有限公司分布式光伏发电项目 月次 第 1 次 月报开始时间 2020 年

08 月 26 日 结束日期 2020 年 09 月 25 日 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司


一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工单位名称	资料类型	资料数量	备注
1	珠海特灵通通讯设备有限公司分布式光伏发电项目	友联绿建工程建设有限公司 先能电力工程有限公司	影像	6 张	

一、 监理重点工作情况

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度		夹具支架安装，桥架安装，组件安装。	电缆放线，组件安装，汇流箱逆变器安装。

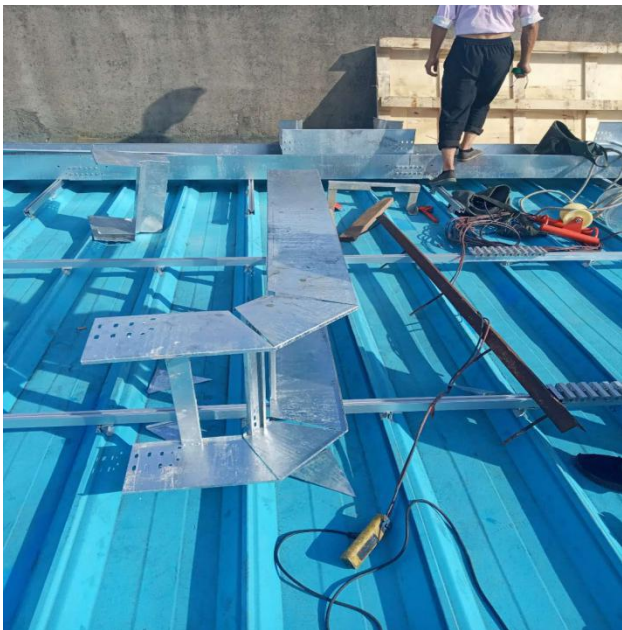

 		
设备交付进度	设备齐全	
设计交付进度	图纸完整	
质量体系运作情况	质量体系健全，运行良好	落实质量保证体系，并对运行情况进行检查
施工图会审		
设计交底	无	
方案审查	完成	施工单位前期资料报审资料

	技术交底	完成	完成
	设计变更	无	无
安全	安全培训情况	新进场员工已进行安全培训	督促施工单位对进场新员工进行安全教育
	安全交底情况	督促施工单位对危险作业点进行班前交底	继续督促施工单位进行班前交底
	安全措施落实情况	落实不彻底，已要求施工单位认真落实	监督施工单位认真落实安全措施
	安全文明施工情况	现场安全、文明措施良好	加强现场安全管理力度
质量	主要工序质量		对夹具、导轨、组件安装工序检查
	主要原材料质量		对主要材料进场平行检验
	构（配）件质量	进场材料质量合格	把控好进场材料质量关
	设备质量	进行进场报验、开箱检查	
	质量验评情况	工序施工符合要求	加强过程检查力度，加大工序报验抽查力度
投资	资金情况	/	/
	款项支付情况	/	/
	预算外签证	无	/

合同	合同签订情况	施工合同签订	/
	合同执行情况	按合同执行	做好合同执行工作

二、 本月进度情况

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	本月实际完成（完成量 / 总量）	累计完成（完成量 / 总量）	备注
1	定位放线	2020.07.20	2020.08.10	2020.07.20	2020.08.25	100%	100%	
2	支架安装	2020.07.28	2020.08.15	2020.07.28	2020.09.14	100%	100%	
3	组件安装	2020.08.05	2020.08.23	2020.08.25	2020.09.25	60%	60%	
4	电缆桥架	2020.08.10	2020.08.20	2020.08.10	2020.08.20	80%	80%	
5	直流电缆 4mm ²	2020.08.21	2020.08.25					
6	电缆放线	2020.08.23	2020.08.28					
7	逆变器安装	2020.08.17	2020.08.20					
8	汇流箱安装	2020.08.17	2020.08.20					
9	开关柜	2020.07.27	2020.07.29	2020.08.30	2020.09.25	安装完成 90%	安装完成 90%	

三、 下月进度计划

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	下月计划完成（完成量 / 总量）	本月实际完成（完成量 / 总量）	备注
1	定位放线	2020.07.20	2020.08.10	2020.07.20	2020.08.25	100%	100%	
2	支架安装	2020.07.28	2020.08.15	2020.07.28	2020.08.26	100%	100%	
3	组件安装	2020.08.05	2020.08.23	2020.08.28	2020.09.15	100%	100%	
4	电缆桥架	2020.08.10	2020.08.20	2020.08.10	2020.09.01	100%	100%	
5	直流电缆 4mm ²	2020.08.21	2020.08.25	2020.09.01	2020.09.08	100%	100%	
6	电缆放线	2020.08.23	2020.08.28	2020.09.08	2020.09.18	100%	100%	
7	逆变器	2020.08.17	2020.08.20	2020.09.05	2020.09.12	100%	100%	
8	汇流箱	2020.08.17	2020.08.20	2020.09.05	2020.09.12	100%	100%	
9	开关柜	2020.07.27	2020.07.29	2020.09.20	2020.09.22	100%	100%	

四、 安全文明施工情况

事故（起）			编制安全策	施工	安全分包情况			
人身重 伤	机械设 备	电网事 故	划文件(份)	人数	分包队 伍数量	分包队 伍人数	系统外 包队伍 数量	系统外 队伍人 数
无	无	无		14 人	/	/	/	/

五、 施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	夹具支架安装，桥架安装，电缆沟施工	组件安装，汇流箱逆变器安装，电缆接线并网。
安全管理	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，安委会要定期对现场进行安全检查；对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。	审查施工项目部<<安全文明措施>>及施工项目部施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件，实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。
质量管理	夹具、导轨、组件安装质量检查，单位工程重点部位施工进行旁站；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。	督促施工单位按照正泰技术协议规范要求进行施工
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。	参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，监督检查执行情况。
造价管理	无	对工程量实施计量，及时审核施工项目部报送的工程量清单、进度款支付申请
物资供应	协助建设单位做好建设物资现场管理，督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。	督促施工单位按照工期的要求，安排人员、机具进行施工。

常州正衡电力工程监理有限公司

珠海特灵通通讯设备有限公司分布式光伏发电项目监理部

2020 年 09 月 25 日
