



编号: ZHJL-YB-20210225

监 理 月 报

工程名称: 天津龙源汉沽三期风电项目

2021年02月 第 11期

项目监理部 (章):

总监理工程师: 刘士发



报告日期: 2021 年 02 月 25 日

监 理 月 报

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

月次 第 11 次

月报开始时间 2020 年 01 月 26 日 结束日期 2021 年 02 月 25 日

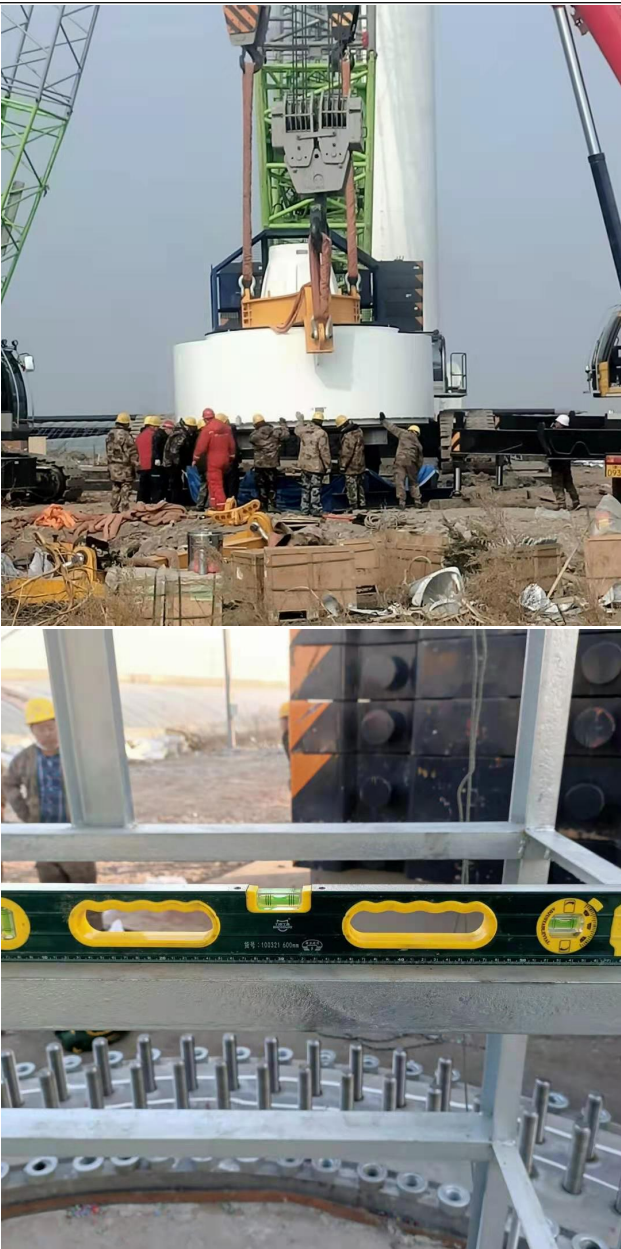
监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	天津龙源汉沽三期风电项目	/	影像	/	/

一、 监理重点工作情况

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
----	----	----------	----------

进度		2021 年 1 月 26 日, HG16 风机力矩验收完成; 2021 年 1 月 27 日, HG16 风机安装验收完成, HG11 风机塔筒吊装完成 1-3 段; 2021 年 1 月 29 日, HG11 风机塔筒 4、5 段、机舱、发电机吊装完成; 2021 年 1 月 31 日, HG11# 风机叶片吊装完成; 2021 年 2 月 4 日, HG18 风机塔筒 1、2 段塔筒吊装完成; 2021 年 2 月 5 日, HG18 风机塔筒 3、4、5 段吊装完成, 机舱吊装完成; 2021 年 2 月 6 日, HG18 风机发电机吊装完成; 2021 年 2 月 8 日, HG18 风机叶片吊	道路工程: 风机吊装平台换填压实、进场道路具备大件运输条件。 风机安装工程: 完成 12# 风机吊装; 2#、3#风机吊装完成;
-----------	--	---	--

	 	装完成； 2021 年 2 月 20 日，HG12 风机下段塔筒吊装完成； 2021 年 2 月 21 日，HG12 风机塔筒完成 2、3、4、5 段吊装； 2021 年 2 月 23 日，业主单位书记、安监部主任现场检查安全工作； 2021 年 2 月 24 日，HG12 风机机舱、发电机吊装完成；	
--	--	--	--

			
	设备交付进度	陆续完成中	督促并完成
	设计交付进度	陆续完成中	督促并完成
	质量体系运作情况	质量体系健全，运行良好	落实质量保证体系，并对运行情况进行检查
	施工图会审	升压站、场区配电未进行	完善中
	设计交底	升压站、道路工程、场区配电未	陆续完成工序 图纸会审交底

		进行	
	方案审查	吊装施工单位 未完成	陆续完成
	技术交底	/	陆续完成
	设计变更	/	
安全	安全培训情况	新进场员工已 进行安全培训	督促新进员工 安全培训
	安全交底情况	督促施工单位 对危险作业点 进行班前交底	完善班前交底
	安全措施落实情况	落实不彻底，已 要求施工单位 认真落实	完善安全措施
	安全文明施工情况	现场安全、文明 措施良好	增加安全文明 标语标牌
质量	主要工序质量	/	陆续完成
	主要原材料质量	/	陆续完成
	构（配）件质量	/	陆续完成
	设备质量		陆续完成
	质量验评情况	工序施工符合 要求	陆续完成
投资	资金情况	/	/
	款项支付情况	/	/
	预算外签证	无	/
合同	合同签订情况	施工合同签订	/
	合同执行情况	按合同执行	做好合同执行 工作

二、 本月进度情况

序	任 务 名	计划开始时	计 划 结	施工开始日期	施	本月实际	累 计	备注
---	-------	-------	-------	--------	---	------	-----	----

号	称	间	束时间		工 结 束 日 期	完成（完成 量/总量）	完 成 （ 完 成量/ 总 量）	
1	18# 风 机 吊装完成	2021.02.04	2021.02.08	2021.02.04	2021.02.08	100%		
2	12# 风 机 塔筒、机 舱、发电 机吊装完 成	2021.02.20	2021.02.24	2021.02.20	2021.02.24	80%		
3	18# 风 机 电缆敷设	2021.02.20	2021.02.25	2021.02.20	2021.02.25	50%		
4	11# 风 机 吊装完成	2021.01.27	2021.01.31	2021.01.27	2021.01.31	100%		

三、 下月进度计划

序 号	任 务 名 称	计划开始时间	计 划 结 束时间	施工开始 日期	施 工 结 束日期	下 月 计 划 完 成 （ 完 成 量 / 总 量）	本 月 实 际 完 成 （ 完 成 量 / 总 量）	权 值
1	风机吊装 承台换填 压实	2021.02.26	2021.03.25			55%		
2	风机吊装 工程	2021.02.26	2021.03.25			55%		
3	场区配电 电缆敷设	2021.02.26	2021.03.25			75%		

四、 安全文明施工情况

事故（起）			编制安全策 划文件（份）	施工 人数	安全分包情况			
人身重 伤	机械设 备	电网事 故			分包队 伍数量	分包队 伍人数	系统外 包队伍 数量	系统外 队伍人 数

无	无	无	无	30 人	1	/	/	/
---	---	---	---	------	---	---	---	---

五、 施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	督促施工单位优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性	根据工作面合理增加人员及机械，风机吊装平台换填、压实符合吊装施工需求、进场道路转弯半径换填完成施工需求，陆续开展风机吊装、转场施工。
安全管理	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，安委会要定期对现场进行安全检查；对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。	实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。
质量管理	设备到场进行开箱检查；单位工程重点部位施工进行旁站；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。	督促施工单位按照施工工艺和设计要求的规范要求进行施工
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。	参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，监督检查执行情况。
造价管理	对施工单位申请的工程款及时进行评审	对工程量实施计量，及时审核施工项目部报送的工程量清单、进度款支付申请
物资供应	协助建设单位做好建设物资进场工作，督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。	督促施工单位按照要求，安排人员、机具进行施工。
