



编号: ZHJL-YB-20210729

监 理 月 报

工程名称: 天津龙源汉沽三期风电项目

2021年07月 第 16期

项目监理部 (章):



总监理工程师: 刘士发

报告日期: 2021 年 07 月 30 日

监 理 月 报

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

月次 第 16 次

月报开始时间 2021 年 07 月 01 日 结束日期 2021 年 07 月 30 日

监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	天津龙源汉沽三期风 电项目	/	影像	7	/

二、监理重点工作情况

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
----	----	----------	----------

2#风机调试




砼路面浇筑



砼路面测量工程量



路面宽度测量

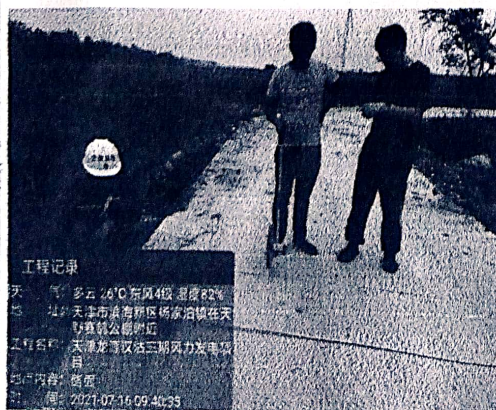

进度

1、道路工程：15#风机砼道路完成剩余 10%砼浇筑完成，工程量测量完成；

2 风机安装工程：10#风机电装完成，消缺无人施工未组织验收；

3、场区配电：西庄陀电缆敷设征地基本完成拉管50%。2#风机调试并网发电完成，321 线路升压站至 2#风机处倒送电完成；

1、道路工程：完成 6#风机机位回填压实、进场道路具备运输条件。

2 风机安装工程：完成 5#、10#风机电装验收


3、风机基础：完成 6#风机灌注桩筋制作绑扎、砼浇筑

4、场区配电：完成剩余电缆敷设、路线征地协调工作，同步进行 5#、10%风机调试并网发电工作；


道路砼浇筑旁站



巡检电缆敷设路由清理

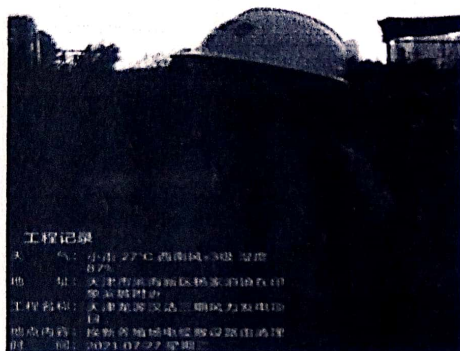

电缆试验

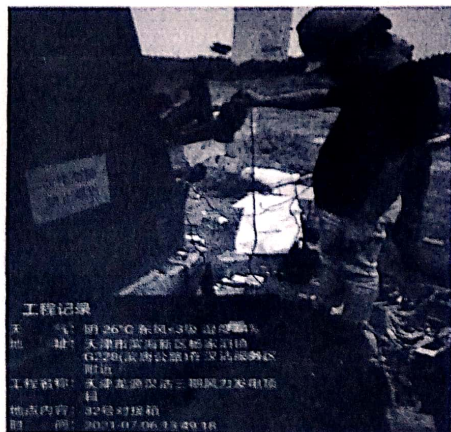

	称	间	间	日期	日期	际完成 (完成 量 / 总 量)	完 成 (完 成量/ 总量)	
1	10# 风 机 电 装 完 成	2021.07.15	2021.07.25	2021.07.15	2021.07.25	100%		
2	2# 风 机 电 装 验 收 完成	2021.07.03	2021.07.03	2021.07.03	2021.07.03	100%		
3	砟道路	2021.05.30	2021.07.12	2021.05.30	2021.07.16	10%	100%	
4	场 区 配 电 电 缆 敷 设	2021.06.30	2021.07.30	2021.06.30	2021.07.30	2%	87%	
5	6# 风 机 基 础 桩 砟 浇 筑完成、	2021.07.20	2021.07.30			0%		
6	2#风机 并网	2021.07.03	2021.07.05	2021.07.07	2021.07.08	7%	50%	
7	场 区 配 电 西 庄 陀拉管	2021.07.20	2021.07.30	2021.07.20	2021.07.30	50%	50%	

四、下月进度计划

序号	任 务 名 称	计划开始 时间	计划结束 时间	施 工 开 始 日期	施工结束日 期	下 月 计 划 完 成 (完 成 量/ 总量)	本 月 实 际 完 成 (完 成 量/ 总量)	权值
1	6#风机机 位换填压 实	2021.07.30	2021.08.20			100%		
2	6#风机灌 注桩	2021.08.20	2021.07.30			100%		
3	场区配电 电缆敷设	2021.07.30	2021.08.30			100%		
4	风机基础 工程	2021.05.30	2021.06.30			100%		
5	道路	2021.07.30	2021.08.15			10%		

6	5#、10 风机井网	2021.08.10	2021.08.30			14%	64%	
7	场区配电西庄陀拉管	2021.08.01	2021.08.08			50%		

五、安全文明施工情况

事故（起）			编制安全策	施工	安全分包情况			
人身重	机械设	电网事	划文件(份)	人数	分包队	分包队	系统外	系统外队
伤	备	故			伍数量	伍人数	包队伍	伍人数
							数量	
无	无	无	无	22 人	2	11	/	/

六、施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	督促施工单位优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性	根据工作面合理增加人员及机械，6#风机基础施工、进场道路转弯半径换填完成施工需求，开展风机灌注桩、风机基础施工、5#、10#风机井网、场区配电电缆敷设协调工作、资料收集等事宜。
安全管理	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，安委会要定期对现场进行安全检查；对施工人员进行安全培训、安全交底，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。	实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。
质量管理	电缆沟开挖深度宽度及回填检查；单位工程重点部位施工进行旁站；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。	督促施工单位按照施工工艺和设计要求的规范要求进行施工
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。	参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，监督检查执行情况。

造价管理	对施工单位申请的工程款及时进行评审	对工程量实施计量，及时审核施工项目部报送的工程量清单、进度款支付申请
物资供应	协助建设单位做好建设物资进场工作，督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。	督促施工单位按照要求，安排人员、机具进行施工。
