

编号: CHZH-YB-002

监 理 月 报

工程名称: 崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补 110 兆瓦
光伏发电项目

2020 年 06 月 第 2 期

总监理工程师: 徐耀生



监理项目部 (章)

2020 年 06 月 30 日

监 理 月 报

工程名称: 崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补 110 兆瓦光伏发电项目 月次 第 1 次

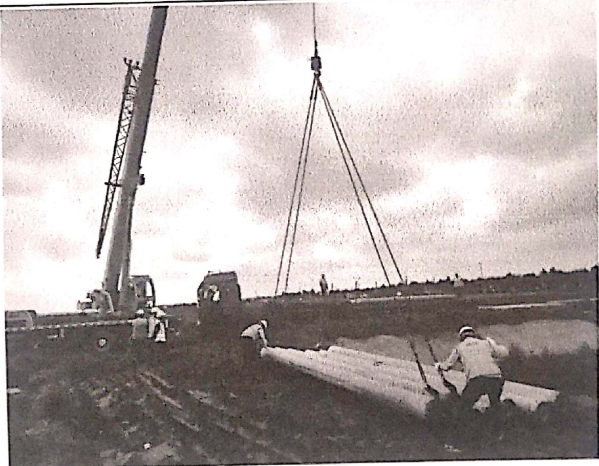
月报开始时间 2019 年 06 月 01 日 结束日期 2020 年 06 月 30 日

监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补 110 兆瓦光伏发电项目		影像资料	10	

一、 监理重点工作情况

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度		B2 区预制管桩 到场倒运	

B2区打桩

施工记录

天气: 雨 27度 西南风 3级 湿度91%
 经度: 121.8426530
 纬度: 31.5832911
 地址: 上海市崇明县在崇明区外牛港
 植小区附近
 我的工程: 上海
 施工地点: 崇明区陈家镇柏安淡水养殖场
 渔光互补T10兆瓦光伏发电
 时间: 2020-06-29 16:15:11
 IMEI: 867300040418762

B2区打桩

施工记录

天气: 雨 27度 西南风 3级 湿度91%
 经度: 121.8424202
 纬度: 31.5833173
 地址: 上海市崇明县在崇明区外牛港
 植小区附近
 我的工程: 上海
 施工地点: 崇明区陈家镇柏安淡水养殖场
 渔光互补T10兆瓦光伏发电
 时间: 2020-06-29 16:22:59

B2区打桩

施工记录

天气: 雨 27度 西南风 3级 湿度91%
 经度: 121.8432365
 纬度: 31.5830946
 地址: 上海市崇明县在崇明区外牛港
 植小区附近
 我的工程: 上海
 施工地点: 崇明区陈家镇柏安淡水养殖场
 渔光互补T10兆瓦光伏发电
 时间: 2020-06-29 16:32:27

B2 区静压预制
管桩



样板房改造



高温中演练暑
应急



			安全知识竞赛	
	设备交付进度	设备未进场	下月未有设备交付计划	
	设计交付进度	光伏区图纸已完成（升压站图纸未出图）	图纸全部出图	
	质量体系运作情况	/	/	
	施工图会审	未进行图纸会审	图纸未交付，初设图纸简陋，不足以满足会审需求	
	设计交底	未有设计交底	/	
	方案审查	已交付，各专业方案已由各专监审核完毕	/	
	技术交底	未有技术交底	/	
	设计变更	未有设计变更	/	
安全	安全培训情况	新进场员工已进行安全培训	/	
	安全交底情况	督促施工单位	/	

		对危险作业点进行班前交底	
	安全措施落实情况	落实不彻底，已要求施工单位认真落实，检查现场存在的安全隐患，发现问题及时整改。	/
	安全文明施工情况	现场安全、文明措施良好	加强现场安全管理力度
质量	主要工序质量	/	/
	主要原材料质量	/	/
	构（配）件质量	/	
	设备质量	/	
	质量验评情况	/	
投资	资金情况	/	/
	款项支付情况	/	/
	预算外签证	无	/
合同	合同签订情况	施工合同签订	/
	合同执行情况	按合同执行	做好合同执行工作

二、 本月进度情况

- 1、B 区静压预制管桩完成 1234 根；
- 2、压桩机 7 台已运至现场检查完毕；
- 3、预制管桩已到场 2920 根，已经运至现场；
- 4、压桩施工班组，安全协议及合同签订完成，入场教育、施工方案及安全

环保技术交底完成；

5、办公区域标化牌布置埋设完成；

6、光伏厂区门禁系统正式使用，明确项目部管理制度；

7、完成安全成产月活动策划。

三、 下月进度计划

1. 升压站图纸出图，升压站进行开工。

2. 样板房改造全部完成。

3. 组件、设备招标采购完成。

4. 光伏区打桩完成 35%。

四、 安全文明施工情况

事故（起）			编制安全策 划文件（份）	施工 人数	安全分包情况			
人身重 伤	机械设 备	电网事 故			分包队 伍数量	分包队 伍人数	系统外 包队伍 数量	系统外 队伍人 数
无	无	无	/	76 人	/	/	/	/

五、 施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	督促施工单位优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性	/
安全管理	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，安委会要定期对现场进行安全检查；对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。审查施工项目部<<安全文明措施>>及施工项目部施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件，实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限	/

	期改正。	
质量管理	模具到场进行检查；单位工程重点部位施工进行旁站；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。	/
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。	/
造价管理	对施工单位申请的工程款及时进行评审	/
物资供应	协助建设单位做好建设物资进场工作，督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。	/

常州正衡电力工程监理有限公司

崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补 110 兆瓦光伏发电项目

2020 年 6 月 30 日
