

编号：CHZH-YB-004

监 理 月 报

工程名称：崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补 110 兆瓦
光伏发电项目

2020 年 08 月 第 4 期

总监理工程师： 王立杰

监理项目部（章）

2020 年 08 月 30 日

监 理 月 报

工程名称: 崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补 110 兆瓦光伏发电项目 月次 第 1 次

月报开始时间 2019 年 08 月 01 日 结束日期 2020 年 08 月 30 日

监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

一、 监理重点工作情况

专业	影像资料	工序名称	
进度		箱逆变基础钢筋 绑扎	



箱变基础钢筋模
板验收



组件到场开箱



管桩验收



光伏组件安装



光伏组件安装



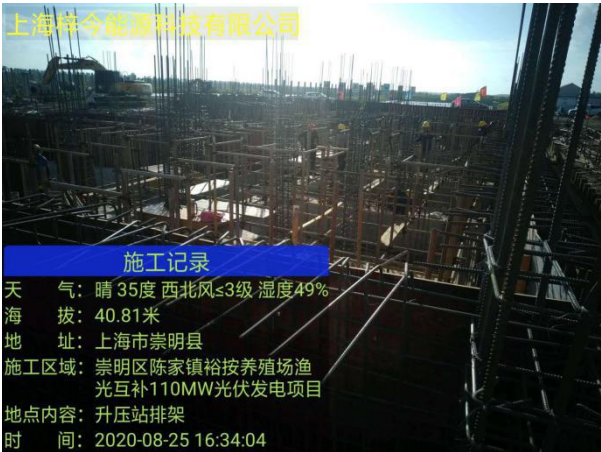
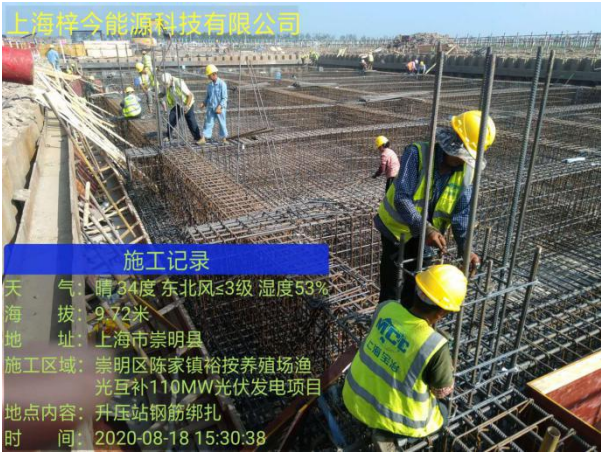
箱变基础浇筑



升压站配电楼基
础垫层浇筑



升压站接地扁钢
预埋

		升压站配电楼基 础钢筋、模板安 装、脚手架搭设	
		升压站配电楼基 础钢筋绑扎	
	设备交付进度	设备未进场	下月未有设备交付计划
	设计交付进度	升压站图纸完成会审	图纸全部出图
	质量体系运作情况	/	/
	施工图会审	已进行图纸会审	对后续图纸完成交底
	设计交底	未有设计交底	/
	方案审查	已交付，各专业	/

		方案已由各专监 审核完毕	
	技术交底	已完成技术交底	/
	设计变更	未有设计变更	/
安全	安全培训情况	新进场员工已进 行安全培训	/
	安全交底情况	督促施工单位对 危险作业点进行 班前交底	/
	安全措施落实情况	落实不彻底，已 要求施工单位认 真落实，检查现 场存在的安全隐 患，发现问题及 时整改。	/
	安全文明施工情况	现场安全、文明 措施良好	加强现场安全 管理力度
质量	主要工序质量	/	/
	主要原材料质量	/	/
	构（配）件质量	/	
	设备质量	/	
	质量验评情况	/	
投资	资金情况	/	/
	款项支付情况	/	/
	预算外签证	无	/
合同	合同签订情况	施工合同签订	/
	合同执行情况	按合同执行	做好合同执行 工作

二、本月进度情况

光伏区：

- 1、管桩累计完成打桩 26526 根，光伏区总桩基数 26840 根。累计完成 99%；
- 2、支架安装完成 5MW，组件安装完成 1MW；
- 3、箱逆变一体机基础浇筑累计 11 台；完成 35%

升压站：

- 1、升压站配电装置楼地梁支模、浇筑完成；地下室剪力墙钢筋绑扎、模板安装完成 70%；
- 2、消防泵房及水池、事故油池基础底板钢筋绑扎完成；
- 3、避雷针基础开始施工；
- 4、升压站进站道路涵洞施工完成。

三、下月进度计划

光伏区：

1. 光伏区基础管桩 26840 根全部完成。
2. 箱逆变基础完成浇筑 30 座。
3. 光伏支架安装完成 60MW。
4. 光伏组件安装完成 50MW。

升压站：

- 1、升压站主体浇筑完成 80%。
- 2、SVG、主变基础完成 100%。
- 3、消防泵池、避雷针基础完成 80%。

四、 安全文明施工情况

事故（起）			编制安全策	施工	安全分包情况			
人身重 伤	机械设 备	电网事 故	划文件(份)	人数	分包队 伍数量	分包队 伍人数	系统外 包队伍 数量	系统外 队伍人 数
无	无	无	/	500 人	/	/	/	/

五、 施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	督促施工单位优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性	/
安全管理	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，安委会要定期对现场进行安全检查；对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。审查施工项目部<<安全文明措施>>及施工项目部施工安全管理人员、特种工种、特殊作业人员资格证明文件，实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。	/
质量管理	模具到场进行检查；单位工程重点部位施工进行旁站；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。	/
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。	/

造价管理	对施工单位申请的工程款及时进行评审	/
物资供应	协助建设单位做好建设物资进场工作，督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。	/

常州正衡电力工程监理有限公司

崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补 110 兆瓦光伏发电项目

2020 年 8 月 30 日
