

编号：CHZH-YB-005

监 理 月 报

工程名称：崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补 110 兆瓦
光伏发电项目

2020 年 09 月 第 5 期

总监理工程师： 王立杰

监理项目部（章）

2020 年 09 月 30 日


监 理 月 报


工程名称: 崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补 110 兆瓦光伏发电项目

月报开始时间 2019 年 09 月 01 日 结束日期 2020 年 09 月 30 日

监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

一、 监理重点工作情况

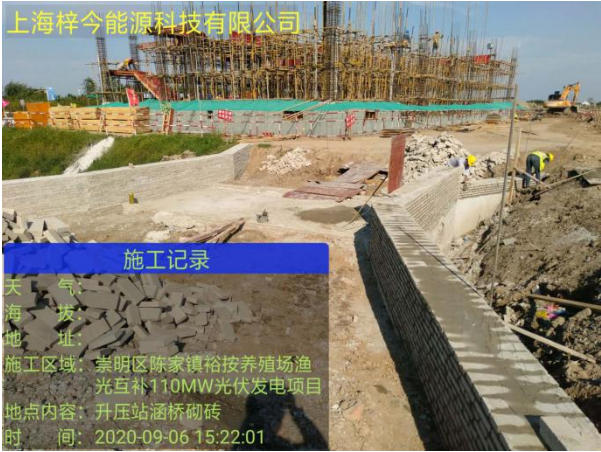
专业	影像资料	工序名称	
进度		升压站一层梁板 柱钢筋模板安装	
		升压站涵桥砌筑	

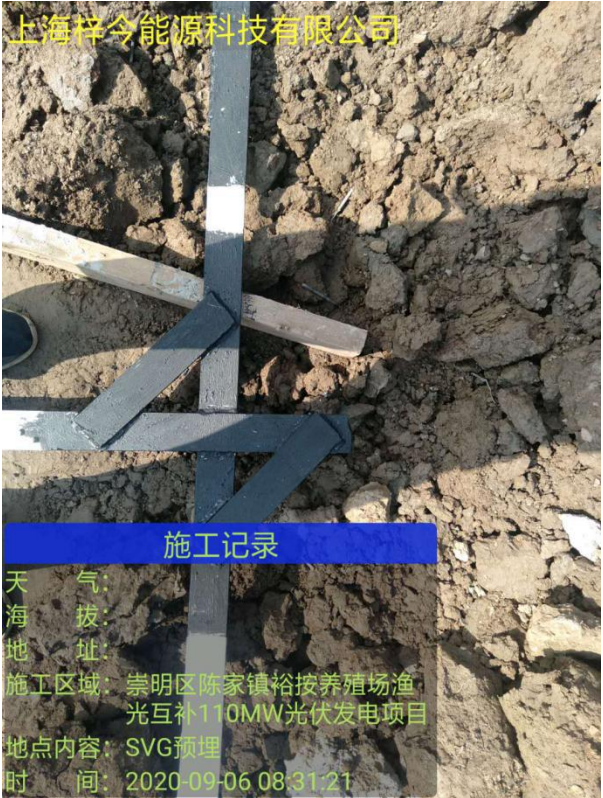

SVG 接地环网防腐



光伏区支架安装

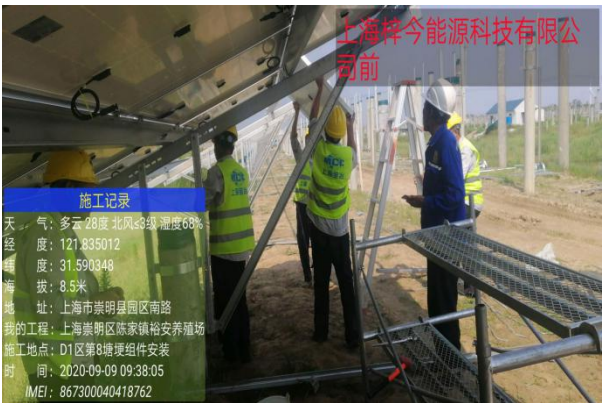


光伏组件安装



箱变基础浇筑收面




箱变基础浇筑

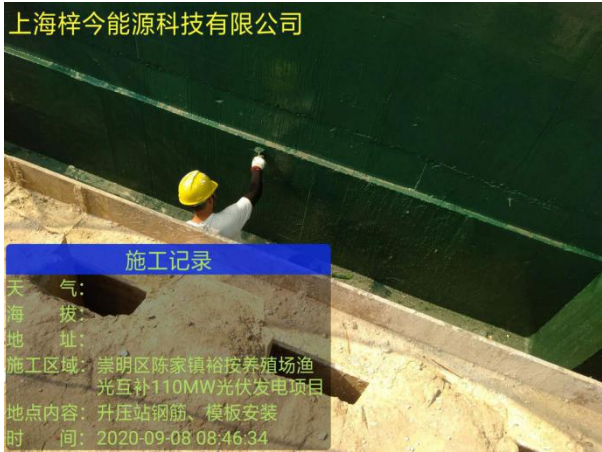

升压站基础防水
涂料粉刷

上海祥今能源科技有限公司

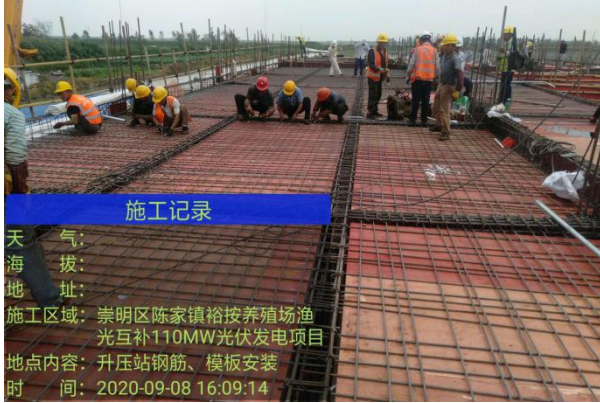

施工记录

天气:
海拔:
地址:
施工区域: 崇明区陈家镇裕安养殖场渔
光互补110MW光伏发电项目
地点内容: 升压站钢筋、模板安装
时间: 2020-09-08 16:09:14

升压站二层底板
钢筋绑扎




升压站一层梁柱
二层底板浇筑



光伏区脚手架搭
设检查



光伏区汇流箱安
装

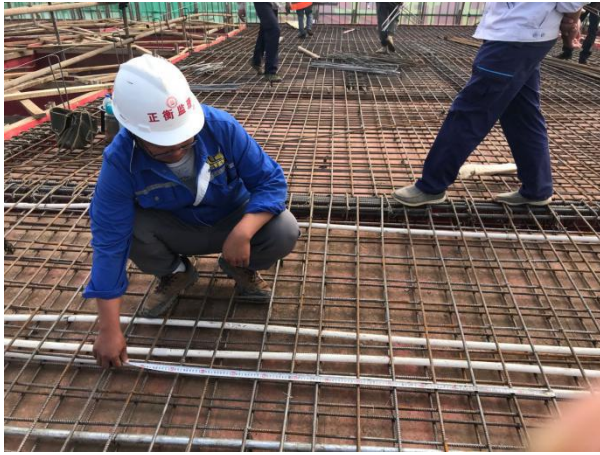

升压站二层顶板
钢筋验收



升压站二层顶板
浇筑

	 	升压站 SVG 吊装 就位	
		升压站 SVG 安装	
	设备交付进度	SVG、箱逆变、 接地变到场	设备全部到场
	设计交付进度	光伏区电气及升 压站电气图纸出 图	图纸全部出图
	质量体系运作情况	/	/
	施工图会审	已进行图纸会审	
	设计交底	已完成设计交底	/
	方案审查	已交付，各专业 方案已由各专监 审核完毕	/
	技术交底	已完成技术交底	/
	设计变更	未有设计变更	/
安全	安全培训情况	新进场员工已进 行安全培训	/

	安全交底情况	督促施工单位对危险作业点进行班前交底	/
	安全措施落实情况	落实不彻底，已要求施工单位认真落实，检查现场存在的安全隐患，发现问题及时整改。	/
	安全文明施工情况	现场安全、文明措施良好	加强现场安全管理力度
质量	主要工序质量	/	/
	主要原材料质量	/	/
	构（配）件质量	/	
	设备质量	/	
	质量验评情况	/	
投资	资金情况	/	/
	款项支付情况	/	/
	预算外签证	/	/
合同	合同签订情况	施工合同签订	/
	合同执行情况	按合同执行	做好合同执行工作

二、本月进度情况

光伏区：

1、管桩累计完成打桩 26526 根，光伏区总桩基数 26840 根。累计完成 99%；

2、支架安装累计完成 43MW，组件累计安装完成 33MW；

3、箱逆变一体机基础浇筑累计 30 台；完成 100%；

4、箱逆变一体机安装就位 30%；

升压站：

1、升压站配电装主体结构完成 100%，砌墙完成 30%。

2、消防泵房主体结构完成 100%；

3、SVG 基础完成 100%；

4、SVG 及 35KV 开关柜安装就位；

三、 下月进度计划

光伏区：

1. 光伏区基础管桩 26840 根全部完成。

2. 箱逆变基础完成浇筑 30 座。

3. 光伏支架安装完成全部完成。

4. 光伏组件安装完成全部完成。

5. 汇流箱及箱逆变一体机全部安装调试完成。

6. 电力组串接线及直流、交流电力接线完成 100%。

升压站：

1、升压站主体结构及装饰装修完成 100%。

2、SVG、主变基础完成 100%。

3、消防泵池、避雷针基础完成 100%。

4、升压站电气设备全部安装调试完成。

5、升压站满足送电条件。

四、 安全文明施工情况

事故（起）			编制安全策 划文件(份)	施工 人数	安全分包情况			
人身重 伤	机械设 备	电网事 故			分包队 伍数量	分包队 伍人数	系统外 包队伍 数量	系统外 队伍人 数
无	无	无	/	800 人	/	/	/	/

五、 施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	督促施工单位优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性	/
安全管理	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，安委会要定期对现场进行安全检查；对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。审查施工项目部<<安全文明措施>>及施工项目部施工安全管理人员、特种工种、特殊作业人员资格证明文件，实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。	/
质量管理	模具到场进行检查；单位工程重点部位施工进行旁站；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。	/
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。	/

造价管理	对施工单位申请的工程款及时进行评审	/
物资供应	协助建设单位做好建设物资进场工作，督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。	/

常州正衡电力工程监理有限公司

崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补 110 兆瓦光伏发电项目

2020 年 9 月 30 日
