



编号: JXM15-XXAK-02

监 理 月 报

工程名称: 新乡市杭泰光伏发电有限责任公司爱康建材
2.6MW 分布式光伏发电项目

2020 年 7 月

项目监理部 (章):

总监理工程师:

报告日期: 2020 年 07 月 31 日


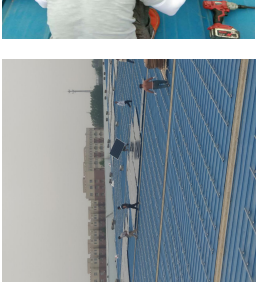
监 理 月 报

工程名称: 新乡市杭泰光伏发电有限责任公司爱康建材 2.6MW 分布式光伏发电项目月次 第 1 次

月报开始时间 2020 年 07 月 1 日 结束日期 2020 年 07 月 31 日

监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	新乡市杭泰光伏发电有限责任公司爱康建材 2.6MW 分布式光伏发电项目	       	照片	8	

一、 监理重点工作情况

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度	3 号厂房加固工程 支架安装，组件安装	3 号厂房加固工作。 3, 4, 5 号厂房支架安装，组件安装。	3, 4, 5 号组件安装，桥架安装， 电气设备安装。
	设备交付进度	无	/
	设计交付进度	厂房图纸完成	厂房图纸完成
	质量体系运作情况	质量体系健全，运行良好落实质量 保证体系，并对运行情况进行检查	继续加强检查，发现问题即时督促 整改。
	施工图会审	完成施工图会审	
	设计交底	设计已交底	
	方案审查	安装单位未交付	督促施工单位报审其他资料
	技术交底	已交底	
	设计变更	无	
安全	安全培训情况	新进场员工已进行安全培训	/
	安全交底情况	对即将开始施工的夹具、导轨、 格栅板安装，工器具使用、吊装 安全文明施工注意事项进行监 督。	持续监督检查
	安全措施落实情况	施工工器具暂未进场不涉及安全 问题。	认真做好巡视检查，发现问题及 时整改。
	安全文明施工情况	巡视检查施工人员安全防护穿戴 情况，安全帽、劳保鞋、反光马 甲佩戴齐全。无裸露裤腿、手臂 现象。	继续加强现场安全管理力度

质量	主要工序质量	核对图纸，检查夹具放线定点安装情况。并做拉拔力测试。	检查夹具放线定点安装情况。安排做拉拔力测试。
	主要原材料质量	夹具、桥架、扁铁、镀锌圆管等	/
	构（配）件质量	/	/
	设备质量	/	/
	质量验评情况	工序施工符合要求，加强过程检查力度，加大工序报验抽查力度	加强过程检查力度，加大工序报验抽查力度
投资	资金情况	/	/
	款项支付情况	/	/
	预算外签证	无	/
合同	合同签订情况	施工合同签订	/
	合同执行情况	按合同执行	做好合同执行工作

二、 本月进度情况

- 1、3号厂房加固全部完成，并进行分项分部验收。
- 2、3，4，5号厂房支架安装完成。
- 3、3，4，5号厂房组件安装完成80%。

三、 下月进度计划

- 1、5号厂房组件安装完成，并进行分项验收。
- 2、3，4，5号厂房桥架进行安装。
3. 电气设备安装。
4. 电气设备材料进场。

安全文明施工情况

事故（起）			编制安全策	施工	安全分包情况			
人身重	机械设	电网事	划文件（份）	人数	分包队	分包队	系统外	系统外
伤	备	故			伍数量	伍人数	包队伍	队伍人
							数量	数
无	无	无		13人	/	/	/	/

四、 施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	督促施工单位优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性	优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性
安全管理	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，安委会要定期对现场进行安全检查；对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。审查施工项目部<<安全文明措施>>及施工项目部施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件，实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。	监督施工项目部施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件，实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。
质量管理	单位工程重点部位施工进行旁站；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。	按正式设计交付图纸要求监理，发现问题及时要求整改。
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。
造价管理	/	对施工单位申请的工程款及时进行评审
物资供应	协助建设单位做好建设物资进场工作，督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。	协助建设单位做好建设物资进场工作，督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。

常州正衡电力工程监理有限公司

新乡市杭泰光伏发电有限责任公司爱康建材 2.6MW 分布式光伏发电项目
2020 年 07 月 31 日
