



正衡监理

编号: CZZH-YB-01

监 理 月 报

工程名称: 蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

2020 年 06 月第 01 期

项目监理部 (章):



总监理工程师: 刘士发

报告日期: 2020 年 06 月 30 日

监 理 月 报

工程名称：蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目 月次 第 1 次

月报开始时间 2020 年 06 月 01 日 结束日期 2020 年 06 月 30 日

监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料


序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目	蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目	照片	20 张	

一、 监理重点工作情况


专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度		施工现场涵管铺设；进场道路场平施工；管桩进场，现场检查其质保资料；型号规格符合要求；审核	进场道路场平施工；打桩施工；电缆沟开挖；立柱焊接及防腐；支架安装；组件进场；桥架进场；箱变进场。



召开第一次工程例会。

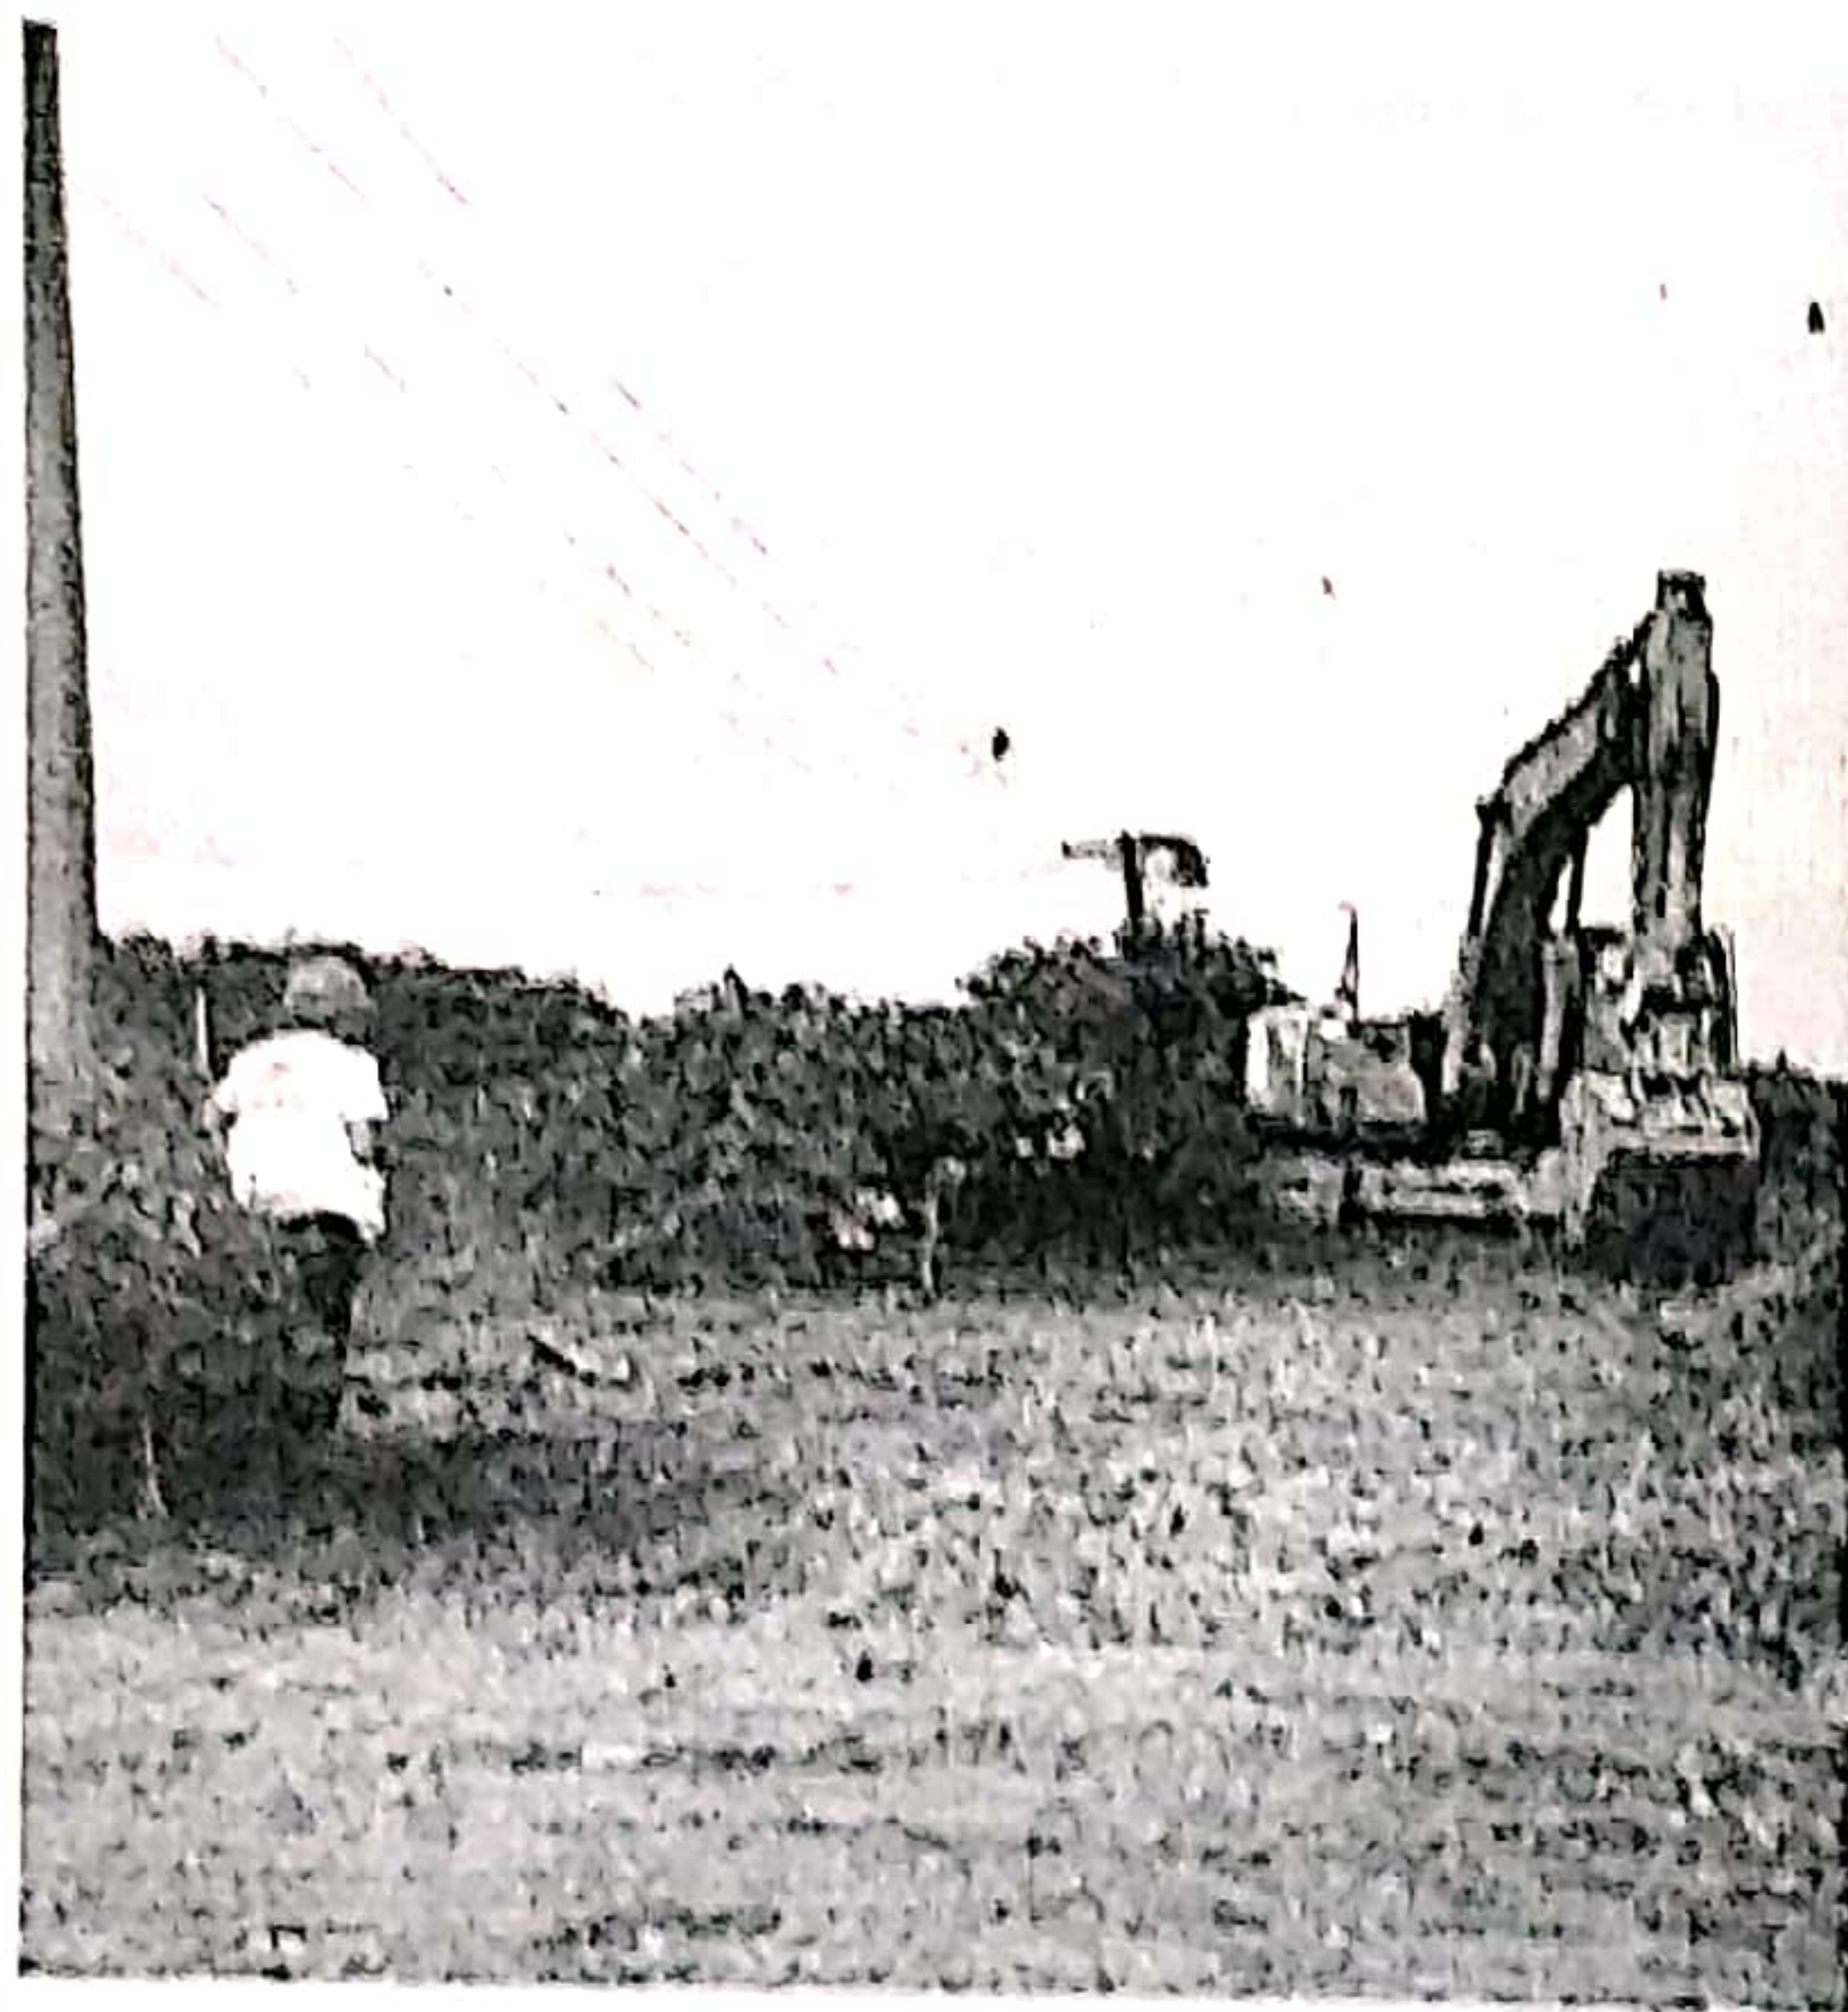

进场道路施工

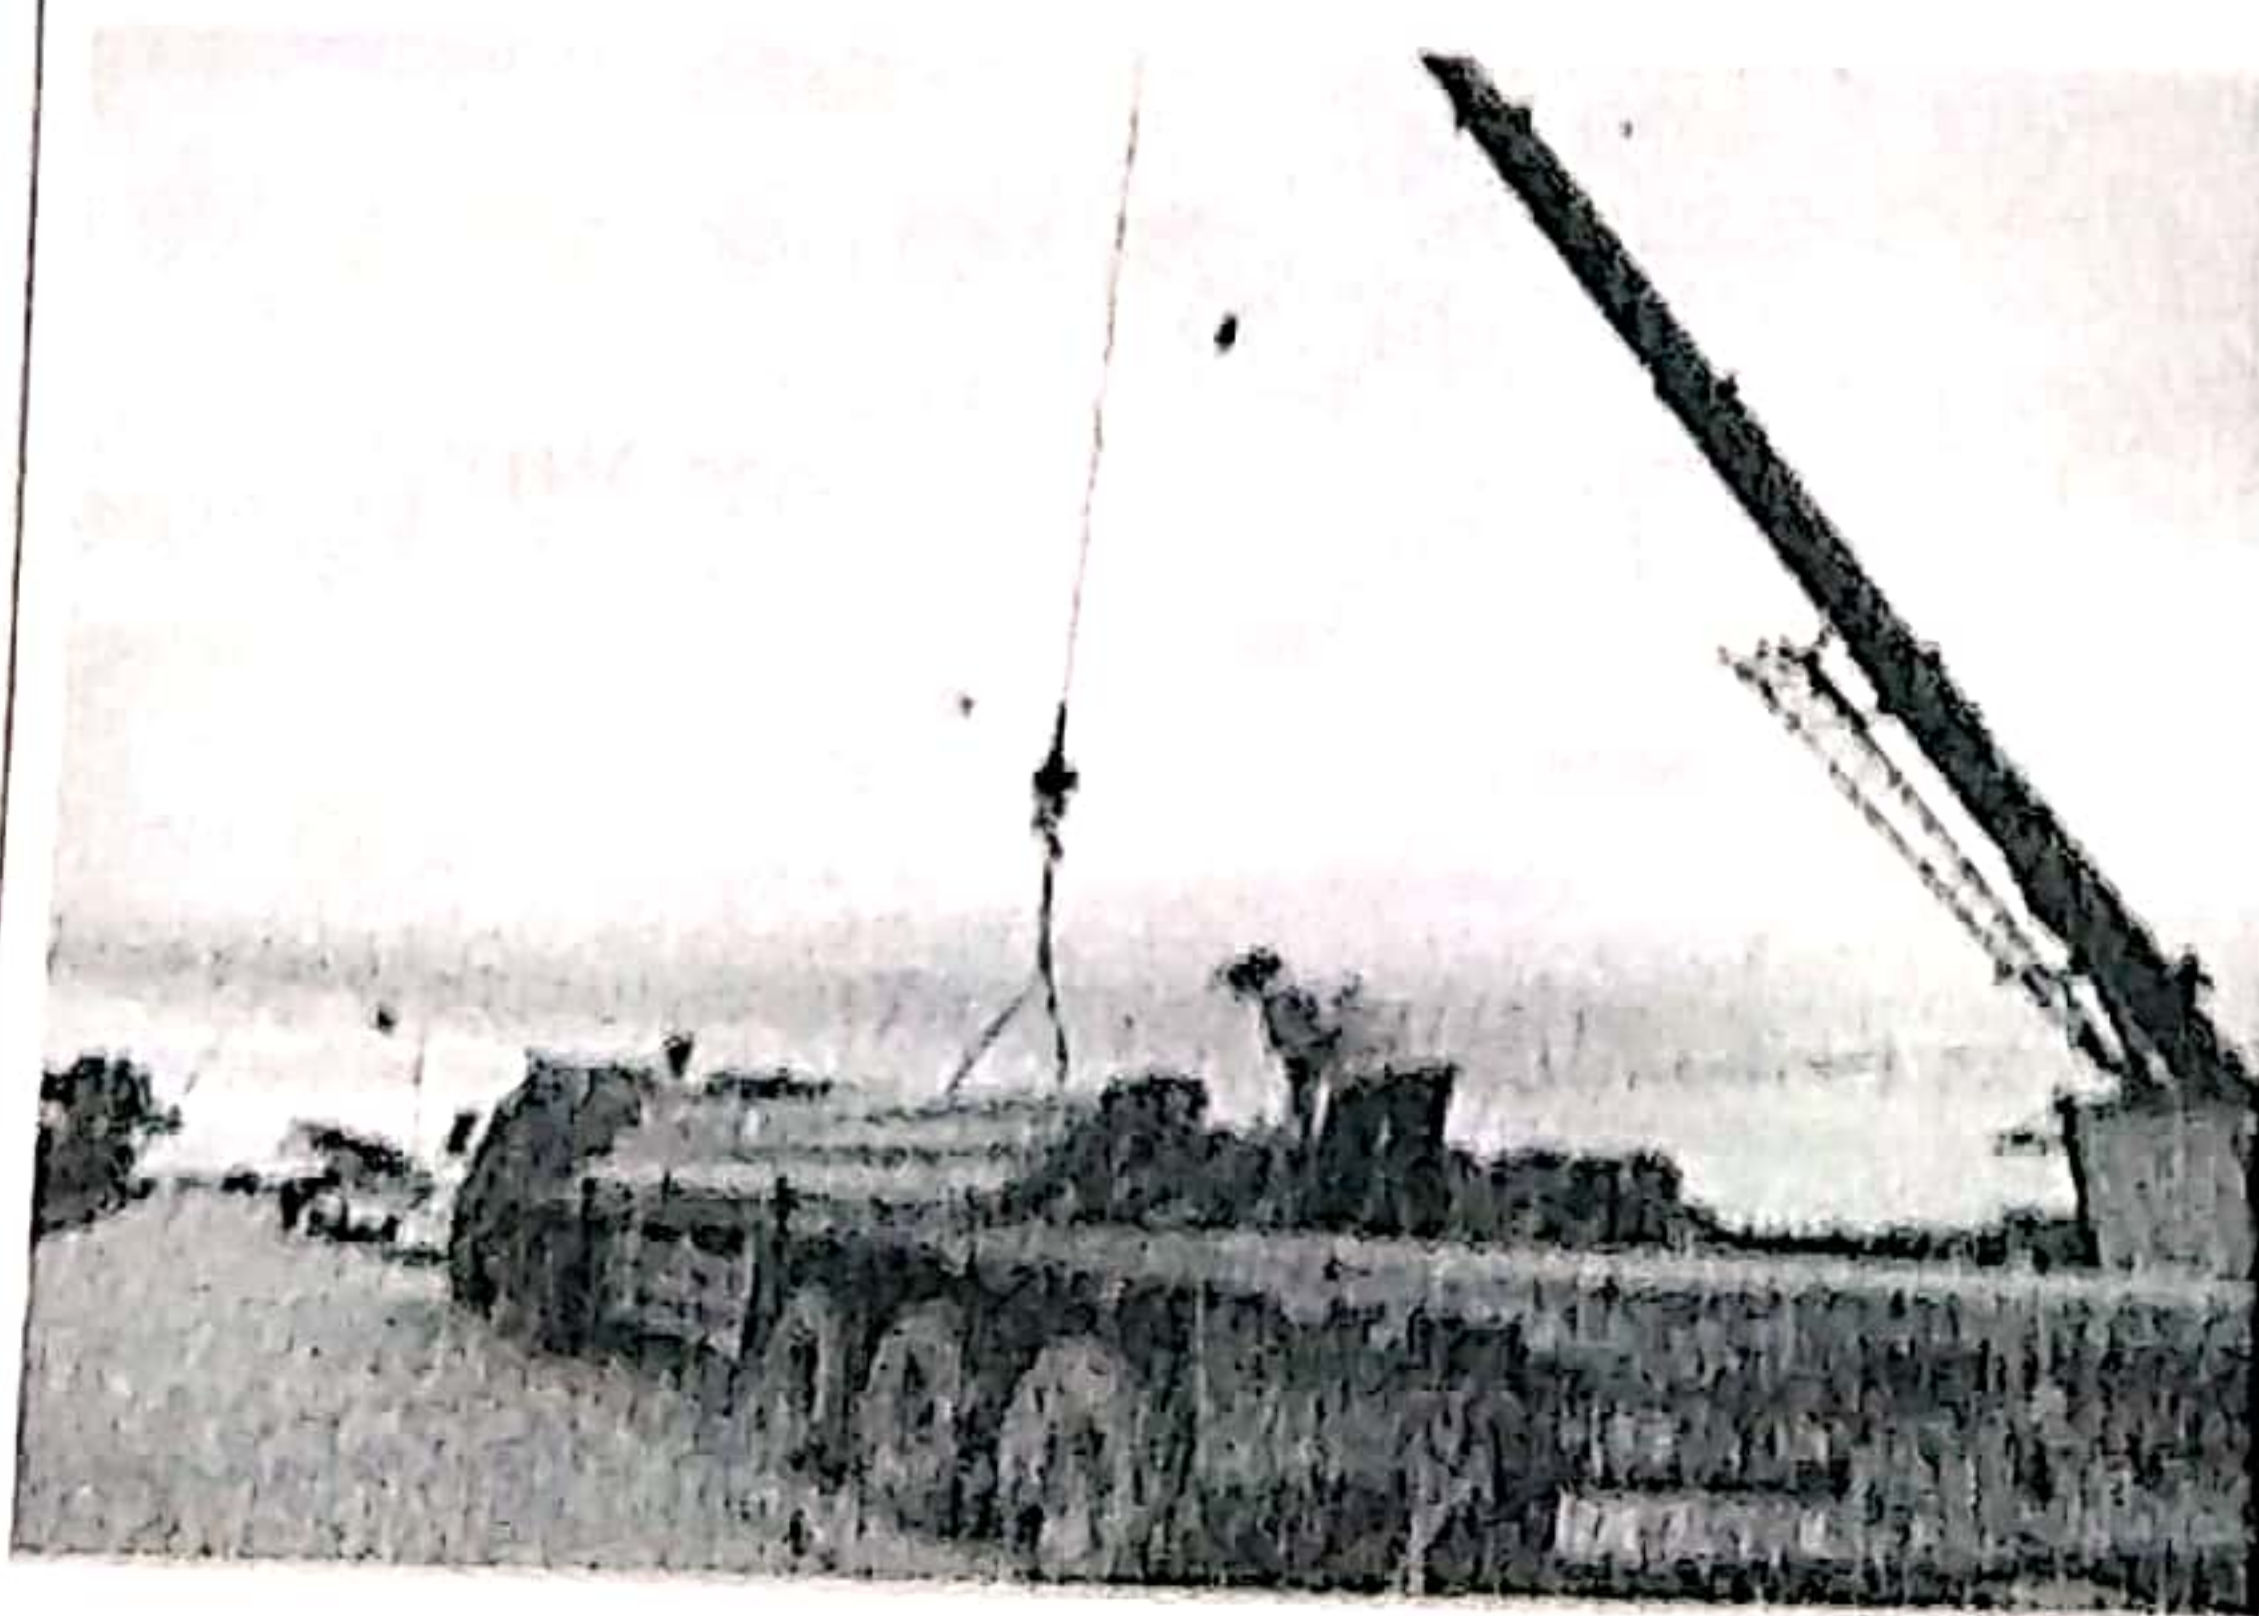

管桩进场吊卸

施工单位报审资料；主持召开第一次监理例会，参加图纸交底会议；打桩船、浮挖等机械进场；电缆进场；三方报验验收；召开电气图纸会审会议；电缆沟开挖；支架立柱进场；业主、总包、施工单位对立柱镀锌层进行检查；参加安委会成立会议；主持召开第二次监理例会；A3区域管桩打桩；逆变器进场等；




华能江西分公司领导来现场检查




试打第一根管桩



打桩施工

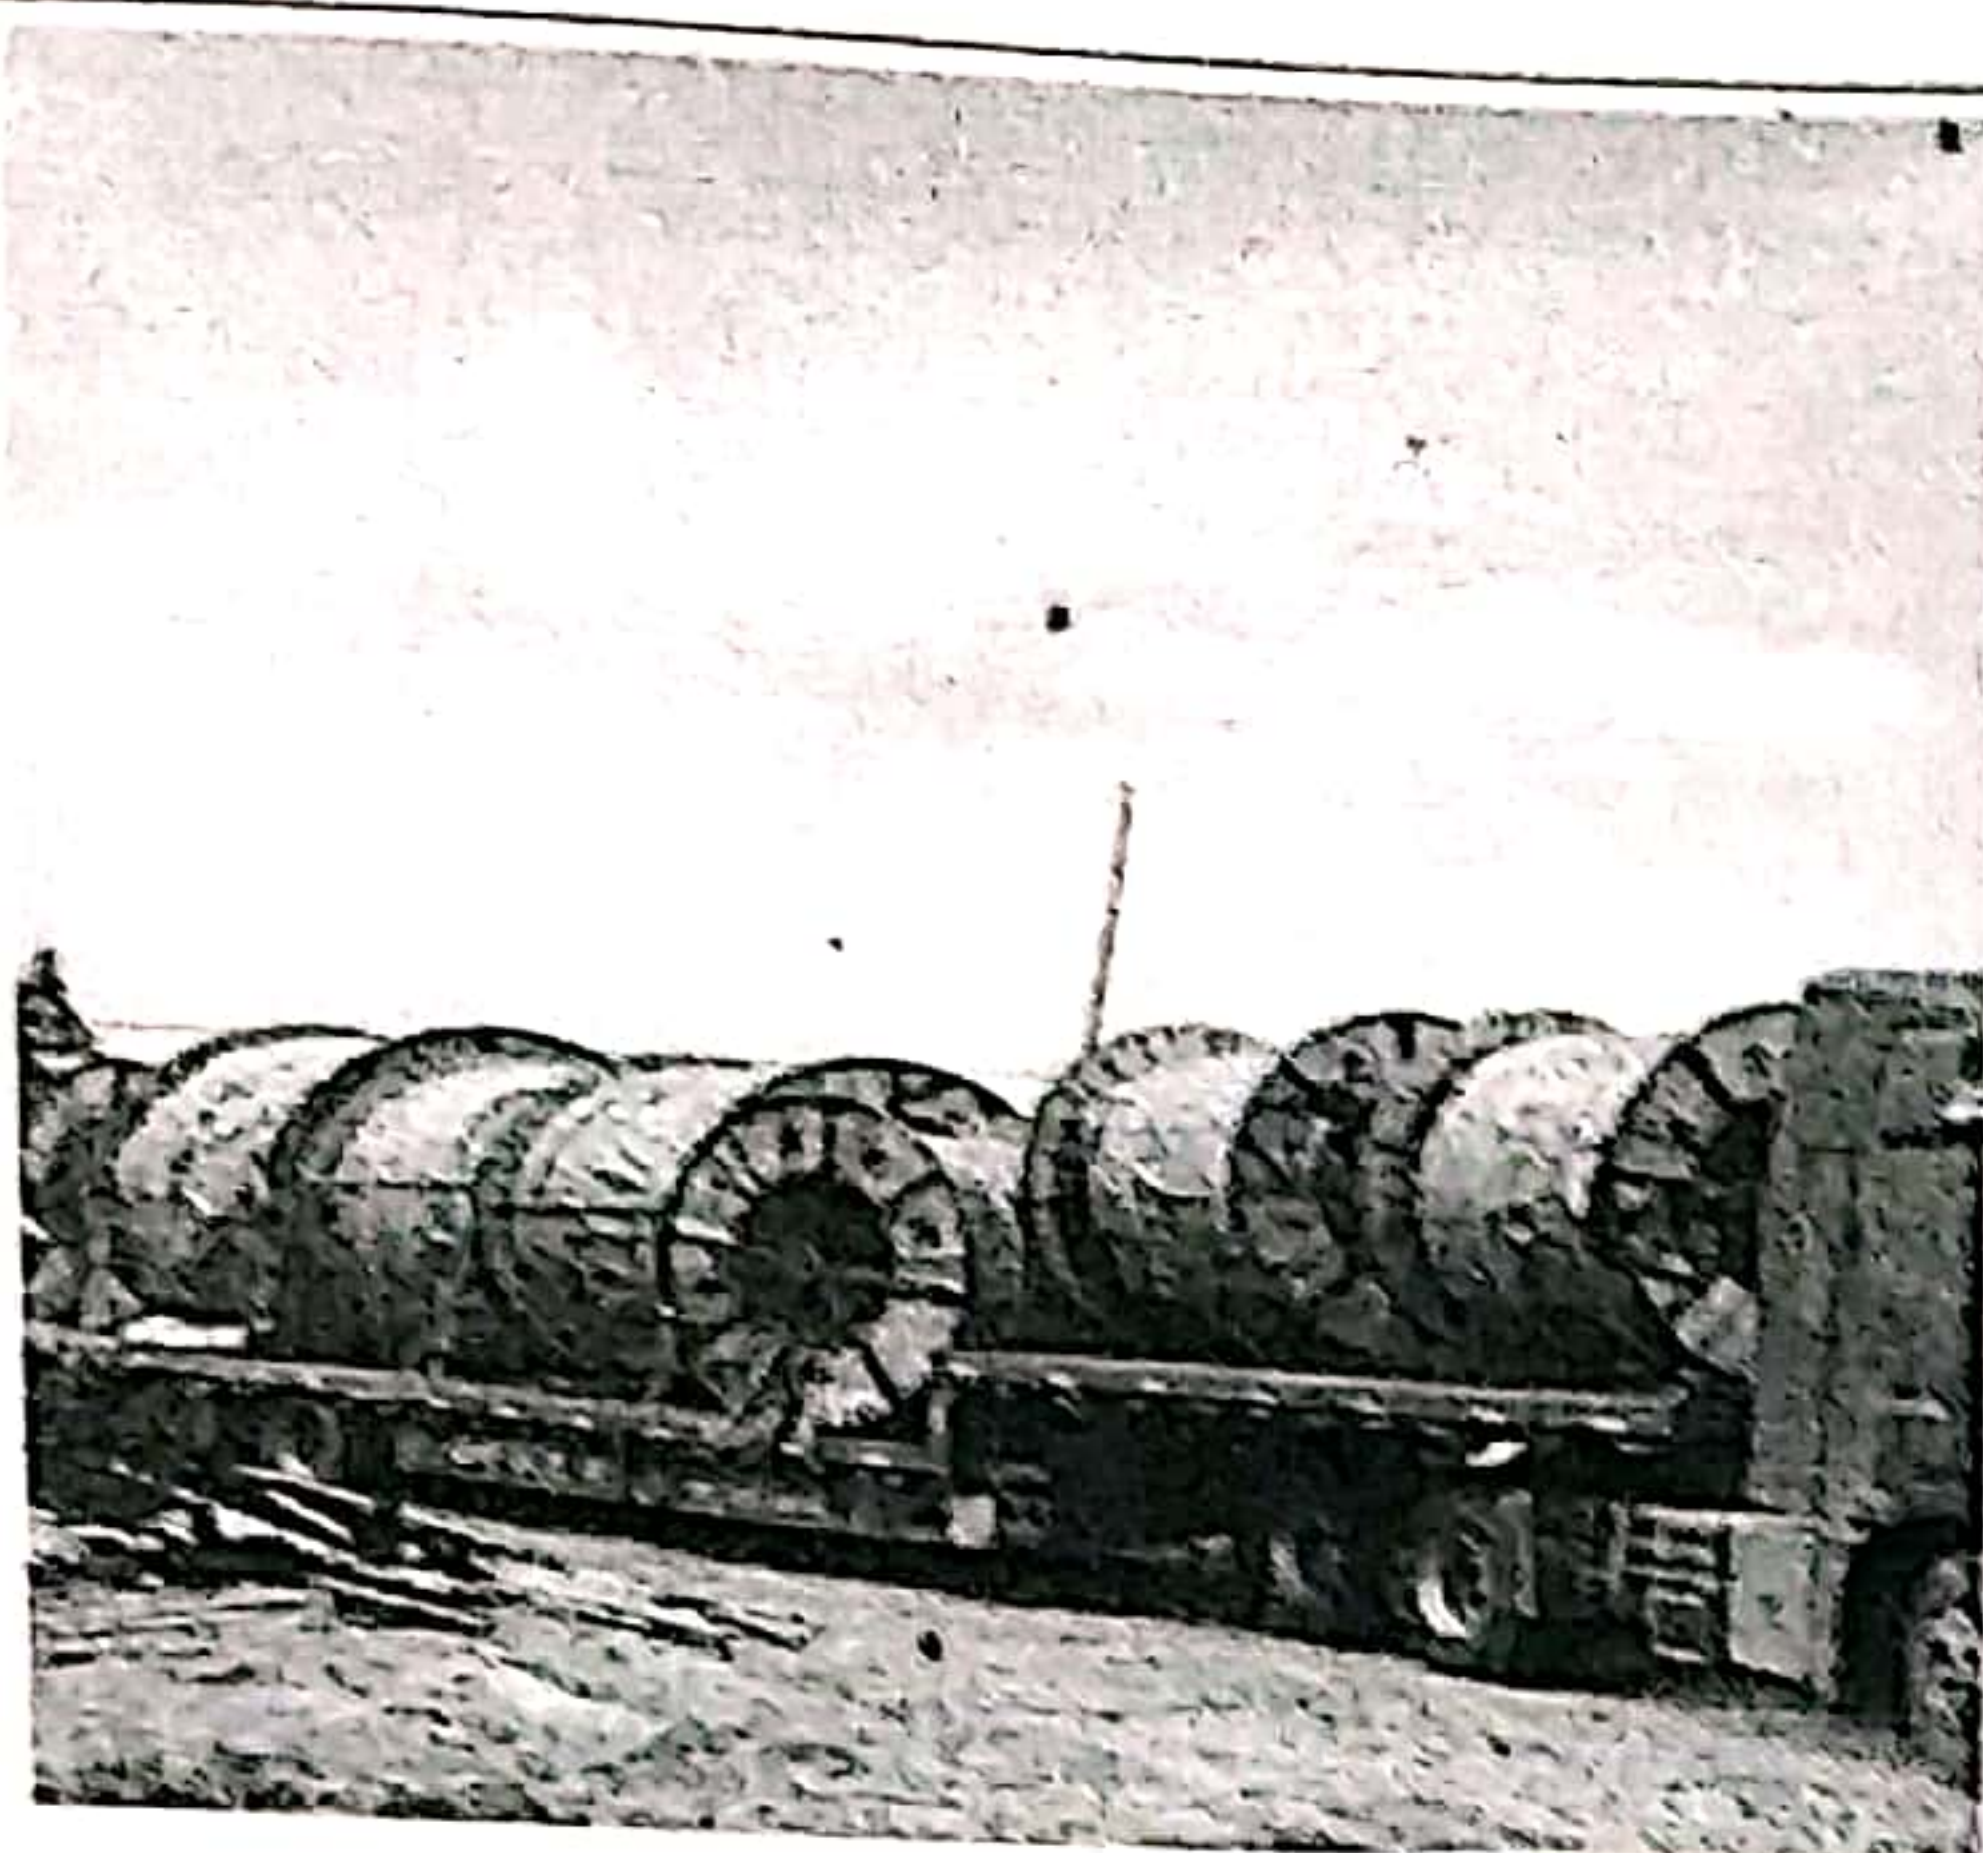

电缆进场

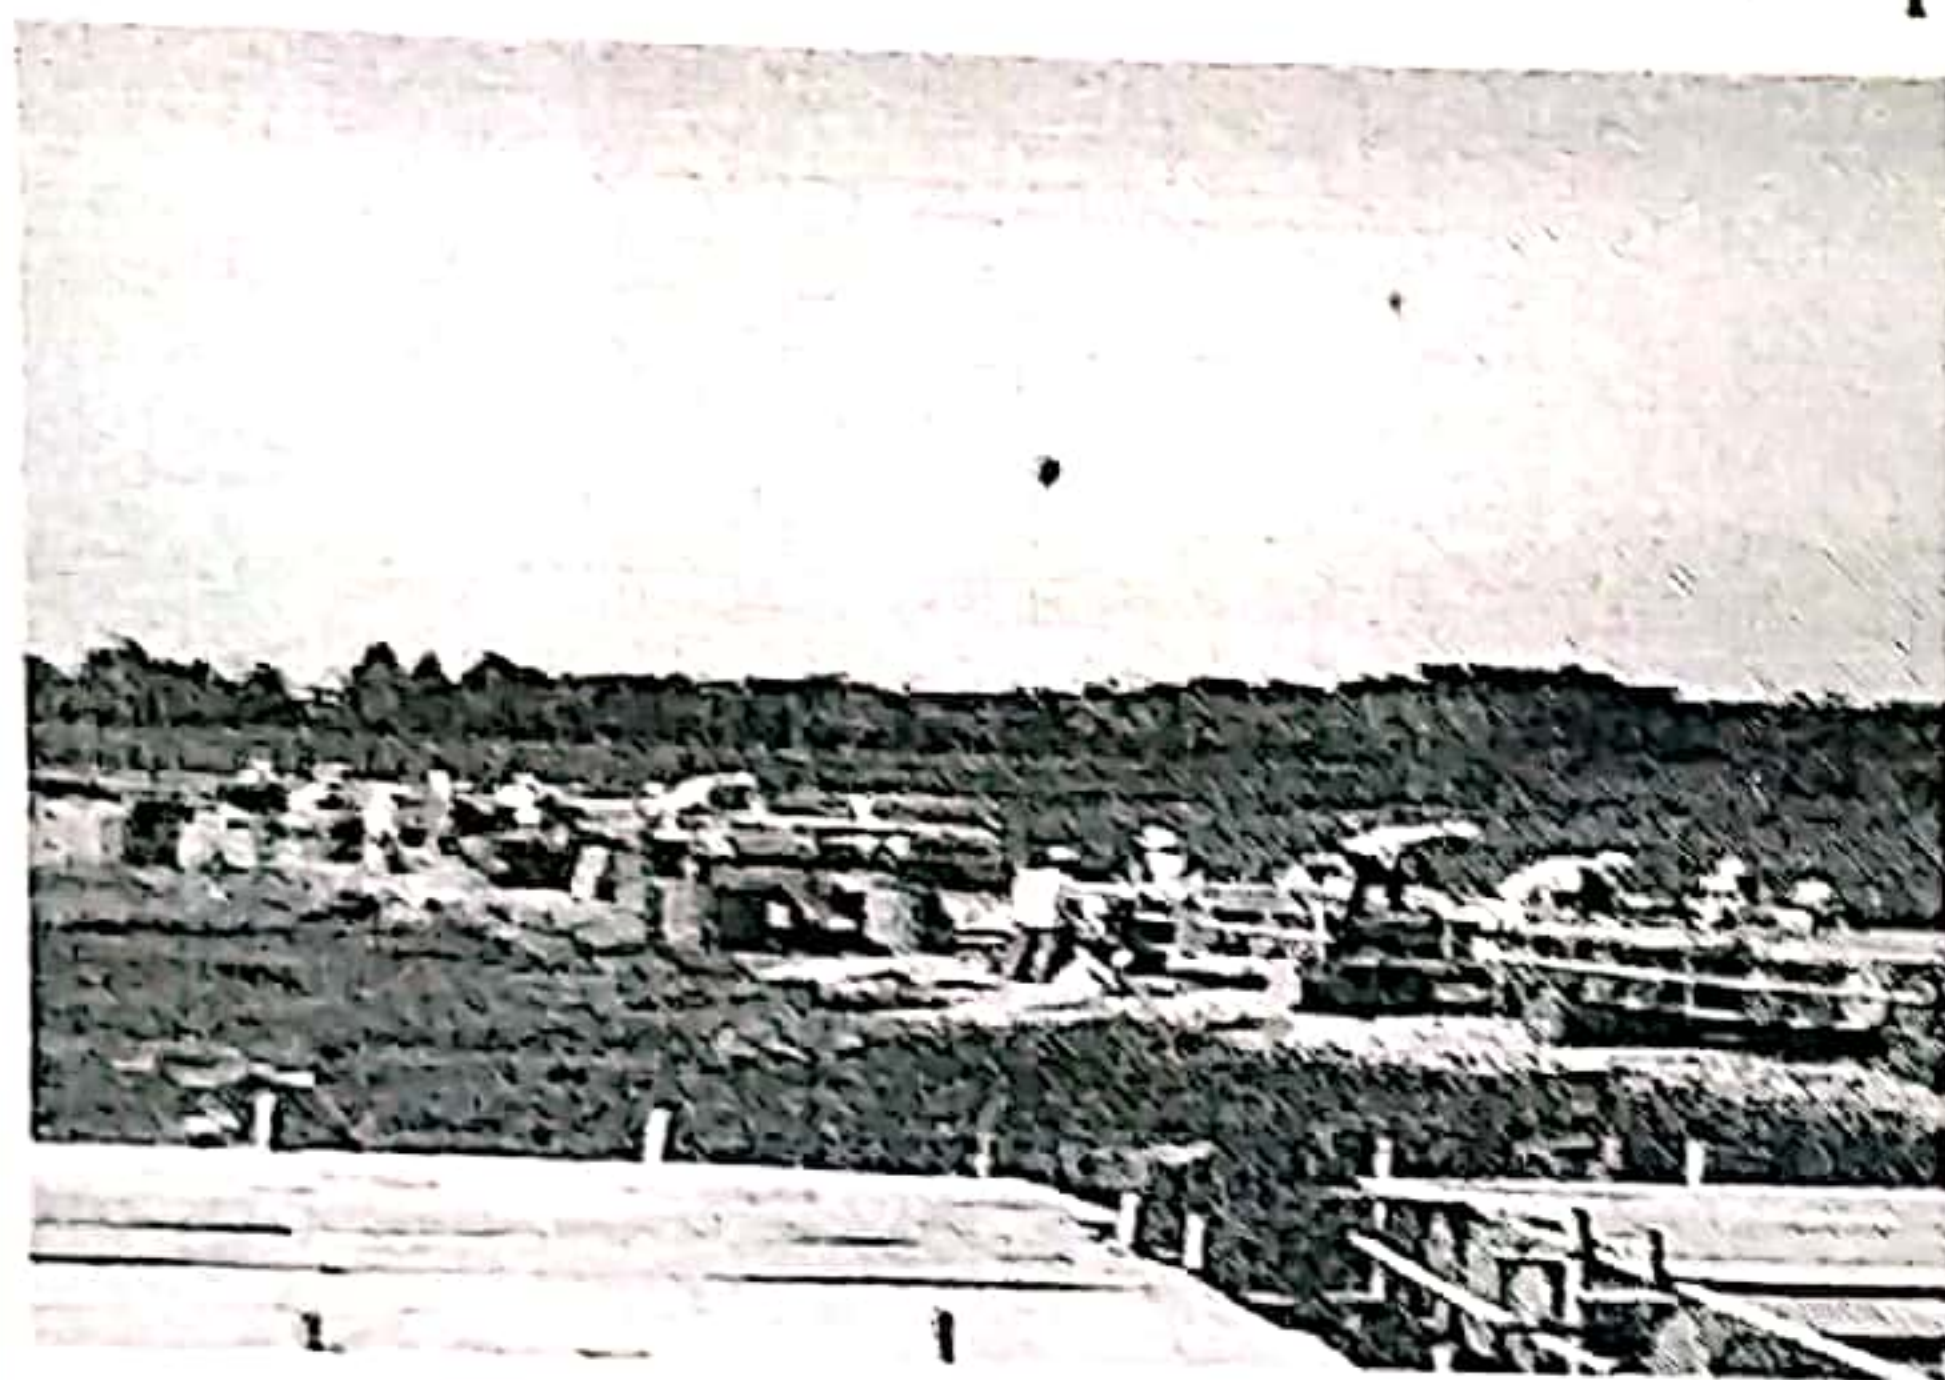


浮船组装




对进场管桩进行检查



支架立柱进场

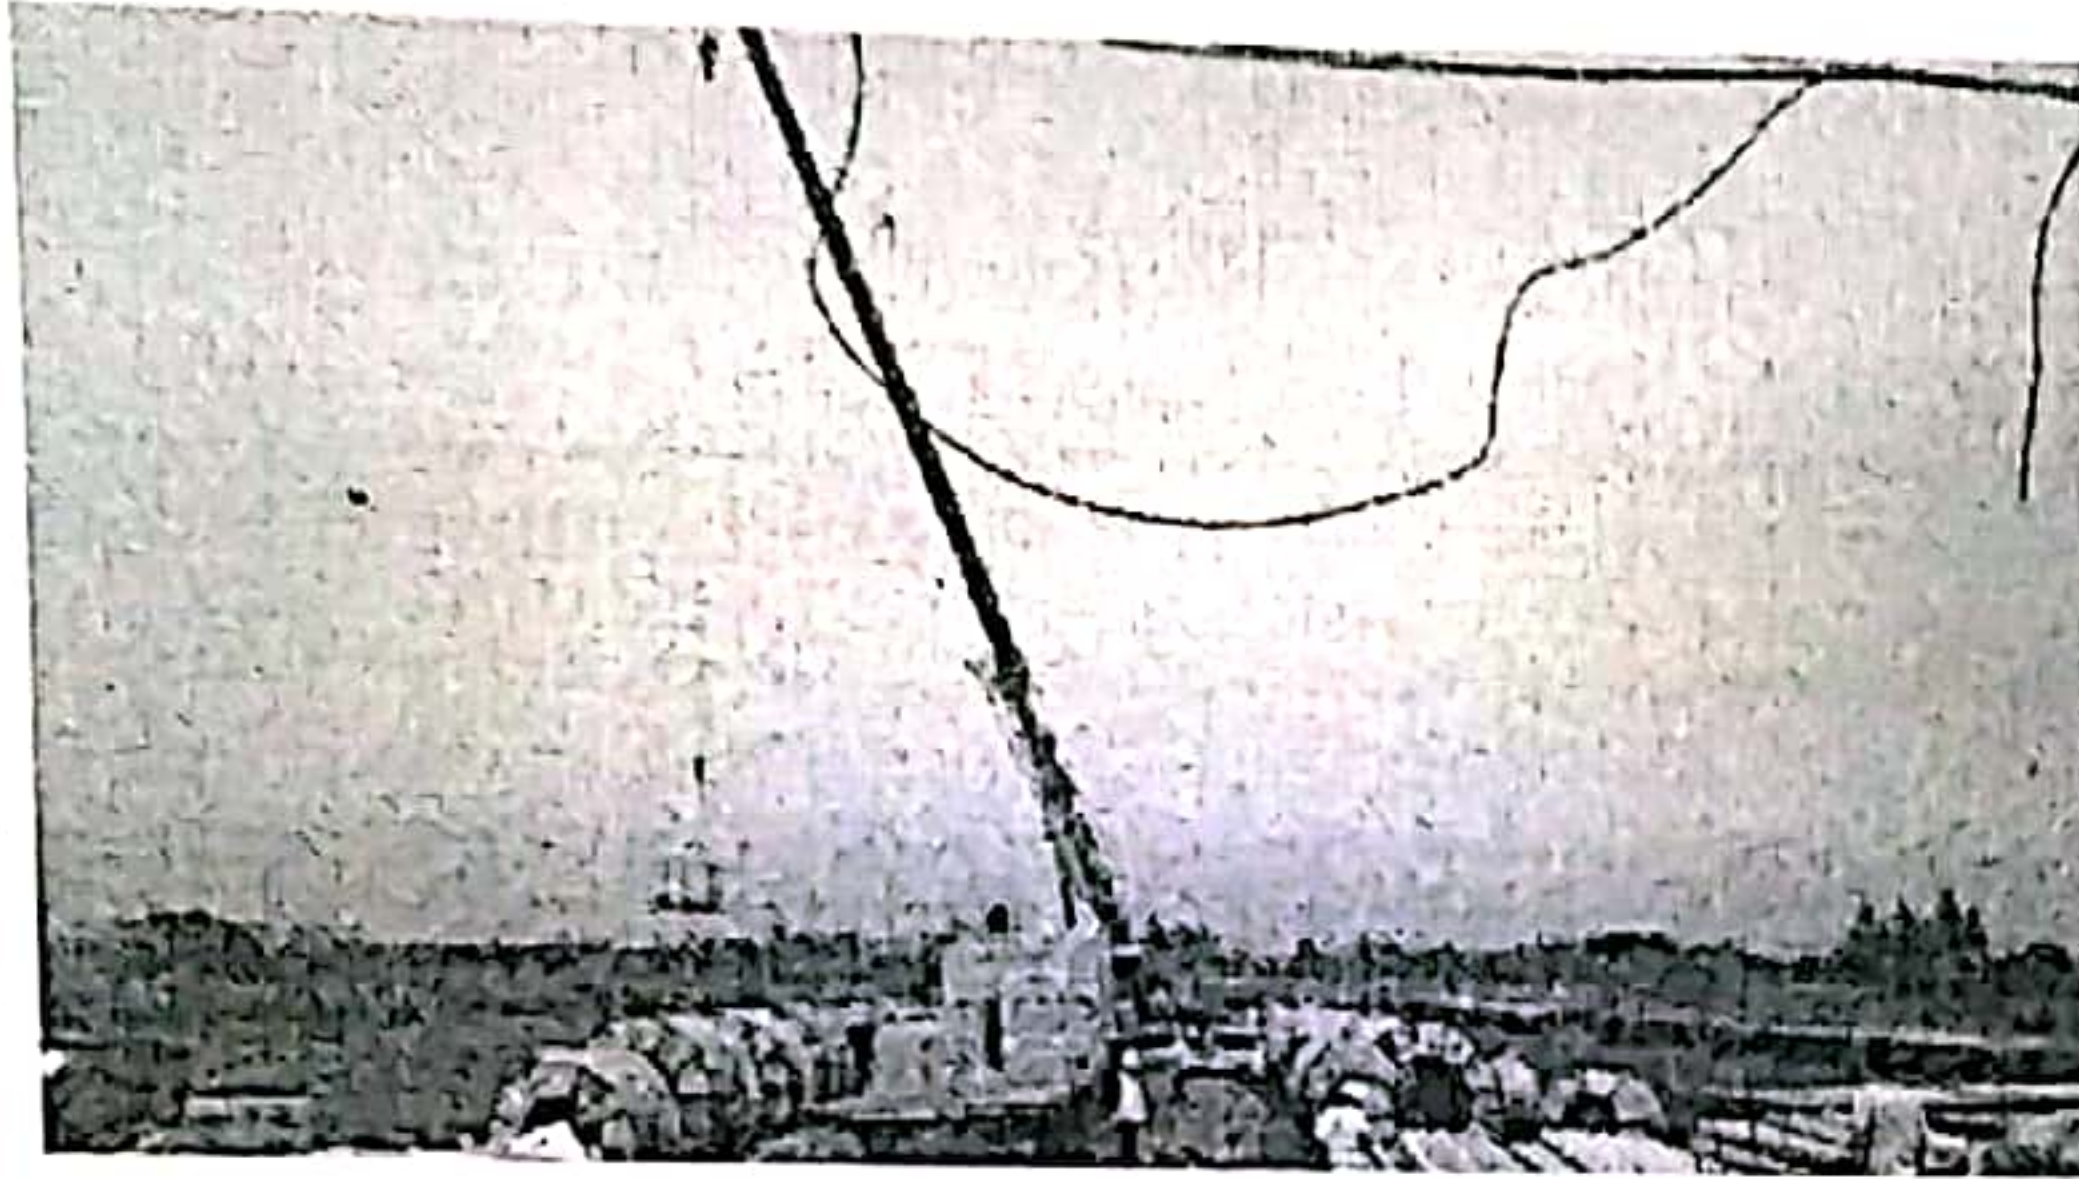

逆变器进场吊卸

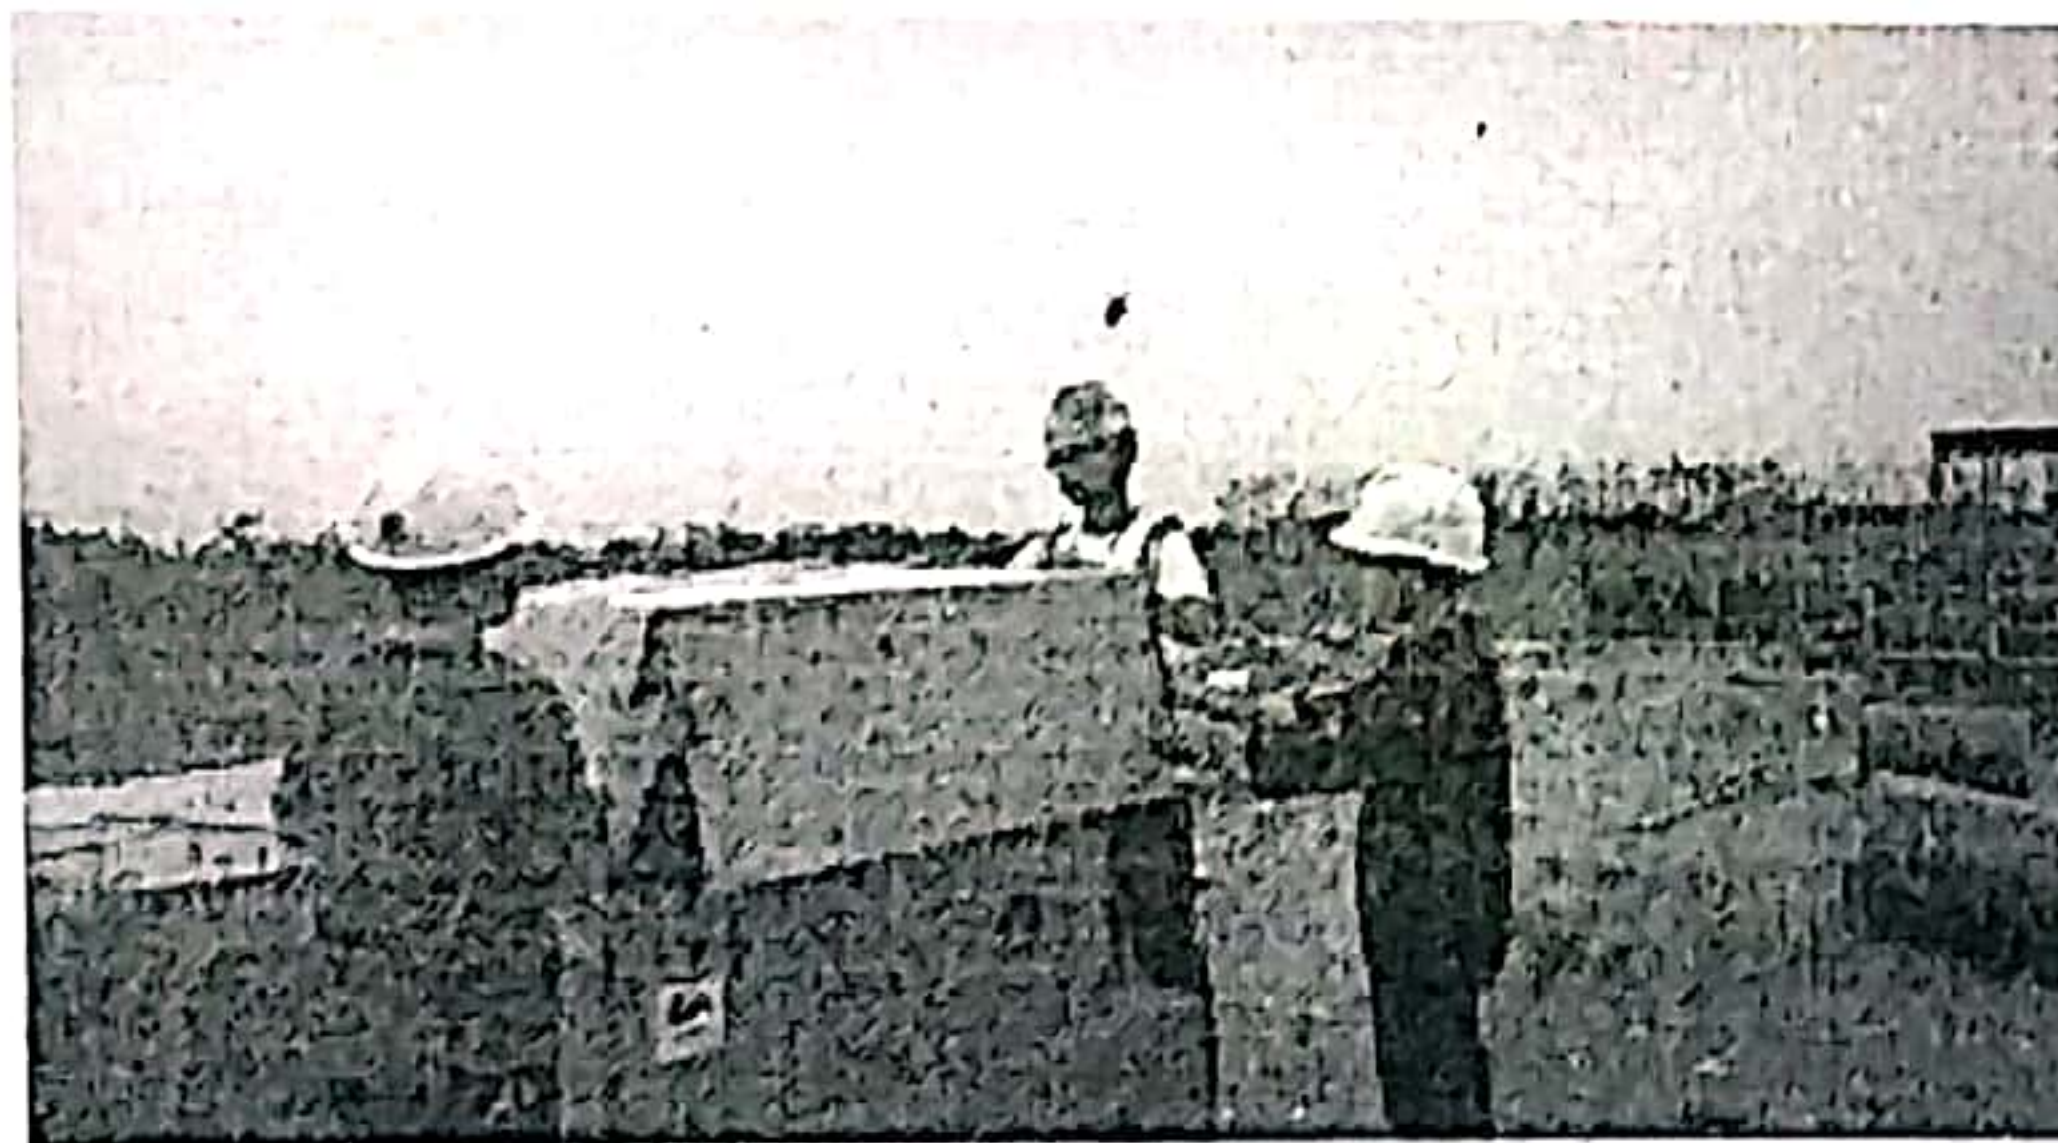

逆变器及通讯柜开箱检查

设备交付进度

陆续完成中

督促并完成，

设计交付进度

光伏区土建、
电气图纸已
出

做好图纸交付

质量体系运作情况

质量体系健
全，运行良好

落实质量保证体
系，并对运行情
况进行检查

施工图会审

已完成

对施工图纸进行
会审

	设计交底	打桩技术交底已完成	陆续完成其它工序设计交底
	方案审查	部分已审查	督促施工单位方案报审
	技术交底	完成	做好技术交底
	设计变更	无	
安全	安全培训情况	新进场员工已进行安全培训	督促新进员工安全培训
	安全交底情况	督促施工单位对危险作业点进行安全交底	督促施工单位做好安全交底。
	安全措施落实情况	落实不彻底，已要求施工单位认真落实	督促做好安全措施落实
	安全文明施工情况	现场安全、文明措施良好	加强现场安全管理力度
质量	主要工序质量	符合要求	加大工序检查力度，规范施工。
	主要原材料质量	已完成	已完成
	构（配）件质量	已完成	已完成
	设备质量	已完成	已完成
	质量验评情况	工序施工符合要求	已完成
投资	资金情况	/	/
	款项支付情况	/	/
	预算外签证	无	/

合同	合同签订情况	施工合同签订	/
	合同执行情况	按合同执行良好	做好合同执行工作

二、本月进度情况

21#、23#、24#、26#箱变附近清表、场平完成约 2300 米；4 号集电线路进场主干道填筑完成，本周完成约 250 米，其它支路填筑约 150 米；4 号集电线路区域打桩船航道基本打通。升压站改造工作纵向加密设备安装完毕。4 号集电线路区域鱼塘打桩 26 根。

三、下月进度计划

1、管桩、支架、组件、桥架进场。

2、A3 区域管桩施工、支架安装、组件安装、逆变器安装。

3、A3 区域电缆沟、接地沟开挖；电缆顶管施工；电缆桥架施工；电缆敷设。

四、安全文明施工情况

事故（起）			编制安全策划文件(份)	施工人数	安全分包情况			
人身重伤	机械设备	电网事故			分包队伍数量	分包队伍人数	系统外包队伍数量	系统外队伍人数
无	无	无		39 人	1	/	/	/

五、施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	督促施工单位优化人、机、料、法、环等资源配置，充分调动施工人员的积极性	根据工作面合理增加人员及机械，工序材料及时进场
安全管理	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，安委会要定期对现场进行安全检查；对新进场施工人员进行	实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正

	行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施；审查施工项目部<<安全文明措施>>及施工项目部施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件，实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正	
质量管理	督促施工质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划，做好每道工序报验，验收合格后才能下道工序，并对到场材料和施工质量进行检查	督促施工单位按照施工工艺和设计要求的规范要求进行施工
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工	参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，监督检查执行情况
造价管理	对施工单位申请的工程款及时进行评审	对工程量实施计量，及时审核施工项目部报送的工程量清单、进度款支付申请
物资供应	协助建设单位做好建设物资进场工作，督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失	协助建设单位做好建设物资进场工作，督促施工单位做好物资供应工作

常州正衡电力工程监理有限公司

蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目监理部

2020 年 6 月 30 日
