

芜湖凯源 3.2MW 屋顶分布式光伏发电项目

监理单位月报 2020 年 1 期


项目：芜湖凯源 3.2MW 屋顶分布式光伏发电项目		填报周期：2020 年 06 月 16 日—06 月 30 日		
一、项目总体建设进度汇总：				
1、班组建设（人员入场体检、安全交底培训）；				
2、上屋顶爬梯焊接；				
3、采光带安全措施安装；				
4、电缆通道确定；				
5、与企业沟通卸货位置；				
6、并网柜安装位置确认				
二、本月工程建设工作内容及完成情况				
1、支架及组件安装	支架安装完成 15%； 组件未施工			
2、逆变器及并网柜	未施工。			
3、现场调试	未施工。			
4、桥架、接地	未施工			
5、电缆敷设接线	未施工			
6、出图情况	图纸齐全。			
10、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本月到货情况，累计到货（），已到货数量（）% 延误原因及催货措施
	夹具	6 月 15 日	06 月 22 日	到货 100%
	导轨	6 月 20 日	06 月 29 日	到货 80%
	电缆桥架	7 月 5 日		未到货
	接地扁钢、镀锌管	7 月 5 日		未到货
	并网柜	7 月 5 日		未到货
	组件	6 月 21 日	6 月 28 日	到货 100%
	逆变器	6 月 25 日	6 月 24 日	到货 100%



	电缆设备	7月10日-		未到货
11、人员/机械情况	本月施工人员 5 人，吊车 1 台，铲车 1 台。			
三、截止本月工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首套组件安装	06月15	6月22日	7月4日	到货计划延迟，
2、全容量并网	8月3日			
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题	和企业电力通道需要确认；并网柜安装的位置需要确认；			
未解决的协调问题 解决进展				
五、下月计划主要工作内容				
1、组件区域工程	安装完成 100%			
2、逆变器	安装完成 100%			
3、并网柜	安装完成 100%			
4、桥架	安装完成 100%			
5、接地	安装完成 100%			
6、电缆敷设接线	安装完成 100%			
7、并网	全容量并网			

填报人：/ 审核人：王士杰 时间：2020.06.30

工程现场照片

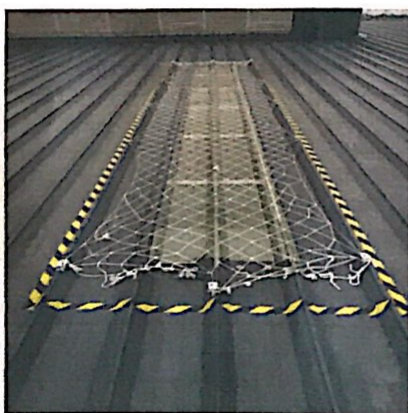



采光带安全措施、夹具安装、组件卸货、逆变器卸货；

常州正衡电力工程监理有限公司

2020年6月30日

