



正衡监理

XDXGFFPX-2-852-2-2-2

监 理 月 报

工程名称：南京国轩新能源有限公司 3.8MW 分布式光伏发电项目

2020 年 09 月 第 2 期

监理项目部（章）：

总监理工程师：

南京国轩新能源有限公司 3.8MW 分布式光伏发电项目 监理项目部

报告日期： 2020 年 09 月 30 日

监理月报

工程名称: 南京国轩新能源有限公司 3.8MW 分布式光伏发电项目月报_第 2 次月报

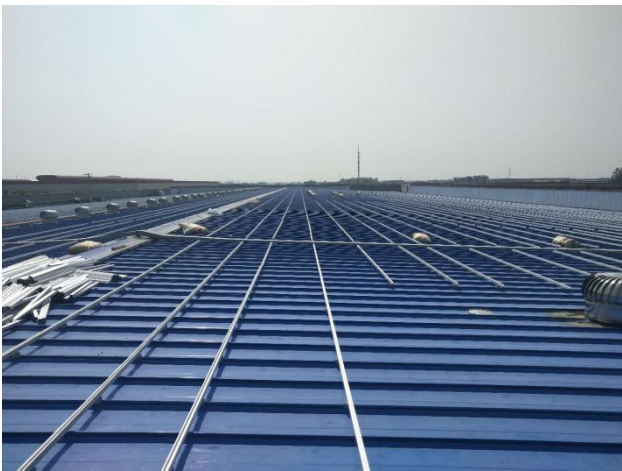
开始时间 2020 年 08 月 03 日-结束日期 2020 年 11 月 03 日

监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工单位名称	资料类型	资料数量	备注
1	南京国轩新能源有限公司 3.8MW 分布式光伏发电项目	四川渝庆建安建设工程有限公司	影像	4 张	

二、监理重点工作情况

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度		1、组件安装 5000 块 2、桥架安装 80% 3、检修通道安装 80% 4、土建基础垫层浇筑 5、扁铁安装 30% 设备/材料到货情况	组件的安装工作; 电缆敷设; 桥架安装等。



- 1、组件全部到场
- 2、逆变器全部到场
- 3、扁铁全部到场
- 4、桥架全部到场
- 5、电缆全部到场

	设备交付进度	支架已进场 4MW，桥架全部进场	
	设计交付进度	蓝图、CAD 图纸已交付	
	质量体系运作情况	质量体系较健全，运行良好	落实质量保证体系，并对运行情况进行检查
	施工图会审	完成	
	设计交底	完成	
	方案审查	完成	督促施工单位报审其他资料
	技术交底	完成	
	设计变更	设计变更	
安 全	安全培训情况	进场人员已进行安全培训	对进场新员工进行安全教育
	安全交底情况	督促施工单位对危险作业点进行班前交底、审核	继续督促施工单位进行班前交底
	安全措施落实情况	落实到位	监督施工单位认真落实安全措施
	安全文明施工情况	现场安全、文明措施良好	加强现场安全管理力度
质 量	主要工序质量		
	主要原材料质量	支架型号质量按技术参数，抽检合格	对主要材料进行检查
	构（配）件质量	进场材料质量合格	进场材料质量合格
	设备质量	进行进场报验、开箱检查	
	质量验评情况	工序施工符合要求	加强过程检查力度，加大工序报验抽查力度

投 资	资金情况	/	/
	款项支付情况	/	/
	预算外签证	无	/
合 同	合同签订情况	施工合同签订	/
	合同执行情况	按合同执行	严格按合同执行现场工作

三、本月进度情况

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	本月实际完成（完成量/总量）	累计完成（完成量/总量）	备注
四川渝庆建安建设工程有限公司								
1	支架安装				0			
2	组件安装							
3	直流电缆4mm2							
4	逆变器安装							

四、下月进度计划

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	下月计划完成（完成量/总量）	本月实际完成（完成量/总量）	权值
四川渝庆建安建设工程有限公司								
1	组件安装							
2	电缆敷设							
3	逆变器安装							
4	集电线路							

五、安全文明施工情况

事故（起）			编制安全策划文件(份)	施工人数	安全分包情况			
人身重伤	机械设备	电网事故			分包队伍数量	分包队伍人数	系统外包队伍数量	系统外队伍人数
无	无	无		18人	1个	/	/	/

六、施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	督促施工单位优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性	下月主要进行组件安装，交流电缆敷设是施工等配合业主及各方完成并网。
安全管理	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，安委会要定期对现场进行安全检查；对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。	审查施工项目部<<安全文明措施>>及施工项目部施工安全管理文件、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件，实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。
质量管理	组件到场进行开箱检查；单位工程重点部位施工进行旁站；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。	督促施工单位按照施工工艺和设计要求及国标的规范要求进行施工
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。	参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，监督检查执行情况。
造价管理	无	
物资供应	协助建设单位做好建设物资进场工作，督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。	督促施工单位按照复工日期的要求，安排人员、机具进行施工。

常州正衡电力工程监理有限公司

南京国轩新能源有限公司 3.8MW 分布式光伏发电项目监理部

2020 年 09 月 30 日
