



编号 RZTH-ZHJL-YB-005

监 理 月 报

工程名称：日照市天海新能源科技有限公司 5.35MW 分布式
光伏发电项目

2020 年 12 月第 5 期

项目监理部（章）：

总监理工程师：王立杰

报告日期：2020 年 12 月 26 日

监 理 月 报

工程名称: 日照市天海新能源科技有限公司 5.35MW 分布式光伏发电项目 月次 第 5 次 月报开始时间

间 2020 年 11 月 26 日 结束日期 2020 年 12 月 25 日 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司


一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	日照市天海新能源科技有限公司 5.35MW 分布式光伏发电项目		影像	6 张	

一、 监理重点工作情况

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度		1# 车间支架及组件安装, 2# 车间桥架及电缆敷设, 3# 车间桥架敷设, 逆变器、汇流箱、并网柜、接地安装 并网成功	消缺、桥架盖板安装、运维通道安装、清洗系统安装



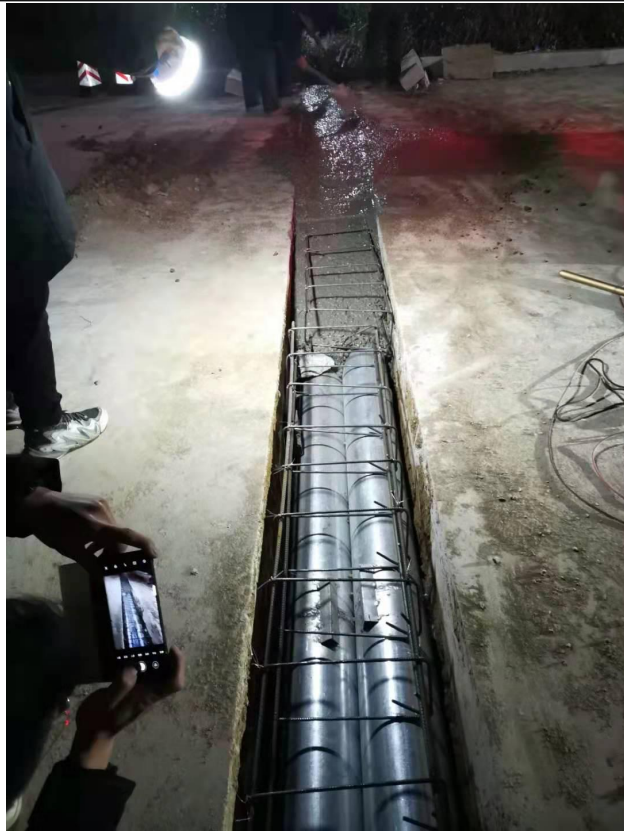

			
	设备交付进度	全部完成	、
	设计交付进度	图纸完成	图纸完成
	质量体系运作情况	质量体系健全，运行良好	落实质量保证体系，并对运行情况进行检查
	施工图会审	完成	
	设计交底	完成	
	方案审查	完成	督促施工单位报审其他资料
	技术交底	完成	
	设计变更	无	
安全	安全培训情况	新进场员工已进行安全培训	督促施工单位对进场新员工进行安全教育
	安全交底情况	督促施工单位对危险作业点进行班前交底	继续督促施工单位进行班前交底
	安全措施落实情况	落实不彻底，已要求施工单位认真落实	监督施工单位认真落实安全措施
	安全文明施工情况	现场安全、文明	加强现场安全

		措施良好	管理力度
质量	主要工序质量	无	支架及组件安装；电缆敷设，电缆头制作。
	主要原材料质量	支架外观检查合格	对主要材料进行检查
	构（配）件质量	进场材料质量合格	把控好进场材料质量关
	设备质量		进行进场报验、开箱检查
	质量验评情况	工序施工符合要求	加强过程检查力度，加大工序报验抽查力度
投资	资金情况	/	/
	款项支付情况	/	/
	预算外签证	无	/
合同	合同签订情况	施工合同签订	/
	合同执行情况	按合同执行	做好合同执行工作

二、 本月进度情况

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	本月实际完成（完成量 / 总量）	累计完成（完成量 / 总量）	备注
1	2#厂房加固	20200817	20200910	20200817	20200910		100%	

2	3#厂房加固	20200912	20201015	20201007	20201025	100%	100%	
3	2#、3#厂房屋面定位放线	20200925	20200927	20200925	20200927	100%	100%	
4	2#、3#厂房屋面支架安装	20200926	20201015	20200926	20201020	100%	100%	
5	2#、3#厂房屋面组件	20201007	20201115	20201007	20201120	100%	100%	
6	1#、2#、3#桥架安装	20201124	20201210	20201124	20201210	100%	100%	
7	1#、2#、3#电缆安装	20201124	20201210	20201124	20201210	30%	100%	
8	1#、2#、3#逆变器安装	20201124	20201210	20201124	20201210	30%	100%	
9	1#、2#、3#汇流箱、并网柜安装	20201215	20201228	20201215	20201228	100%	100%	

三、 下月进度计划

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	下月计划完成（完成量 / 总量）	本月实际完成（完成量 / 总量）	备注
1	2#厂房加固	20200817	20200910	20200817	20200910		100%	
2	3#厂房加固	20200912	20201015	20201007	20201025		100%	
3	2#、3#厂房屋面定位放线	20200925	20200927	20200925	20200927		100%	
4	2#、3#厂房屋面支架安装	20200926	20201015	20200926	20201020		100%	
5	2#、3#厂房屋面组件	20201007	20201007	20201007	20201120		100%	

	件							
6	1#、2#、 3#桥架安 装	20201124	20201210	20201124	20201210		100%	
7	1#、2#、 3#电缆安 装	20201124	20201210	20201124	20201210		100%	
8	1#、2#、 3#逆变器 安装	20201124	20201210	20201124	20201210		100%	
9	1#、2#、 3#汇流 箱、并网 柜安装	20201215	20201228	20201215	20201228		100%	

四、 安全文明施工情况

事故（起）			编制安全策 划文件（份）	施工 人数	安全分包情况			
人身重 伤	机械设 备	电网事 故			分包队 伍数量	分包队 伍人数	系统外 包队伍 数量	系统外 队伍人 数
无	无	无		13 人	/	/	/	/

五、 施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	督促施工单位优化人、机、料等资源配置	要求施工单位合理安排施工进度计划，及时调整人力、物力
安全管理	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，安委会要定期对现场进行安全检查； 对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。	审查施工项目部<<安全文明措施>>及施工项目部施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件，实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。
质量管理	组件到场进行开箱检查；督促施工单位质	督促施工单位按照施工工艺和设计要求规范施工

	量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。	
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。	参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，监督检查执行情况。
造价管理	无	对工程量实施计量，及时审核施工项目部报送的工程量清单、进度款支付申请
物资供应	协助建设单位做好建设物资进场工作，督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。	督促施工单位按照复工日期的要求，安排人员、机具进行施工。

常州正衡电力工程监理有限公司
日照市天海新能源科技有限公司 5.35MW 分布式光伏发电项目监理部
2020 年 12 月 26 日
