



编号 RZTH-ZHJL-YB-001

## 监 理 月 报

工程名称：日照市天海新能源科技有限公司 5.35MW 分布式  
光伏发电项目

2020 年 08 月第 1 期

项目监理部（章）：

总监理工程师：王立杰

报告日期：2020 年 08 月 25 日

# 监 理 月 报

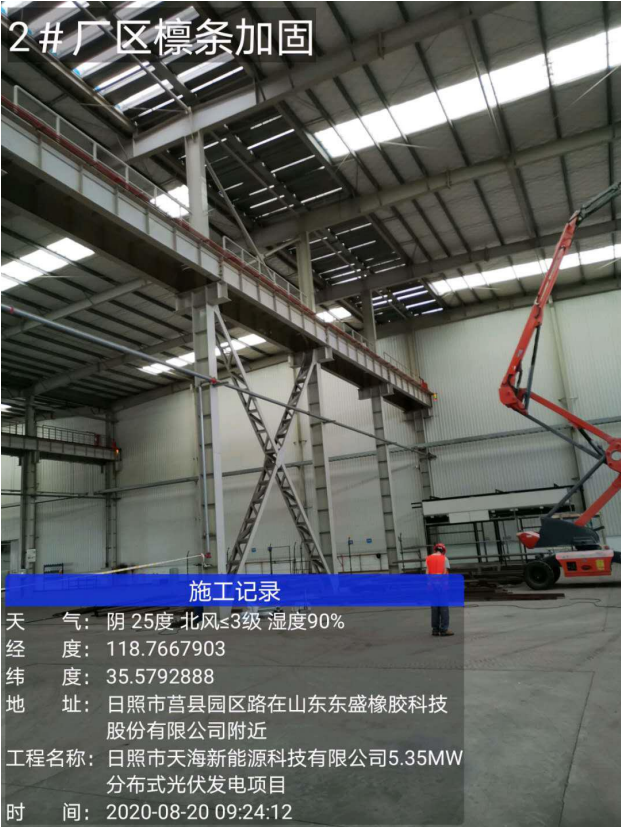
工程名称: 日照市天海新能源科技有限公司 5.35MW 分布式光伏发电项目 月次 第 1 次 月报开始时

间 2020 年 08 月 17 日 结束日期 2020 年 08 月 25 日 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

## 一、工程影像资料

| 序号 | 单位工程标准名称                        | 施工项目名称 | 资料类型 | 资料数量 | 备注 |
|----|---------------------------------|--------|------|------|----|
| 1  | 日照市天海新能源科技有限公司 5.35MW 分布式光伏发电项目 |        | 影像   | 2 张  |    |

## 一、 监理重点工作情况

| 专业 | 事项                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 本月重点工作情况 | 下月重点工作计划 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 进度 | <p>2# 厂区檩条加固</p>  <p>开工前施工现场准备及前期资料报审</p> <p>2# 厂区檩条加固, 屋面采光井防护, 施工人员技术、安全交底等</p> <p>2#、3# 厂房檩条加固, 屋面夹具、支架安装</p> <p><b>施工记录</b></p> <p>天气: 阴 25度 北风≤3级 湿度90%</p> <p>经纬度: 118.7667903 35.5792888</p> <p>地址: 日照市莒县园区路在山东东盛橡胶科技股份有限公司附近</p> <p>工程名称: 日照市天海新能源科技有限公司5.35MW 分布式光伏发电项目</p> <p>时间: 2020-08-20 09:24:12</p> |          |          |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
|    |  <p>2#厂区檩条加固</p> <p><b>施工记录</b></p> <p>天 气: 阴 25度 北风≤3级 湿度90%</p> <p>经 度: 118.7667624</p> <p>纬 度: 35.5793029</p> <p>地 址: 日照市莒县园区路在山东东盛橡胶科技股份有限公司-东南门附近</p> <p>工程名称: 日照市天海新能源科技有限公司5.35MW分布式光伏发电项目</p> <p>日 期: 2020-08-21 08:27:39</p> |              |                     |
|    | 设备交付进度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 支架等部分进场      | 设备、电缆、箱逆变器供货        |
|    | 设计交付进度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 图纸完成         | 图纸完成                |
|    | 质量体系运作情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 质量体系健全,运行良好  | 落实质量保证体系,并对运行情况进行检查 |
|    | 施工图会审                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 完成           |                     |
|    | 设计交底                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 完成           |                     |
|    | 方案审查                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 完成           | 督促施工单位报审其他资料        |
|    | 技术交底                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 完成           |                     |
|    | 设计变更                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 无            |                     |
| 安全 | 安全培训情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 新进场员工已进行安全培训 | 督促施工单位对进场新员工进行安全教育  |

|    |          |                            |                             |
|----|----------|----------------------------|-----------------------------|
|    | 安全交底情况   | 督促施工单位<br>对危险作业点<br>进行班前交底 | 继续督促施工<br>单位进行班前<br>交底      |
|    | 安全措施落实情况 | 落实不彻底，已<br>要求施工单位<br>认真落实  | 监督施工单位<br>认真落实安全<br>措施      |
|    | 安全文明施工情况 | 现场安全、文明<br>措施良好            | 加强现场安全<br>管理力度              |
| 质量 | 主要工序质量   | 无                          | 支架及组件安<br>装；电缆敷设，<br>电缆头制作。 |
|    | 主要原材料质量  | 支架外观检查<br>合格               | 对主要材料进<br>行检查               |
|    | 构（配）件质量  | 进场材料质量<br>合格               | 把控好进场材<br>料质量关              |
|    | 设备质量     |                            | 进行进场报验、<br>开箱检查             |
|    | 质量验评情况   | 工序施工符合<br>要求               | 加强过程检查<br>力度，加大工序<br>报验抽查力度 |
| 投资 | 资金情况     | /                          | /                           |
|    | 款项支付情况   | /                          | /                           |
|    | 预算外签证    | 无                          | /                           |
| 合同 | 合同签订情况   | 施工合同签订                     | /                           |
|    | 合同执行情况   | 按合同执行                      | 做好合同执行<br>工作                |
|    |          |                            |                             |

## 二、 本月进度情况

| 序号 | 任 务 名 称       | 计划开始时间   | 计划结束时间   | 施工开始日期   | 施 工 结 束日期 | 本月实际完成（完成量 / 总量） | 累 计 完 成（完成量 / 总量） | 备注 |
|----|---------------|----------|----------|----------|-----------|------------------|-------------------|----|
| 1  | 2#厂房加固        | 20200817 | 20200910 | 20200817 |           | 55%              | 55%               |    |
| 2  | 3#厂房加固        | 20200912 | 20201015 |          |           |                  |                   |    |
| 3  | 2#、3#厂房屋面定位放线 | 20200925 | 20200927 |          |           |                  |                   |    |
| 4  | 2#、3#厂房屋面支架安装 | 20200926 | 20201015 |          |           |                  |                   |    |
| 5  |               |          |          |          |           |                  |                   |    |
| 6  |               |          |          |          |           |                  |                   |    |
| 7  |               |          |          |          |           |                  |                   |    |
| 8  |               |          |          |          |           |                  |                   |    |
| 9  |               |          |          |          |           |                  |                   |    |
| 10 |               |          |          |          |           |                  |                   |    |

## 三、 下月进度计划

| 序号 | 任 务 名 称       | 计划开始时间   | 计划结束时间   | 施工开始日期   | 施 工 结 束日期 | 下月计划完成（完成量 / 总量） | 本 月 实 际 完 成（完成量 / 总量） | 备注 |
|----|---------------|----------|----------|----------|-----------|------------------|-----------------------|----|
| 1  | 2#厂房加固        | 20200817 | 20200910 | 20200817 |           | 45%              | 55%                   |    |
| 2  | 3#厂房加固        | 20200912 | 20201015 |          |           |                  |                       |    |
| 3  | 2#、3#厂房屋面定位放线 | 20200925 | 20200927 |          |           |                  |                       |    |
| 4  | 2#、3#厂房屋面支架安装 | 20200926 | 20201015 |          |           |                  |                       |    |
|    |               |          |          |          |           |                  |                       |    |
|    |               |          |          |          |           |                  |                       |    |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### 四、 安全文明施工情况

| 事故（起）    |          |          | 编制安全策<br>划文件（份） | 施工<br>人数 | 安全分包情况     |            |                  |                 |
|----------|----------|----------|-----------------|----------|------------|------------|------------------|-----------------|
| 人身重<br>伤 | 机械设<br>备 | 电网事<br>故 |                 |          | 分包队<br>伍数量 | 分包队<br>伍人数 | 系统外<br>包队伍<br>数量 | 系统外<br>队伍人<br>数 |
| 无        | 无        | 无        |                 | 5 人      | /          | /          | /                | /               |

#### 五、 施工重点工作情况

| 专业   | 本月重点工作情况                                                                     | 下月重点工作计划                                                                    |
|------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 进度管理 | 督促施工单位优化人、机、料等资源配置                                                           | 要求施工单位合理安排施工进度计划，及时调整人力、物力                                                  |
| 安全管理 | 督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，安委会要定期对现场进行安全检查；对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。 | 审查施工项目部<<安全文明措施>>及施工项目部施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件，实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。 |
| 质量管理 | 组件到场进行开箱检查；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。                               | 督促施工单位按照施工工艺和设计要求规范施工                                                       |
| 技术管理 | 督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。                                    | 参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，监督检查执行情况。                                             |
| 造价管理 | 无                                                                            | 对工程量实施计量，及时审核施工项目部报送的工程量清单、进度款支付申请                                          |

|      |                                                              |                              |
|------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 物资供应 | 协助建设单位做好建设物资进场工作，督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。 | 督促施工单位按照复工日期的要求，安排人员、机具进行施工。 |
|------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|

常州正衡电力工程监理有限公司

日照市天海新能源科技有限公司 5.35MW 分布式光伏发电项目监理部

2020 年 08 月 25 日
