

正衡监理

编号: JXM15-HXYD-02

监 理 月 报

工程名称: 滑县永达道口 2.5MWp 分布式光伏项目

2020 年 11 月

项目监理部 (章):

总监理工程师:

徐翔生

报告日期: 2020 年 11 月 25 日

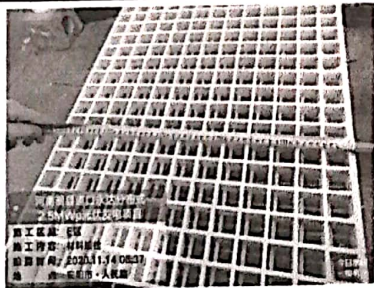
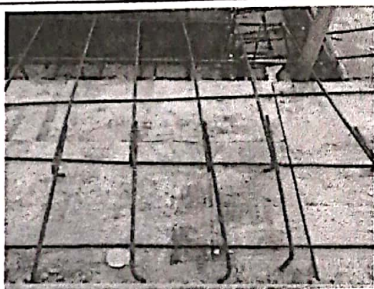
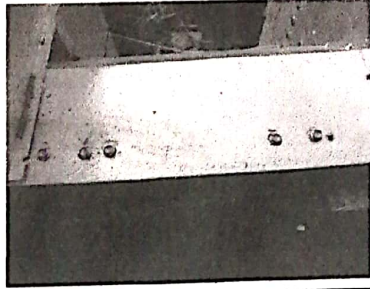
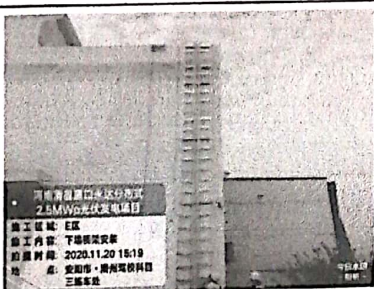

监 理 月 报

工程名称: 滑县永达道口 2.5MW 分布式光伏项目 月次 第 1 次

月报开始时间 2020 年 10 月 26 日 结束日期 2020 年 11 月 25 日

监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	滑县永达道口 2.5MW 分布式光伏项目	     	照片	10	进度、质量、安全

二、监理重点工作情况

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
	质量体系运作情况	质量体系健全，运行良好落实质量保证体系，并对运行情况进行检查	继续加强检查，发现问题即时督促整改。
	施工图会审	无	无
	方案审查	加固单位资料还未报审	催促加固单位资料及方案报审
	技术交底	已交底	/
	设计变更	无	/
安全	安全培训情况	新进场员工已进行安全培训	/
	安全交底情况	临时用电、工器具等安全文明施工进行监督检查。	加强对屋顶加固、组件安装登高作业等安全文明施工进行监督检查。
	安全措施落实情况	认真做好巡视检查，发现问题及时整改。	认真做好巡视检查，发现问题及时整改。
	安全文明施工情况	巡视检查施工人员安全防护穿戴情况，安全帽、劳保鞋、反光马甲佩戴齐全。	继续加强现场安全管理力度
质量	主要工序质量	对绑扎的基础钢筋进行检查发现的问题，让立即整改。	对现场施工质量等要求进行管理，发现问题要求及时整改

	主要原材料质量	对主要材料进行抽检，对不符合设计要求的让其更换。	角铁等
	构（配）件质量	钢结构开孔处打磨做防腐	对槽钢开孔周边打磨刷漆进行检查
	设备质量	基本符合要求	对设备进行检查
	质量验评情况	工序施工符合要求，加强过程检查力度，加大工序报验抽查力度	加强过程检查力度，加大工序报验抽查力度

三、本月进度情况

- 1、设备基础已完工，设备已就位。
- 2、加固材料已全部到场，因 2020 年 11 月 4 日，加固车间有垃圾掉入车间，故厂区从 11 月 5 日不让施工。
- 3、水泥屋面的支墩浇筑完成。
- 4、下墙的桥架安装完成。

五、安全文明施工情况

事故（起）			编制安全 策划文件 （份）	施工 人数	安全分包情况			
人身 重伤	机械设 备	电网 事故			分包队 伍数量	分包队 伍人数	系统外包 队伍数量	系统外队 伍人数
无	无	无		14 人	/	/	/	/

六、施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度 管理	督促施工单位优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性。	优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性。
安全 管理	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，安委会要定期对现场进行安全检查；对施工人员进行安全	监督施工项目部施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件，实施安全监理，发现问题及时提出整改

	培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。 审查施工项目部<<安全文明措施>>及施工项目部施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件，实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。	要求并限期改正。
质 量 管理	督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。	原材料的进场检查；检查施工质量；单位工程重点部位施工进行旁站；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。
技 术 管理	/	/
造 价 管理	/	/
物 资 供应	/	/

常州正衡电力工程监理有限公司
滑县永达道口 2.5MW 分布式光伏项目
2020 年 11 月 25 日
