

监 理 月 报

工程名称: 苏垦麦芽 1.56MW 工商业屋顶分布式光伏发电项目

2020 年 10 月 第 2 期

监理项目部 (章):



总监理工程师: 王立杰

报告日期: 2020 年 10 月 26 日


监理月报

一、本月工程实施情况（形象进度表、照片）


1、形象进度表

序号	工作名称	开始时间	完成时间	备注
01	项目启动会	2020 年 09 月 22 日	2020 年 09 月 22 日	
02	仓库大棚檩条加固	2020 年 09 月 26 日	（中脊处未完成）	完成 97%
03	食堂屋面基础墩就位	2020 年 10 月 17 日	2020 年 10 月 18 日	
04	仓库大棚屋面围栏	2020 年 10 月 12 日	2020 年 10 月 20 日	
05	仓库大棚屋面夹具	2020 年 10 月 10 日	2020 年 10 月 18 日	
06	仓库大棚屋面导轨	2020 年 10 月 18 日	2020 年 10 月 21 日	
07	仓库大棚屋面检修通道	2020 年 10 月 20 日	/	
08	仓库大棚屋面组件	2020 年 10 月 22 日	/	
09	场内电缆沟开挖、电缆敷设	2020 年 10 月 16 日	/	
10	光伏区电缆敷设	/	/	
11	光伏区设备安装	/	/	
12	配电房设备安装	/	/	
13	调试及并网验收	/	/	

2、现场进度形象照片

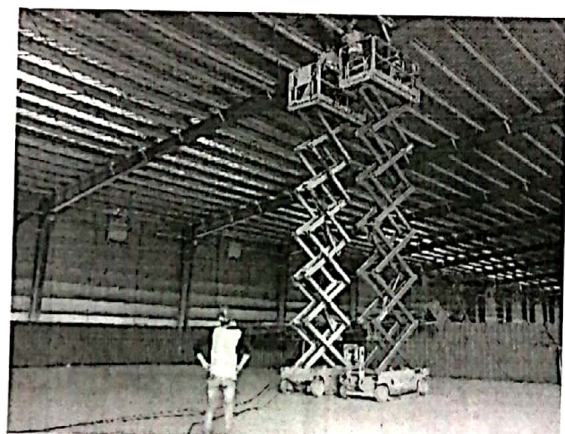

仓库大棚檩条加固

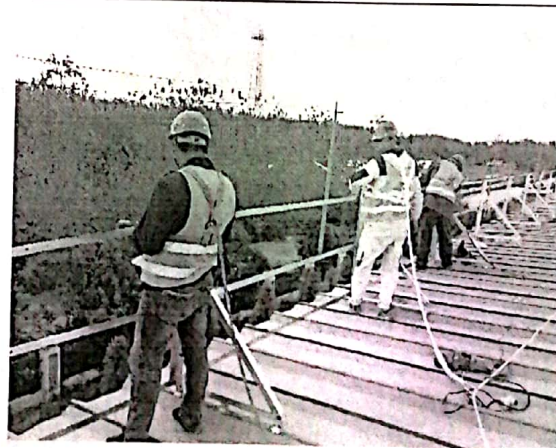

仓库大棚屋面支架安装

	
食堂屋面基础墩就位	仓库大棚屋面检修通道安装
	
仓库大棚屋面支架安装	仓库大棚屋面组件安装

二、本月监理工作情况（质量、安全、进度、投资、合同）

- 1、检查现场施工质量情况，符合要求；对原材料进场进行到货检。
- 2、审查 EPC 单位上报的施工组织设计及施工方案。
- 3、检查现场安全文明情况。

三、工程存在问题及建议

无

四、下月监理工作重点

- 1、组件安装工程施工质量及电缆敷设、设备安装等等工程施工质量。
- 2、现场安全文明施工。
- 3、并网验收相关工作。

4、资料整理及归档。

常州正衡电力工程监理有限公司

苏垦麦芽 1.56MW 工商业屋顶分布式光伏发电项目

2020 年 10 月 26 日

