

监 理 月 报

工程名称: 苏垦麦芽 1.56MW 工商业屋顶分布式光伏发电项目

2020 年 11 月 第 3 期

监理项目部 (章):



总监理工程师:

王立杰

报告日期: 2020 年 11 月 20 日

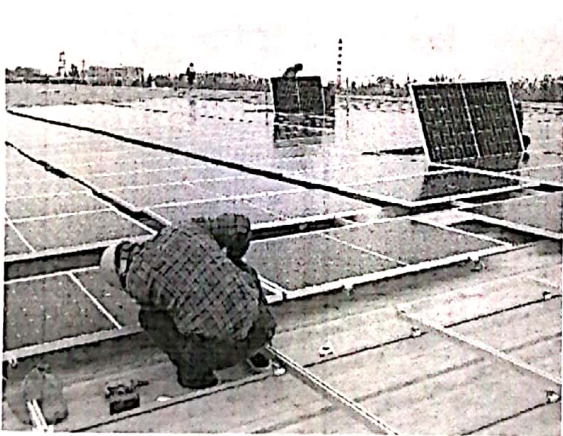
监理月报

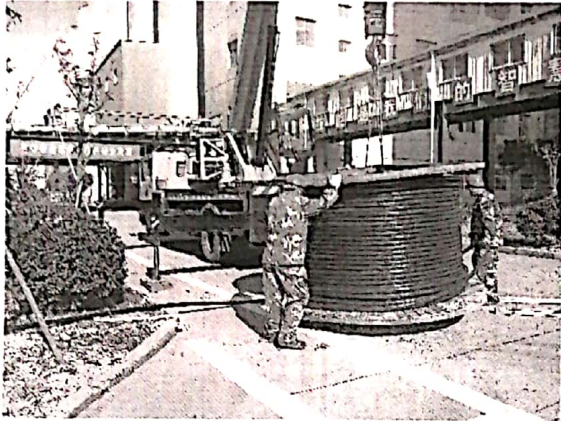
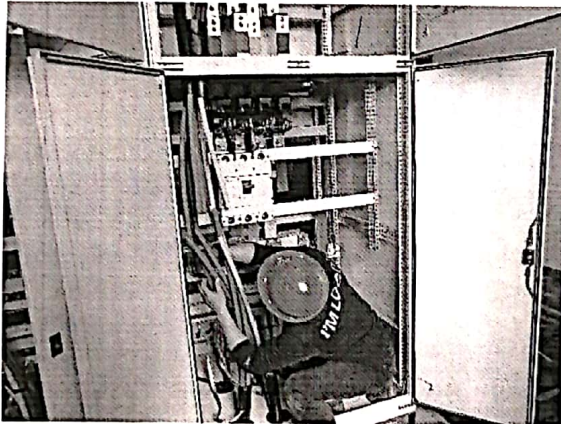
一、本月工程实施情况（形象进度表、照片）

1、形象进度表

序号	工作名称	开始时间	完成时间	备注
01	项目启动会	2020 年 09 月 22 日	2020 年 09 月 22 日	
02	仓库大棚檩条加固	2020 年 09 月 26 日	2020 年 10 月 14 日	
03	食堂屋面基础支架安装	2020 年 10 月 30 日	2020 年 11 月 01 日	
04	食堂屋面组件安装	2020 年 11 月 05 日	2020 年 11 月 05 日	
05	仓库大棚屋面支架安装	2020 年 10 月 14 日	2020 年 10 月 18 日	
06	仓库大棚屋面组件安装	2020 年 10 月 22 日	2020 年 10 月 30 日	
07	宿舍屋面基础支架安装	2020 年 11 月 08 日	2020 年 11 月 09 日	
08	宿舍屋面组件安装	2020 年 11 月 09 日	2020 年 11 月 09 日	
09	高配所屋面基础支架安装	2020 年 10 月 29 日	2020 年 11 月 01 日	
10	高配所屋面组件安装	2020 年 11 月 7 日	2020 年 11 月 07 日	
11	场内电缆沟开挖回填	2020 年 10 月 14 日	2020 年 11 月 09 日	
12	电缆敷设接线	2020 年 11 月 01 日	2020 年 11 月 11 日	
13	调试及并网验收	2020 年 11 月 17 日	2020 年 11 月 17 日	

2、现场进度形象照片

	
组件安装	支架安装

	
食堂屋面基础墩就位	安装
	
并网柜接线	并网发电

二、本月监理工作情况（质量、安全、进度、投资、合同）

- 1、检查现场施工质量情况，符合要求；对原材料进场进行到货检。
- 2、检查现场安全文明情况。

三、工程存在问题及建议

无

四、下月监理工作重点

- 1、参加建设单位竣工验收。
- 2、资料整理及归档。

常州正衡电力工程监理有限公司

苏垦麦芽 1.56MW 工商业屋顶分布式光伏发电项目

2020 年 11 月 20 日

