


世源科技（芜湖）1.2MW 屋顶分布式光伏发电项目

监理单位月报 2020 年 1 期


项目：世源科技（芜湖）1.2MW 屋顶分布式光伏发电项目		填报周期：2020 年 09 月 14 日—09 月 31 日		
一、项目总体建设进度汇总：				
1、班组建设（新进人员入场体检、安全交底培训）；				
2、做安全维护；				
3、支架到厂；				
4、做拉拔试验，支架安装；				
5、组件到场；				
二、本月工程建设工作内容及完成情况				
1、支架及组件安装	支架完成 100%； 组件完成 10%			
2、逆变器及并网柜	并网柜 0%；逆变器 0%。			
3、现场调试	完成 0%。			
4、桥架、接地	桥架 0%；接地 0%；			
5、电缆敷设接线	完成 0%			
6、出图情况	图纸齐全。			
0010、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本月到货情况，累计到货（），已到货数量（）% 延误原因及催货措施
	夹具	9 月 15 日	9 月 15 日	到货 100%
	导轨	9 月 20 日	9 月 22 日	到货 100%
	电缆桥架	10 月 8 日	月 日	到货 0%
	接地扁钢、镀锌管	10 月 10 日	月 日	到货 0%
	并网柜	10 月 15 日	月 日	到货 0%
	组件	9 月 26 日	9 月 26 日	到货 100%
	逆变器	10 月 5 日	月 日	到货 0%
	电缆设备	9 月 30 日-	月 日	到货 0%
11、人员/机械情况	本月施工人员 3-8 人，吊车 1 台，叉车 2 台。			




三、截止本月工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析:				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施(简述)
1、首套组件安装	9月30日	月 日	月 日	到货 100%,
2、全容量并网	10月25日	月 日	月 日	
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题				
未解决的协调问题 解决进展				
五、下月计划主要工作内容				
1、安装组件	安装完成 100%			
2、安装桥架	安装完成 100%			
3、检修通道安装	安装完成 100%			
4、安装逆变器	安装完成 100%			
5、敷设线缆	安装完成 100%			
6、安装并网柜	安装完成 100%			
7、全容量并网	安装完成 100%			

填报人:  审核人:  时间: 2020.01.30

工程现场照片

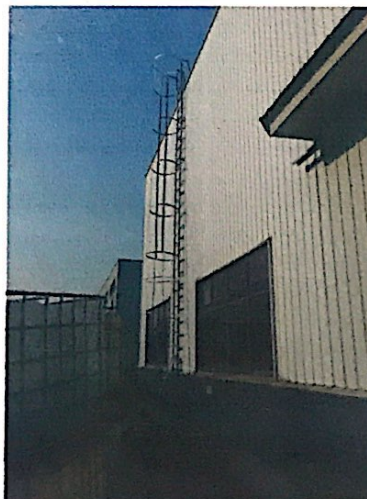

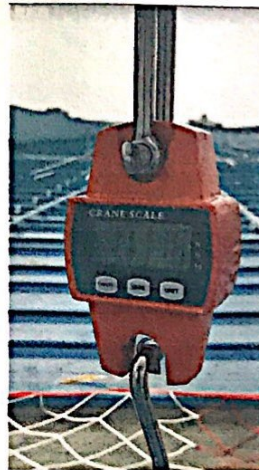

做安全措施、做拉拔试验、夹具安装、组件卸货、导轨安装;

