



正衡监理

编号: JXM15-FLD-01

监 理 月 报

工程名称: 天津希必奥弗兰德屋顶 1.377MWp 分布式光伏发电项目

2020 年 11 月

项目监理部 (章)

总监理工程师: 纪现壮

报告日期: 2020 年 11 月 25 日

编号: JXM15-FLD-01

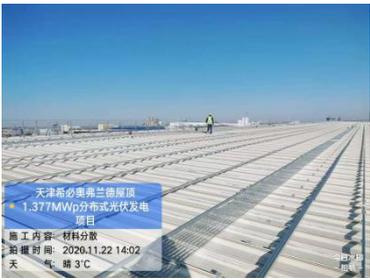
监 理 月 报

工程名称： 天津希必奥弗兰德屋顶 1.377MWp 分布式光伏发电项目 月次 第 1 次

月报开始时间 2020 年 11 月 14 日 结束日期 2020 年 11 月 25 日

监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

| 序 号 | 单位工 程标准 名称 | 施工项目名称 | 资料 类型 | 资料 数量 | 备 注 |
|--------|--|--|----------|----------|--------------------------------------|
| 1 | 天津希 必奥弗 兰德屋 顶 1.377M Wp 分布 式光伏 发电项 目 |       | 照片 | 8 | 进 度 、 质 量 、 安 全 |



二、监理重点工作情况

| 专业 | 事项 | 本月重点工作情况 | 下月重点工作计划 |
|----|----------|---|---------------------------|
| | 设备交付进度 | 现场光伏支架、安全围栏检修通道已安装完成。 | 组件安装、桥架安装、电缆敷设，逆变器就位。 |
| | 质量体系运作情况 | 质量体系健全，运行良好落实质量保证体系，并对运行情况进行检查 | 继续加强检查，发现问题即时督促整改。 |
| | 施工图会审 | 无 | 无 |
| | 方案审查 | 开工报审资料还未报审 | 催促施工单位资料及方案报审 |
| | 技术交底 | 已交底 | / |
| | 设计变更 | 无 | / |
| 安全 | 安全培训情况 | 新进场员工已进行安全培训 | / |
| | 安全交底情况 | 对现场临时用电、工器具等安全文明施工进行监督检查。 | 对组件安装登高作业等安全文明施工进行监督检查。 |
| | 安全措施落实情况 | 认真做好巡视检查，发现问题及时整改。 | 认真做好巡视检查，发现问题及时要求整改。 |
| | 安全文明施工情况 | 巡视检查施工人员安全防护穿戴情况，安全帽、劳保鞋、反光马甲佩戴齐全。无裸露裤腿、手臂现象。 | 继续加强现场安全管理力度 |
| 质量 | 主要工序质量 | 检查已安装的支架夹具 | 对现场施工质量等要求进行管理，发现问题要求及时整改 |
| | 主要原材料质 | 检查支架、检修通道质量 | 检查到场组件、桥架、电缆质量 |

| | | |
|---------|------------------------------|---------------------------|
| 量 | | |
| 构（配）件质量 | 发现 1 个中压块型号规格不符 | 检查组件安装所使用的压块，确保型号规格符合设计要求 |
| 设备质量 | 基本符合要求 | 对设备进行检查 |
| 质量验评情况 | 工序施工符合要求，加强过程检查力度，加大工序报验抽查力度 | 加强过程检查力度，加大工序报验抽查力度 |

三、本月进度情况

- 1、屋面安全围栏全部安装完成。
- 2、光伏支架安装完成 100%。
- 3、检修通道已连接但还未固定。

四、下月进度计划

- 1、组件到场吊装、组件安装。
- 2、电缆桥架安装、电缆敷设。

五、安全文明施工情况

| 事故（起） | | | 编制安全 策划文件 （份） | 施工 人数 | 安全分包情况 | | | |
|----------|----------|----------|---------------------|----------|------------|------------|--------------|-------------|
| 人身 重伤 | 机械设 备 | 电网 事故 | | | 分包队 伍数量 | 分包队 伍人数 | 系统外包 队伍数量 | 系统外队 伍人数 |
| 无 | 无 | 无 | | 12 人 | / | / | / | / |

六、施工重点工作情况

| 专业 | 本月重点工作情况 | 下月重点工作计划 |
|------|----------------------------------|----------------------------|
| 进度管理 | 督促施工单位优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性。 | 优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性。 |
| 安全 | 督促施工单位报审《安全文明施工 | 监督施工项目部施工安全管理人员、特 |

| | | |
|------|--|--|
| 管理 | 管理制度》，安委会要定期对现场进行安全检查；对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。审查施工项目部《安全文明措施》及施工项目部施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件，实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。 | 特殊工种、特殊作业人员资格证明文件，实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。 |
| 质量管理 | 督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。 | 原材料的进场检查；检查施工质量；单位工程重点部位施工进行旁站；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。 |
| 技术管理 | / | / |
| 造价管理 | / | / |
| 物资供应 | / | / |

常州正衡电力工程监理有限公司

天津希必奥弗兰德屋顶 1.377MWp 分布式光伏发电项目

2020 年 11 月 25 日
