

正衡监理

编号: ZHJL-YB-02

监 理 月 报

工程名称: 中国电建上海能源装备有限公司 2.7MW 屋顶分布式光伏发电项目

2020 年 12 月第 2 期



报告日期: 2020 年 12 月 31 日



扫描全能王 创建

监 理 月 报

工程名称: 中国电建上海能源装备有限公司 2.7MW 屋顶分布式光伏发电项目月报 第 2 次月报

开始时间 2020 年 11 月 18 日

监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工单位名称	资料类型	资料数量	备注
1	中国电建上海能源装备有限公司 2.7MW 屋顶分布式光伏发电项目	四川尚胜邦建筑工程有限公司	影像	6 张	

二、监理重点工作情况


专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度		阀门屋面及焊条屋面、水泵屋面加瓦完毕, 热加工二车间檩条安装完毕, 阀门屋面组件、逆变器安装完毕、焊条屋面组件安装完成 0.16MW, 试验车间夹具支架安装完毕, 水泵屋面安装夹具, 6 台并网柜基础开槽完毕及电表与通信终端接线完毕	水泵屋面屋面封边及组件安装完毕, 热加工二车间换瓦及组件安装完毕, 焊条车间组件安装完毕, 热加工一车间组件安装完毕



扫描全能王 创建



焊条屋面导轨安装


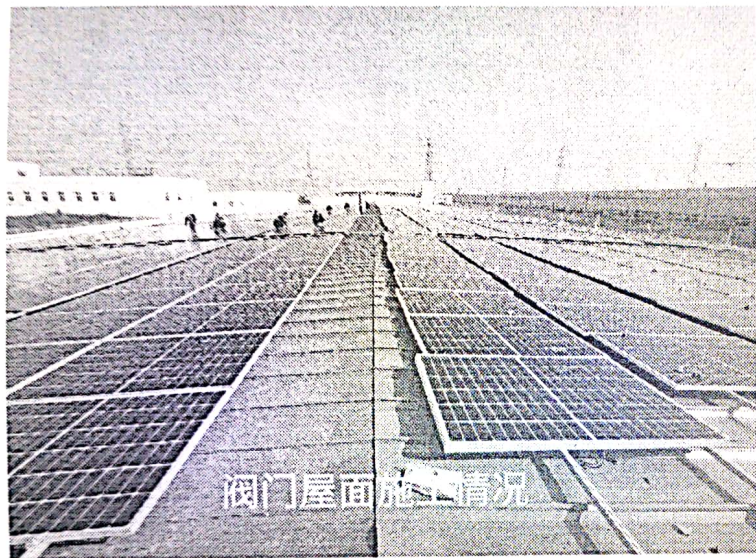



阀门屋面施工情况



焊条屋面彩钢瓦封边



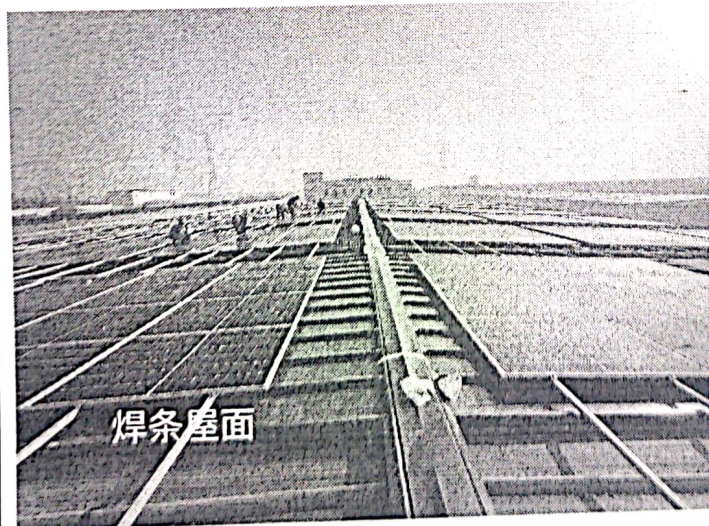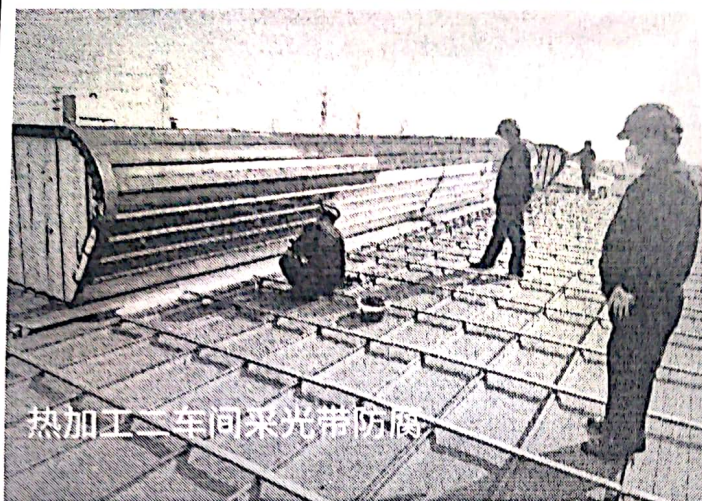

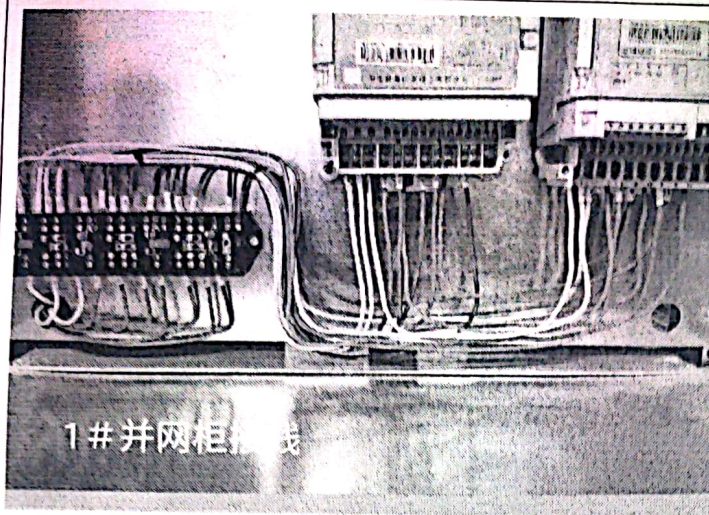

	设备交付进度	组件进场 0.5MW	
	设计交付进度	纸质版	
	质量体系运作情况	质量体系较健全，运行良好	
	施工图会审	已完成	
	设计交底	已完成	
	方案审查	待完成	
	技术交底	完成	
	设计变更		
安全	安全培训情况	进场人员已进行安全培训	
	安全交底情况	督促施工单位对危险作业点进行班前交底、审核	
	安全措施落实情况	落实到位	
	安全文明施工情况	现场安全、文明措施良好	
质量	主要工序质量	良好	
	主要原材料质量	支架型号质量按技术参数，抽检合格	
	构（配）件质量	合格	
	设备质量	合格	
	质量验评情况	工序施工符合要求	
投资	资金情况	/	/
	款项支付情况	/	/



	预算外签证	无	/
合同	合同签订情况	施工合同签订	/
	合同执行情况	按合同执行	严格按合同执行现场工作

三、本月进度情况

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	本月实际完成 (完成量/总量)	累计完成 (完成量/总量)	备注
四川尚胜邦建筑工程有限公司								
1	支架安装			2020.12.17		0.5MW		
2	组件安装		2021.1.15	2020.12.20		0.5MW		
4	防雷接地							
4	直流电缆 4mm2			2020.12.29		0.39MW		
8	逆变器安装			2020.12.28				
9	汇流箱安装							

四、下月进度计划

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	下月计划完成 (完成量/总量)	本月实际完成 (完成量/总量)	权值
四川尚胜邦建筑工程有限公司								
1	组件安装							
2	电缆敷设							
3	箱逆变就位							
4	防雷接地							

五、安全文明施工情况

事故(起)			编制安全策划文件(份)	施工人数	安全分包情况			
人身重伤	机械设 备	电网事故			分包队伍数量	分包队伍人数	系统外队伍数量	系统外队伍人数
无	无	无		23人	2	/	/	/



六、施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	督促施工单位优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性	加快屋面加固及加瓦施工进度，剩余组件、逆变器、支架等夹具尽快进场，人员协调好进场施工，阀门车间及焊条车间 0.5MW 尽快敷设交流电缆并网发电，其余并网点也需尽快施工并网
安全管理	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，安委会要定期对现场进行安全检查；对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。	
质量管理	组件到场进行开箱检查；单位工程重点部位施工进行旁站；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。	
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。	
造价管理		
物资供应	协助建设单位做好建设物资进场工作，督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。	

常州正衡电力工程监理有限公司

中国电建上海能源装备有限公司 2.7MW 屋顶分布式光伏发电项目
监理部

2020 年 12 月 31 日

