



正衡监理

监 理 月 报

工程名称：泗阳沃达行新能源有限公司 6MW 光伏发电场址变更工程项目

第 01 期

(2020 年 12 月 1 日---2020 年 12 月 31 日)

提交部门：监理项目部

编 制：王明官

签 发：徐耀生

报告日期：2020.12.31



监 理 月 报

工程名称：泗阳沃达行新能源有限公司 6MW 光伏发电场址变更工程项目

月次 第 1 次

月报开始时间 2020 年 12 月 1 日 结束日期 2020 年 12 月 31 日

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司


一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	<u>泗阳沃达行新能源有限公司 6MW 光伏发电场址变更工程项目</u>		影像	8 张	

一、 监理重点工作情况

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
----	----	----------	----------


进度

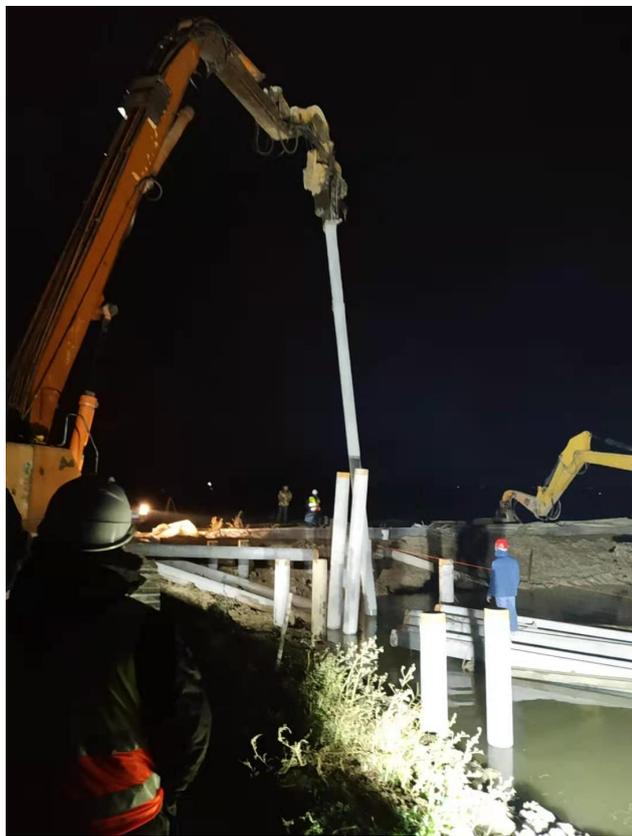

检查新进人员
并要求做好三
级安全教育；

现场支架基础
管桩已完成 90%
左右；预制舱基
础完成并吊装
就位；6 个箱逆
变基础完成并
吊装就位 2 台；
支架安装完成
40%左右；组件
安装完成 30%；
已有 5 个汇流箱
基本并网发电。

剩余 4 个箱逆变
吊装就位，支
架、组件、桥架、
电缆、电气设
备、接地基本完
成并全容量并
网发电。

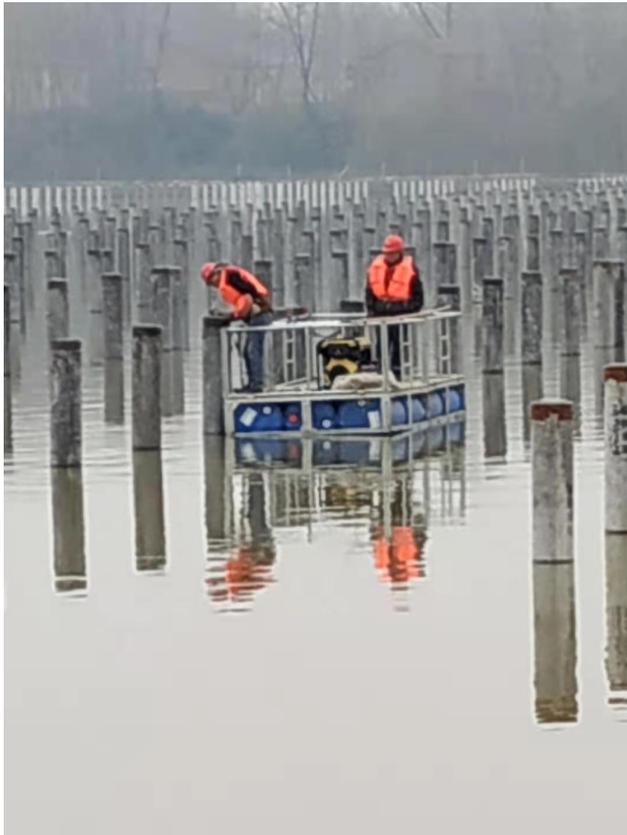





	设备交付进度	桥架已进场；电 缆已进场；旧组 件已部份进场；	
	设计交付进度	图纸到场并会 审	已完成
	质量体系运作情况	质量体系健全， 运行良好	落实质量保证 体系，并对运行 情况进行检查
	施工图会审	已完成	
	设计交底	已完成	
	方案审查	已交付	督促施工单位 按方案执行
	技术交底	完成	
	设计变更	无	
安全	安全培训情况	新进场员工已 进行安全培训	督促施工单位 对进场新员工 进行安全教育
	安全交底情况	督促施工单位 对危险作业点 进行班前交底	继续督促施工 单位进行班前 交底
	安全措施落实情况	落实不彻底，已 要求施工单位 认真落实	监督施工单位 认真落实安全 措施
	安全文明施工情况	现场安全、文明 措施良好	加强现场安全 管理力度
质量	主要工序质量	支架安装，电缆 桥架安装；	按规范焊接、安 装并做好防腐 工作。
	主要原材料质量	组件外观检查	对主要材料进

		合格，到货检合格；	行检查
	构（配）件质量	进场材料质量合格	把控好进场材料质量关
	设备质量		进行进场报验、开箱检查
	质量验评情况	工序施工基本符合要求	加强过程检查力度，加大工序报验抽查力度
投资	资金情况	/	/
	款项支付情况	/	/
	预算外签证	无	/
合同	合同签订情况	施工合同签订	/
	合同执行情况	按合同执行	做好合同执行工作

二、 本月进度情况

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	本月实际完成（完成量 / 总量）	累计完成（完成量 / 总量）	备注
1	定位放线	2020.11.21	2020.12.15	2020.11.24		80%	90%	
2	支架基础安装	2020.11.22	2020.12.16	2020.11.22		80%	90%	
3	支架安装	2020.11.28	2020.12.20	2020.11.30		38%	40%	
4	组件安装	2020.12.02	2020.12.30	2020.12.05		30%	30%	
5	电缆桥架	2020.12.10	2020.12.30	2020.12.16		10%	10%	
6	预制舱基	2020.11.26	2020.11.28	2020.11.29	2020.12.01	已完成	已完成	

	础							
7	箱逆变基础	2020.11.28	2020.12.08	2020.12.08	2020.12.26	已完成	已完成	
8	汇流箱安装	2020.12.05	2020.12.20	2020.12.16		7.5%	7.5%	
9	电缆敷设	2020.12.12	2020.12.30	2020.12.16		10%	10%	
10	安装接地	2020.12.10	2020.12.30	2020.12.16		6%	6%	

三、 下月进度计划

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	下月计划完成量	备注
1	定位放线	2021.01.01	2021.01.03	全部完成	
2	支架安装	2021.01.01	2021.01.10	支架安装全部完成	
3	组件安装	2021.01.01	2021.01.15	组件安装完成	
4	电缆桥架	2021.01.01	2021.01.15	预计桥架安装完成	
5	直流电缆 4mm	2021.01.01	2021.01.18	电缆敷设完成	
6	直流电缆 2*70mm	2021.01.02	2021.01.18	电缆敷设完成	
7	接地安装	2021.01.03	2020.01.18	全部完成	

四、 安全文明施工情况

事故（起）			编制安全策 划文件(份)	施工 人数	安全分包情况			
人身重 伤	机械设 备	电网事 故			分包队 伍数量	分包队 伍人数	系统外 包队伍 数量	系统外 队伍人 数
无	无	无		95 人	/	/	/	/

五、 施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	督促施工单位优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性	配合建设单位做好并网后的工作。要求施工单位合理安排施工进度计划，及时调整人力、物力

	度》，安委会要定期对现场进行安全检查；对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。	施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件，实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。
质量管理	组件到场进行开箱检查；单位工程重点部位施工进行旁站；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。	督促施工单位按照施工工艺和设计要求及山西电力的规范要求进行施工
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。	参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，监督检查执行情况。
造价管理	对施工单位申请的工程款及时进行评审	对工程量实施计量，及时审核施工项目部报送的工程量清单、进度款支付申请
物资供应	协助建设单位做好建设物资进场工作，督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。	督促施工单位按照复工日期的要求，安排人员、机具进行施工。

常州正衡电力工程监理有限公司

泗阳沃达行新能源有限公司 6MW 光伏发电场址变更工程项目监理

部

2020 年 12 月 31 日
