

监 理 月 报

工程名称：增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程

2022 年 08 月

项目监理部（章）：



总监理工程师：王立杰

报告日期：2022 年 08 月 30 日



扫描全能王 创建

监 理 月 报


工程名称：增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程

月次 第 8 次



月报开始时间 2022 年 6 月 30 日 结束日期 2022 年 8 月 30 日

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司





一、工程影像资料


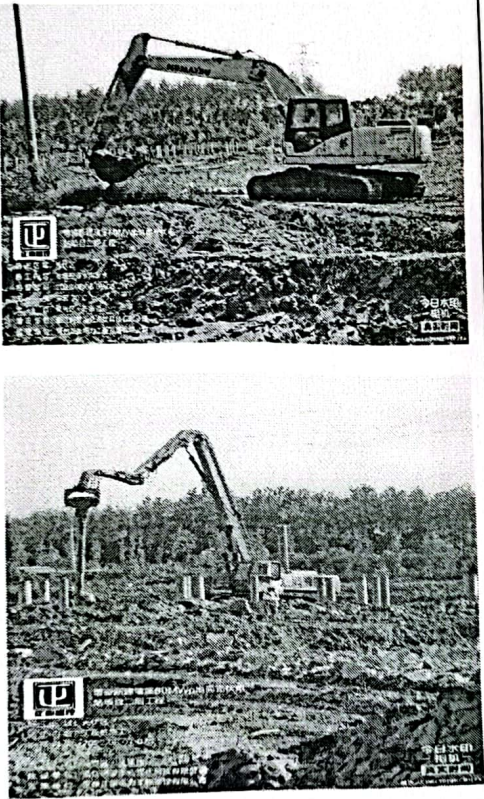
序号	单位工程标准名称	施工项目影像 	资料类型	资料数量	备注
----	----------	---	------	------	----

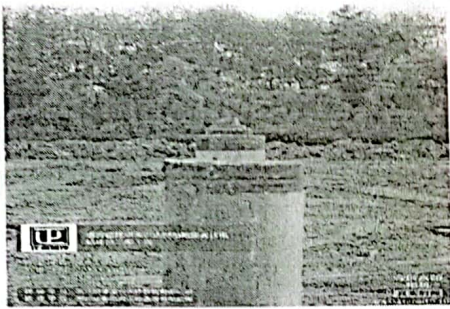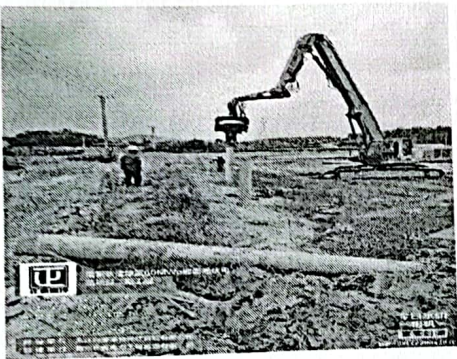


1	增资新建埭溪60MWp地面光伏电站项目二期工程。	   	照片	17	/
---	---------------------------------	--	----	----	---



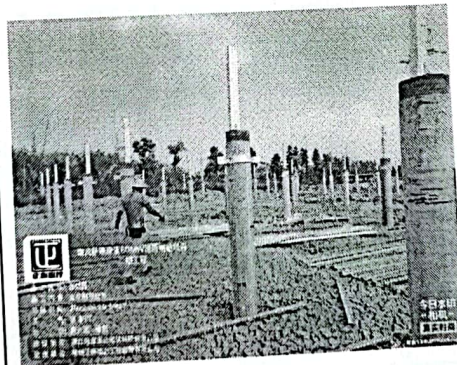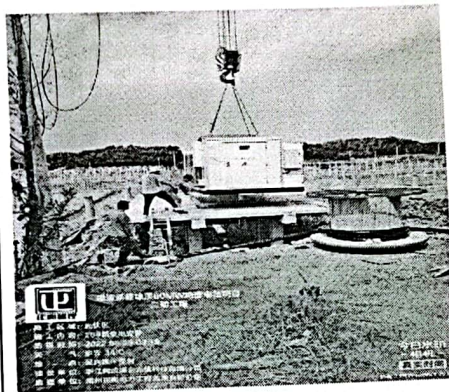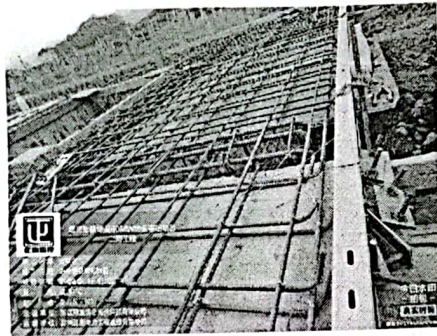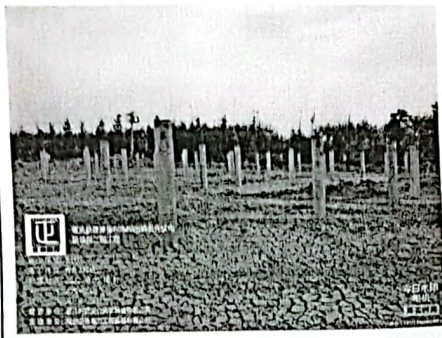

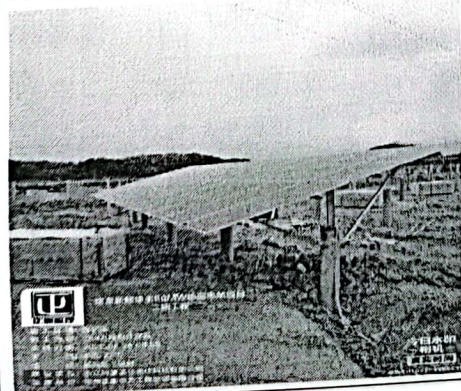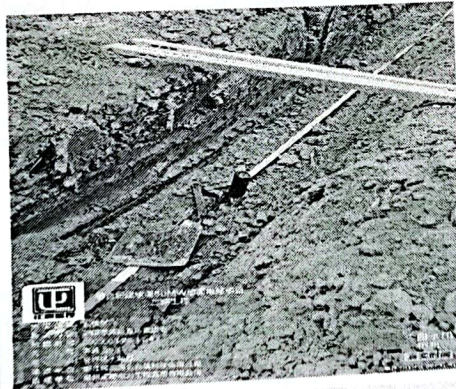

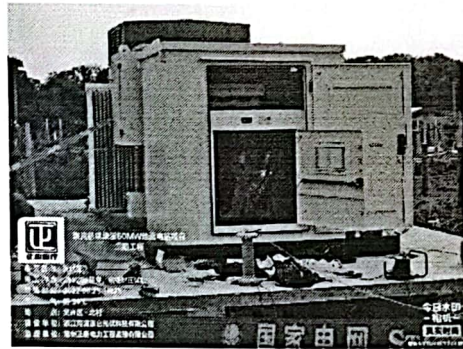		 			
--	--	---	--	--	--

二、监理重点工作情况

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度	25#、26#方阵发电单元工程桩施工完成 90%，箱变基础浇筑混凝土 100%，25#26#箱变安装 100%，支架组件安装 20%，箱变低压侧调试 100%，高压电缆敷设、电缆沟回填 100%，电缆头制作耐压试验 100%，25#方阵环网接地 30%，箱变防雷接地 100%。	工程桩施工完成，箱变基础浇筑混凝土，工程桩施工完成，箱变基础浇筑混凝土 25#26#箱变安装，	9.10 日 0.8MW 倒送电并网。
	工程进度情况。	25#、26#方阵发电单元工程桩施工完成 90%，箱变基础浇筑混凝土 100%，25#26#箱变安装 100%，支架组件安装 20%，箱变低压侧调试 100%，高压	9.09 日前电装完成。



		电缆敷设、电缆沟回填 100%， 电缆头制作耐压试验 100%， 25#方阵环网接地 30%，箱变 防雷接地 100%。	
	设计图纸进度。	电子版。	
	质量体系运作情况	质量体系健全，运行良好	落实质量保证体系，并对运 行情况进行检查
	施工图会审	未完成图纸会审	
	设计交底	未进行	陆续完成工序图纸会审交底
	方案审查	未齐全	督促施工单位报审
	技术交底	在进行	新人员进场后，督促施工方 落实
	设计变更	/	
安全	安全培训情况	施工人员未进场。	督促新进员工安全培训
	安全交底情况	督促施工单位对危险作业点 进行班前交底	已要求开工后要完善班前交 底
	安全措施落实情况	已要求施工单位认真落实。	督促完善安全措施
	安全文明施工情况	现场安全、文明措施不到位	增加安全文明标语标牌、各 场区围栏未设置警示标志。
质量	主要工序质量	核对图纸，检查桩位核对	陆续完成
	主要原材料质量	支架、立柱、管桩等料构配件 质量证明文件齐全。	陆续进场
	构（配）件质量	/	/
	设备质量	/	/
	质量验评情况	工序施工符合要求。	加强检查力度、抽查力度



投资	资金情况	/	/
	款项支付情况	/	/
	预算外签证	无	/
合同	合同签订情况	施工合同签订	/
	合同执行情况	按合同执行	做好合同执行工作

三、本月进度情况

- 1、25#、26#方阵发电单元工程桩施工完成 90%，
- 2、箱变基础浇筑混凝土 100%，25#26#箱变安装 100%，
- 3、支架组件安装 20%，
- 4、箱变低压侧调试 100%，
- 5、高压电缆敷设、电缆沟回填 100%，
- 6、电缆头制作耐压试验 100%，
- 7、25#方阵环网接地 30%，
- 8、箱变防雷接接地 100%。

四、下月进度计划

- 1、9.09 日前电装完成。
- 2、9.10 日 0.8MW 倒送电并网。

五、安全文明施工情况

事故（起）			编制安全策 划文件(份)	施工 人数	安全分包情况			
人身重 伤	机械设 备	电网事 故			分包队 伍数量	分包队 伍人数	系统外 包队伍 数量	系统外 队伍人 数
无	无	无	无	人	/	/	/	/



六、施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	地块协调征收，抽水清塘完成。	优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性
安全管理	积极参与“安全生产月”活动和项目现场安全消防演练，安委会定期对现场进行安全检查；对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。	实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。
质量管理	设备到场进行开箱检查；单位工程重点部位施工进行旁站；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。	督促施工单位按照施工工艺和设计要求的规范要求进行施工
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。	参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，监督检查执行情况。
造价管理	对施工单位申请的工程进度款进行审核	对施工单位申请的工程款及时进行认真评审
物资供应	协助建设单位做好建设物资进场工作，督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。	督促施工单位按照要求，合理安排人员对施工区域供应施工材料

常州正衡电力工程监理有限公司

增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程

2022 年 08 月 30 日



扫描全能王 创建
