

监 理 月 报

工程名称：申宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

2021 年 01 月

项目监理部（章）：



报告日期：2021 年 01 月 26 日


监 理 月 报


工程名称: 申宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

月报开始时间 2020 年 12 月 25 日 结束日期 2021 年 01 月 26 日

监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

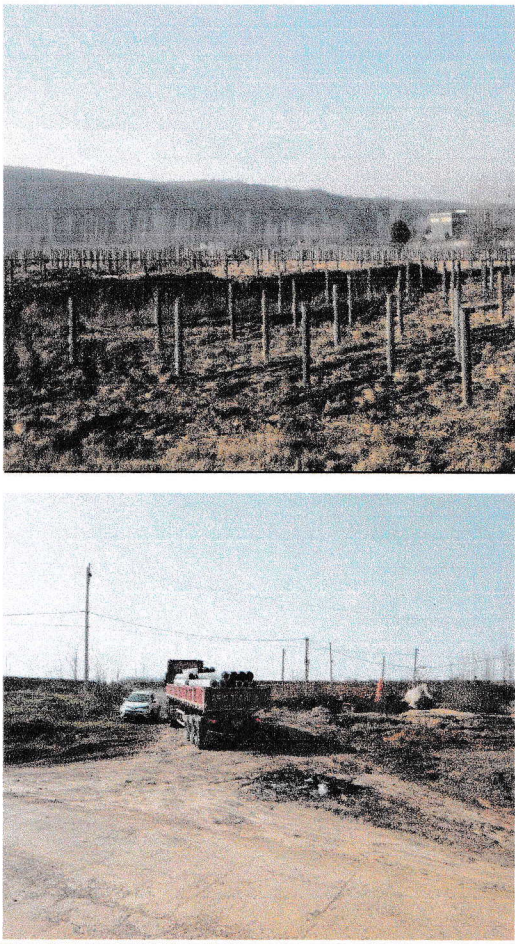序号	单位工程标准名称	施工项目影像	资料类型	资料数量	备注
1	申宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目		照片	6	



一、 监理重点工作情况

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度	检查管桩打桩、焊接立柱、支架安装、组件安装等施工质量	管桩打桩标高垂直度、安全质量施工进行检查、监理例会 3 次、平行检查记录 7 份、检查记录表 2 份、通知单 1 份、联系单 2 份、工程暂停令 1 份。	持续对管桩打桩标高垂直度、安全质量施工进行检查、监理例会、平行记录表、检查记录表。
	材料/设备交付进度	管桩已到 11675 根	/
	设计交付进度	图纸未齐全	图纸未完成
	质量体系运作情况	质量体系健全，运行良好落实质量保证体系，并对运行情况进行检查	继续加强检查，发现问题即时督促整改。
	施工图会审	未完成图纸会审	
	设计交底	设计未交底	督促进行设计交底
	方案审查	未交付	督促施工单位报审其他资料
	技术交底	未进行	
	设计变更	无	
安全	安全培训情况	新进场施工人员未进行安全培训	督促施工方对施工人员进行安全培训
	安全交底情况	对即将开始施工的桩基础、立柱焊接、临时用电、工器具使用等安全文明施工注意事项进行监督。	持续监督检查
	安全措施落实情况	施工工器具暂未进场不涉及安全问题。	认真做好巡视检查，发现问题及时整改。
	安全文明施工情况	巡视检查施工人员安全防护穿戴情况，安全帽、劳保鞋、反光马甲佩戴齐全。无裸露裤腿、手臂现象。	继续加强现场安全管理力度
质量	主要工序质量	核对图纸，检查立柱焊接、支架、组件前验收 核对图纸，检查立柱焊接、支架、组件前验收	检查管桩标高垂直度、立柱焊接、桩头防腐、支架、组件、光伏电

			缆等施工质量
	主要原材料质量	支架、组件、立柱、管桩等	/
	构（配）件质量	/	/
	设备质量	/	/
	质量验评情况	工序施工符合要求，加强过程检查力度，加大工序报验抽查力度	加强过程检查力度，加大工序报验抽查力度
投资	资金情况	/	/
	款项支付情况	/	/
	预算外签证	无	/
合同	合同签订情况	施工合同签订	/
	合同执行情况	按合同执行	做好合同执行工作

二、 本月进度情况

- 1、管桩打桩工程量：24452 根，已完成打桩 6900 根，约 28.21%。
- 2、预制管桩进场 11675 根（共 24452 根）。

三、 下月进度计划

春节过后继续桩基础打桩，计划对防雷接地沟开挖，箱变基础施工。

安全文明施工情况

事故（起）			编制安全策 划文件（份）	施工 人数	安全分包情况		
人身重 伤	机械设 备	电网事 故			分包队伍数 量	分包队伍人数	系统外包队伍数量
无	无	无		10 人	1	/	/

四、 施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	督促施工单位优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性	优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性
安全管理	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，安委会要定期对现场进行安全检查；对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。审查施工项目部<<安全文明措施>>及施工项目部施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件，实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。	监督施工项目部施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件，实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。
质量管理	督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。	立柱、支架、管桩、组件等原材料的进场检查；检查土建基础、组件接地、光伏电缆、塔基等施工质量；单位工程重点部位施工进行旁站；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。
技术管理	/	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。
造价管理	/	对施工单位申请的工程款及时进行评审
物资供应	/	协助建设单位做好建设物资进场工作，督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。

常州正衡电力工程监理有限公司

申宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

2021 年 01 月 26 日
