

监 理 月 报

工程名称：申宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

2021 年 06 月

项目监理部（章）

总监理工程师



报告日期：2021 年 06 月 30 日



扫描全能王 创建


监 理 月 报

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

月报开始时间 2021 年 04 月 01 日 结束日期 2021 年 06 月 30 日


监理单位: 宣城正衡电力工程监理有限公司


一、工程影像资料

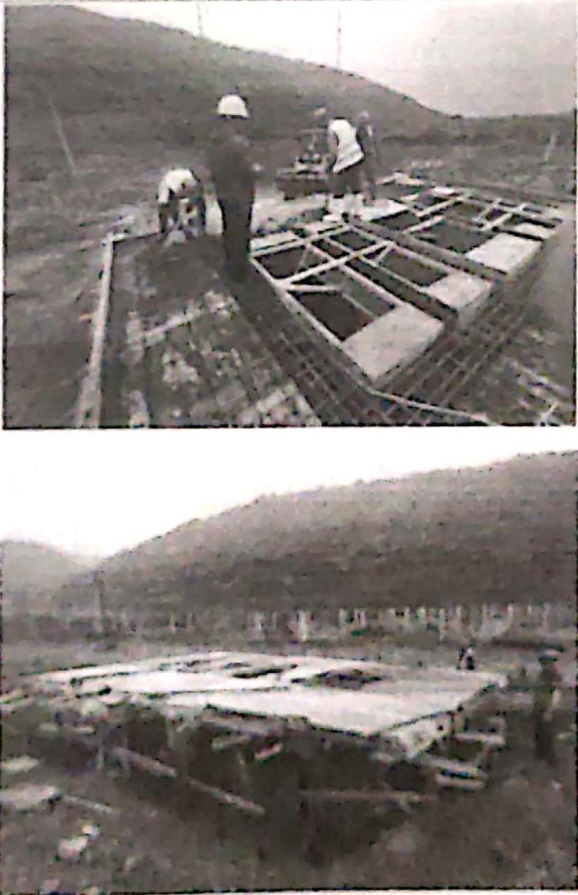序号	单位工程标准名称	施工项目影像	资料类型	资料数量	备注
1	中宣宣城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目		照片	10	



扫描全能王 创建

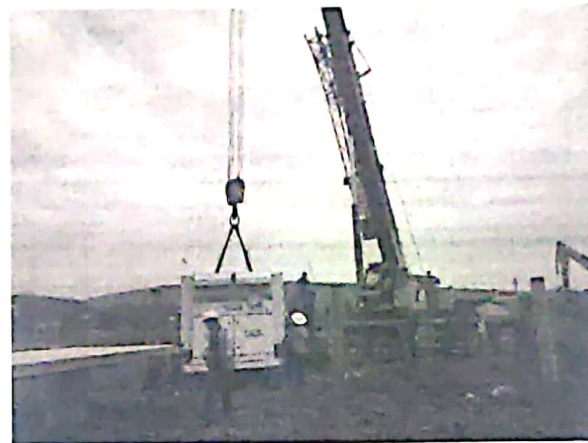

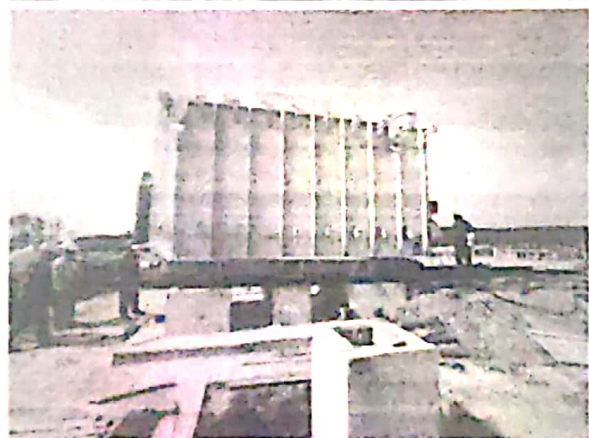

		 		
--	--	---	--	--

一、 监理重点工作情况

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度	检查升压站电气楼开挖及基础浇筑、接地沟开挖、接地焊接、GIS及接地变、SVG及其附属基础浇筑、电	管桩打桩除锈防腐、安全质量施工进行检查、箱逆变事故油池施工检查及6台箱逆变就位、升压站主变就位、升压站电气楼基础开挖施工检查及基础垫层及底板浇筑旁站。	升压站检查及升压站电气楼施工检查。光伏区除锈防腐及接地扁铁粉刷。



	材料/设备交付进度	管桩到货 17240 根，完成量 70.05%	/
	设计交付进度	图纸基本完成	全部完成
	质量体系运作情况	质量体系健全，运行良好落实质量保证体系，并对运行情况进行检查	继续加强检查，发现问题及时督促整改。
	施工图会审	已完成图纸会审	
	设计交底	设计已交底	
	方案审查	已基本报审完成	督促施工单位报审其他资料
	技术交底	已进行技术交底	
	设计变更	暂无	
安全	安全培训情况	新进场施工人员未进行安全培训	督促施工方对施工人员进行安全培训
	安全交底情况	对即将开始施工的桩基础、立柱焊接、临时用电、工器具使用等安全文明施工注意事项进行监督。	持续监督检查
	安全措施落实情况	施工工器具暂未进场不涉及安全问题。	认真做好巡视检查，发现问题及时整改。
	安全文明施工情况	巡视检查施工人员安全防护穿戴情况，安全帽、劳保鞋、反光马甲佩戴齐全。无裸露裤腿、手臂光膀子现象。	继续加强现场安全管理力度
质量	主要工序质量	核对图纸，对光伏区打桩、环网接地施工进行验收检查、对输出线路施工进行安全/质量检查	对各施工项进行检查、验收
	主要原材料质量	管桩、接地扁铁、线路导线、砂石、水泥、钢筋等	对进场管桩、接地扁铁、升压站原材料按设计要求进行抽检。
	构（配）件质量	/	/
	设备质量	/	/
	质量验评情况	工序施工符合要求，加强过程检查力度，加大工序报验抽查力度	加强过程检查力度，加大工序报验抽查力度



投资	资金情况	/	/
	款项支付情况	/	/
	预算外签证	无	/
合同	合同签订情况	施工合同签订	/
	合同执行情况	按合同执行	做好合同执行工作

二、 本月进度情况

光伏区打桩累计完成 16905 根，总工程量为 24452 根，完成总工程量 69.13%。管桩累计到货 17358 根，总工程量为 24452 根，完成总工程量 70.98%。本月打桩 0 根，到货 0 根。接地环网共 28 个区，累计完成 15 个区，完成总工程量 53.57%。箱逆变基础总 28 个，本月完成 2 个累计完成 12 个。

升压站电气楼开挖完成，底板钢筋绑扎、支模完成。SVG、主变、接地变基础浇筑完成，主变基础垫层浇筑完成主变就位。

三、 下月进度计划

光伏区桩基础打桩，箱逆变基础施工，升压站施工设备基础、电气楼等施工。

安全文明施工情况

事故（起）			编制安全策 划文件（份）	施工 人数	安全分包情况		
人身 重伤	机械设 备	电网事 故			分包队伍数 量	分包队伍人数	系统外包队伍数量
无	无	无		33 人	1	/	/

四、施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	督促施工单位优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性	优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性
安全管理	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，安委会要定期对现场进行安全检查；对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安	监督施工项目部施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件，实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。



	全文明施工措施，审查施工项目部<<安全文明措施>>及施工项目部施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件，实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。	
质量管理	督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。	管桩等原材料的进场检查；检查土建基础、组件接地、光伏电缆、塔基等施工质量；单位工程重点部位施工进行旁站；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。
技术管理	/	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。
造价管理	/	对施工单位申请的工程款及时进行评审
物资供应	/	协助建设单位做好建设物资进场工作，督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。

常州正衡电力工程监理有限公司
申宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目
2021 年 06 月 30 日

