



正衡监理

编号: NMFD-YB-016

监 理 月 报

工程名称: 宁明桐棉风电场工程

2022 年 6 月

项目监理部 (章):

总监理工程师: 徐耀生

日期: 2022 年 6 月



监 理 月 报

一、 监理重点工作情况

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度	主要工序工作	1、大号线道路整修。 2、14#、19#风机基础浇筑完成。 3、集电线路C线施工完成。 4、集电线路B线基础完成完成3个。 5、17#风机吊装完成；18#风机第一节吊装完成	1、大号线25#、B5平台场坪及基础施工。 2、集电线路施工完成。 3、14#、15#、18#、19#风机基础吊装完成。
	设备交付进度	进场7套风机	吊装完成6台风机
	设计交付进度	外线图纸、道路图纸、风机基础图纸已交付。升压站无设备基础图	
	质量体系运作情况	质量体系健全，运行良好	落实质量保证体系，并对运行情况进行检查
	施工图会审	风机基础图纸会审完成	
	设计交底	风机基础设计交底完成	
	方案审查	外线资料报审	按进度提交施工方案
	技术交底	外线、道路、风机基础技术交底完成	
	设计变更		
安全	安全培训情况	进场员工已进行安全培训	督促施工单位对进场新员工进行安全教育
	安全交底情况	督促施工单位对危险作业点进行班前交底	继续督促施工单位进行班前交底
	安全措施落实情况	场地警戒线及用电要求施工方落实到位	设置安全警示
	安全文明施工情况	现场安全、文明措施良好	加强现场安全管理力度
质量	主要工序质量	现阶段，要求质量严格按照业主要求监管。	强制性质量问题绝不放过
	主要原材料	主要材料进行质量检查	把控好材料进场质量问题

质量		
构（配）件质量	把控好进场材料质量关	严抓构配件质量问题
设备质量	目前未进场	
质量验评情况	将不符合设计要求的地方，要求施工方进行整改	

二、本月进度情况

- 1、大号线道路整修。
- 2、14#、19#风机基础浇筑完成。
- 3、集电线路 C 线施工完成，B 线施工完成。
- 4、17#风机吊装完成，18#风机第段吊装完成。

三、下月进度计划

道路：

- 1、25#、B5 风机平台施工及基础完成

集电线路：

- 1、B 线施工完成。

风机基础：

- 1、大号线 20#、25#、B5 风机基础浇筑完成。

升压站：

- 1、进站道路施工完成。

四、安全文明施工情况

事故（起）			编制安全策	施工	施工
人身重	机械设	电网事	划文件（份）	人数	单位
伤	备	故			数量
无	吊车 1 台；挖机	无		134	1

	14 台、 装载机 2 台， 推土机 2 台、罐车 17 台， 泵 车 2 台			人	
--	---	--	--	---	--

五、施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	1、参加业主组织的进度协调会	1、督促道路施工进度 2、督促设计图纸出图进度 3、督促升压站进度 4、督促设备进场进度，风机吊装进度
安全管理	施工人员安全帽佩戴	1、设置安全标识、警示牌。 2、施工人员佩戴安全帽
质量管理	发现有质量问题并要求施工方更改。	1、集电线路塔基础施工、放线质量、。 2、升压站土建、电气施工质量。
技术管理		参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，监督检查执行情况。
造价管理		对工程量实施计量，及时审核施工项目部报送的工程量清单
物资供应		督促施工单位进行




道路整修



集电线路线塔基础浇筑



19#风机基础浇筑

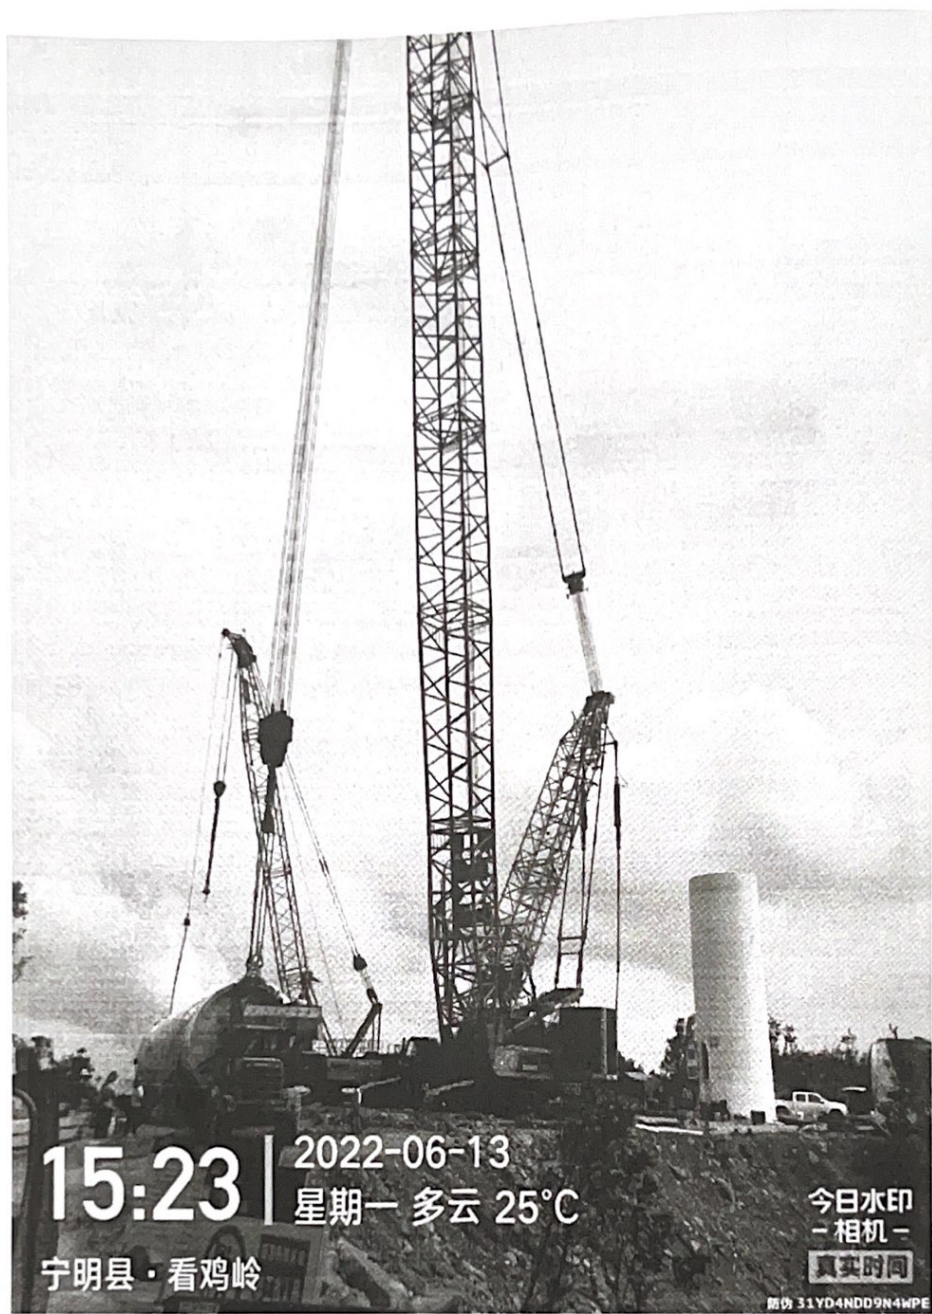

17#风机吊装

常州正衡电力工程监理有限公司

宁明县桐棉风电场项目监理部

2022 年 6 月
