

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2021 年 第一期

项目：上海鑫泽置业有限公司 0.8WMP 光伏发电项目		填报周期：2021 年 9 月 6 日—9 月 12 日		
一、项目总体建设进度汇总：				
1、18#食堂屋顶混凝土配重块砼浇筑不合格清理完成 100%。18#楼食堂屋顶基础墩定位放线及模具、防水卷材切割摆放完成。				
2、14#公寓楼屋顶瓦片拆除完成 100%。				
3、15#公寓楼屋顶瓦片拆除完成 100%。				
4、16#公寓楼屋顶瓦片拆除完成 100%。				
5、17#公寓楼屋顶瓦片拆除完成 100%。				
6、电子图已出，纸质版图纸未见。				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、道路工程	无			
2、开关站/升压站	无			
3、综合楼/附属建筑	无			
4、场内桩基施工	18#屋顶混凝土配重块砼浇筑不合格清理完成			
5、支架及组件安装	未开始施工。			
6、逆变器及箱变	未开始安装。			
7、送出工程（含对侧）	无			
8、现场调试	未开始			
9、出图情况	电子图已出，纸质版图纸未见。			
10、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货（0%），已到货数量（0%） 延误原因及催货措施
	组件	9 月 1 日	9 月 1 日	组件到货 100%
	汇流箱	无		
	逆变器	未知		
	并网柜	未知		
	线 缆	未知		
11、人员/机械情况	施工人员（含管理）6 人/天。吊车一台。			
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				

项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施 (简述)
1、首个基础施工	9月12日		9月14日	
2、首套组件安装	9月15日		9月17日	
3、线路倒送电	-	-	-	
4、首个发电单元并网				
5、全容量并网	10月31日			
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题	无			
未解决的协调问题 解决进展	图纸有电子档，但详图还未见。			
五、下周计划主要工作内容				
1、道路工程	无			
2、综合楼工程	无			
3、升压站及开关站工程	无			
4、组件区域工程				
5、逆变/箱变工程				
6、外线工程	无			
7、其他				

填报人：辛国顺 审核人：_____ 时间：2020年09月12日


工程现场照片（含文字描述）：



鑫泽阳光公寓平面图



废水泥墩吊运

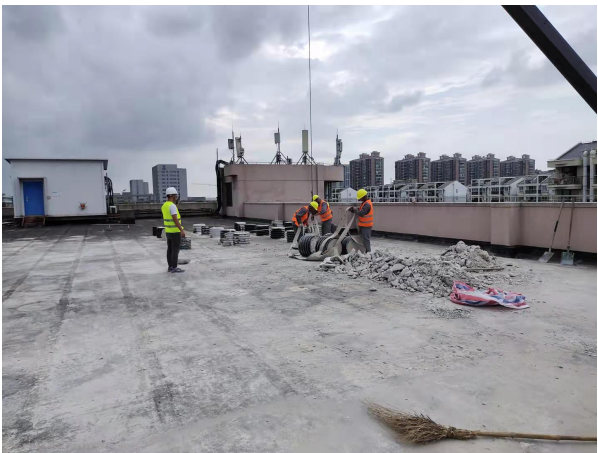

18#楼食堂屋面清理



公寓楼瓦片拆除
