



正衡监理

编号: NTZH-JLYB-001

监 理 月 报

工程名称: 南通振华重型装备制造有限公司二期分布式光伏
发电项目

第 1 期

2021.03.25~2021.04.25

项目监理部

总监理工程师



报告日期: 2021 年 04 月 25 日

监 理 月 报

工程名称：中电售电（常熟车饰）屋顶光伏项目


编号：NTZH-JLYB-001

一、工程形象进度（形象进度表、照片）

形象进度表

分项名称	施工工序	完成情况	备注
屋面工程	夹具安装	100%	2021 年 03 月 25 日正式 开始夹具预 装
	导轨安装	100%	
	组件安装	70%	
	逆变器安装	0%	
	桥架安装	0%	
	直流电缆放线	0%	
	检修通道安装	0%	
	清洗系统安装	0%	
	接地网安装	0%	
地面工程	电缆沟开挖	0%	
	开关柜安装调试	0%	

形象照片

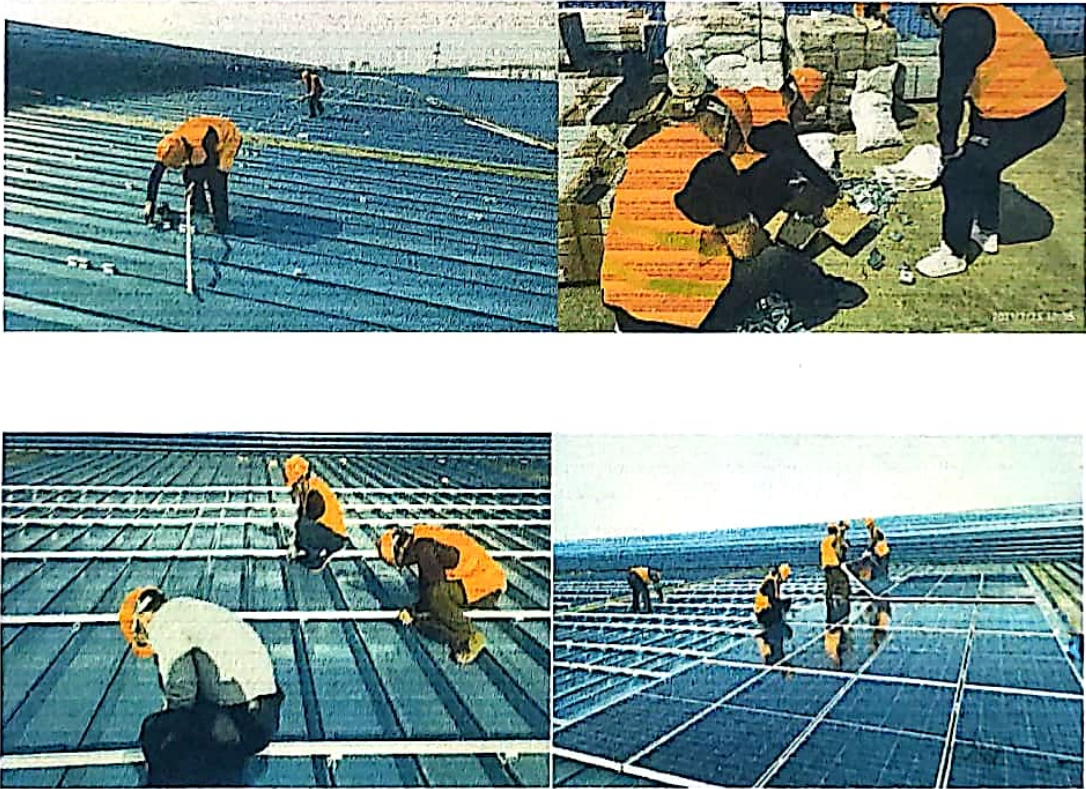

二、主要监理工作（质量、安全、进度、投资）

自开工以来，本监理部重点对进场的材料、设备进行把控，核对测量图纸要求的夹具、导轨、桥架、偏铁、角铁等规格，镀锌层严等，其中偏铁不符合设计要求，并进行了撤场处理，重新换回了合格产品，施工中严格认真执行光伏监理规范的要求对工程质量、安全、等方面进行全面控制，并严格按监理程序进行。

1、为确保工程质量，监理人员跟班全面监理，对吊装危险作业等进行旁站并做好旁站记录，同时督促施工单位同步上报过程资料，做好各工序工程的验收，监理部定期召开监理例会，确保质量、安全正常。

2、本项目部在日常监理过程中特别重视安全方面的监理工作，对进场的新工人，督促专职安全员做好行程记录及苏康码检查，并进行安全培训，对吊装、对临时用电、消防安全、场容场貌等进行严格管理，积极配合厂方所要求的内容进行现场管理，本月安全文明生产状况良好，施工现场未有任何安全问题发生。

三、工程存在问题及建议

安装组件有时会出现手撑面板现象，时有个别施工人员上屋面后不戴安全帽现象。

监理部要求施工项目部加强质量管理和安全管理，积极做好自验工作，同步上报资料，做好归档资料准备，确保竣工顺利完成。

四、下月监理工作安排

积极加强现场质量、安全管理，督促施工单位完善过程资料。

项目本月大事记

- 1、2021年03月31日组件进场。
- 2、2021年04月02日召开第二次监理例会。
- 3、2021年04月12日召开第三次监理例会。
- 4、2021年04月15日组件开始安装。
- 5、2021年04月22日召开第四次监理例会。

2021年04月25日
