

正衡监理

编号: JXM18-YB-002

监 理 月 报

工程名称: 绥化市通力光伏发电平价上网项目

2021 月 05 第 02 期

项目监理部(章):



总监理工程师:

徐耀光

报告日期: 2021 年 05 月 30 日

监 理 月 报

工程名称：绥化市通力光伏发电平价上网项目 月次 第 2 次

月报开始时间 2021 年 05 月 01 日 结束日期 2021 年 05 月 30 日

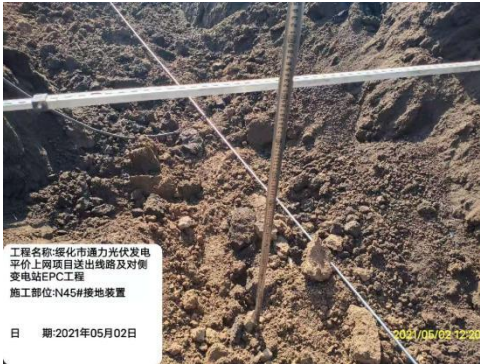
监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	绥化市通力光伏发电平价上网项目	绥化市通力光伏发电平价上网项目	照片	15 张	

一、 监理重点工作情况

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度		本月主要工作： 1、外线共 52 基铁塔，塔基砼浇筑完成率 100%；铁塔地面卧组完成 52 基完成率 100%，铁塔组立完成 48 基完成率 92%；N19-N34 光缆、导线展放完成率 30%。	送出线路铁塔组立全部完成；光缆、导地线展放完成 100%；对侧完成土地征用、改造施工； 升压站设备基础全部完成；围墙及大门施工完成；主控楼完成 50%，部分设备到场就位； 光伏区：开始进场施工。

	   	2、升压站：围墙基础施工完成率 80%，；主变基础第一承台浇筑完成；站用变基础浇筑完成；一次预制舱底板浇筑完成；接地变基础、SVG 基础、避雷针基础开挖完成。 3、光伏东区进场道路施工完成；堆场、围栏施工，塘埂修复。	
--	---	--	--





			
设备交付进度		送出线路材料 全部到场	升压站部分设备到场
设计交付进度		外线图纸已出、 升压站部分图 纸已出。	升压站图纸全部交付，光 伏区图纸逐步交付。
质量体系运作情况		质量体系健全， 运行良好落实 质量保证体系， 并对运行情况 进行检查	质量保证体系进行跟踪检 查。
施工图会审		升压站图纸进 行会审 4 次	升压站、光伏区图纸逐步 进行会审。
设计交底		升压站设计进 行交底	到场图纸进行设计交底
方案审查		部分已审查	对施工单位各种方案报审 进行审查。

	技术交底	进行相关技术交底	做好施工准备前技术交底
	设计变更	升压站：综合楼、大门基础正在进行变更	进一步优化施工，合理进行设计变更
安全	安全培训情况	新进场员工已进行三级安全教育培训	对新员工进行安全培训。
	安全交底情况	施工单位对危险、重点、要点作业区进行安全交底	督促施工单位做好安全交底。
	安全措施落实情况	安全措施落实良好，现场指出问题能够尽快整改。	督促施工单位做好安全措施落实
	安全文明施工情况	现场安全、文明措施良好，施工人员能够佩戴安全帽、穿反光背心、高空作业系安全带，现场5牌1图、标识标牌、安全警示标志逐步完善。	加强现场安全管理力度
质量	主要工序质量	按规范施工，进行三级自检，材料到场先报验后使用，按图施	加大工序检查力度，规范施工。

		工。	
	主要原材料质量	钢筋、混凝土外观检查合格。 已送相关部门检测。	保证材料到场报审、送检，验收合格后才能使用，做好监理材料平行检验。
	构（配）件质量	/	对构配件进行跟踪检查
	设备质量	外线材料全部到场，送检合格	做好设备到场检查，发现问题立即反馈建设单位。
	质量验评情况	质量验评合格	严格把好质量验评关
投资	资金情况	/	/
	款项支付情况	/	/
	预算外签证	无	/
合同	合同签订情况	送出线路、升压站、光伏区施工合同已签订	/
	合同执行情况	按合同执行良好	做好合同执行工作

二、 本月进度情况

1、送出线路：本月共完成 7 基基础浇筑，塔基砼浇筑共完成 52 基，完成率 100%；铁塔地面卧组完成 52 基，完成率 100%；铁塔组立完成 48 基，完成率 92%，N19-N34 光缆、导线展放完成，完成率 30%。

2、升压站：人员进场；围墙基础施工；主变基础第一承台浇筑完成；站用变基础浇筑完成；一次预制舱底板浇筑完成；接地变基础、SVG 基础、避雷针基础开挖完成。

3、光伏东区进场道路施工完成，管桩进场 2000 根；堆场围栏施工完成；局部池塘修复。

4、本月发出监理工程师通知单 5 份，监理工作联系单 1 份，工程例会组织 4 次，安全大检查组织 1 次，质量旁站 9 次，安全旁站 15 次。

三、下月进度计划

送出线路：铁塔组立全部完成；导地线展放完成 100%，对侧完成征地工作，改造施工；

升压站设备基础全部完成；围墙及大门施工完成；主控楼完成 50%，部分设备就位；

光伏区：东区月初施工人员进场，西区施工人员中旬后进场。

四、安全文明施工情况

事故（起）			编制安全策	施工	安全分包情况			
人身重	机械设	电网事	划文件（份）	人数	分包队	分包队	系统外包	系统外队伍人
伤	备	故			伍数量	伍人数	队伍数量	数
无	无	无		60 人	2	/	/	/

五、施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管 理	督促施工单位优化人、机、料、法、环等资源配置，充分调动施工人员的积极性。	督促光伏区施工单位尽快进场施工，尽快投入人员设备，保证进入正常施工状态，协调外线施工单位尽快完成所有线路工程。督促升压站尽快完成设备基础施工及主控楼施工。
安全管 理	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，定期对现场进行安全检查；对新进场施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。审查施工项目部<<安全文明措施>>及施工项目部施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件，实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，定期对现场进行安全检查；对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。审查施工项目部<<安全文明措施>>及施工项目部施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件，实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。
质 量 管 理	督促施工单位材料到场及时进行报验及送检工作；做好施工质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划，做好每道工序报验，验收合格后才能下道工序，并对到场材料和施工质量进	对材料到场进行检验；要求施工单位每道工序必须自检合格报审监理批准后才能进入下道工序，督促施工单位做好质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。

	行平行检验。	
技 术 管 理	督促施工单位对施工人员进行技术交底， 现场检查施工人员是否按照技术交底内 容进行施工。	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人 员是否按照技术交底内容进行施工。
造 价 管 理	/	/
物 资 供 应	协助建设单位做好建设物资进场准备工 作，督促乙供材料、物资及时到场，提前 做好计划安排。	协助建设单位做好建设物资进场工作，督促施工单位做好 物资供应工作。

常州正衡电力工程监理有限公司

绥化市通力光伏发电平价上网项目

2021 年 05 月 30 日
