

编号: CHZH-YB-001

监 理 月 报

工程名称: 昆山建昌金属科技有限公司 1MWp 分布式光
伏发电项目

2021 年 05 月第 01 期

总监理工程师: 李俊平

监理单位(章)

2021 年 05 月 31 日




监 理 月 报


工程名称: 昆山建昌金属科技有限公司 1MWp 分布式光伏发电项目

月报开始时间 2021 年 05 月 07 日 结束日期 2021 年 05 月 31 日


监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

一、 监理重点工作情况

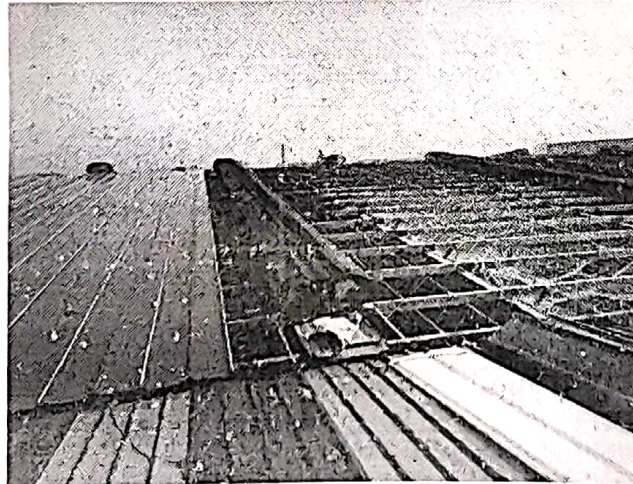
专业	影像资料	
进度		厂房加固
		彩钢瓦屋面钢丝网敷设

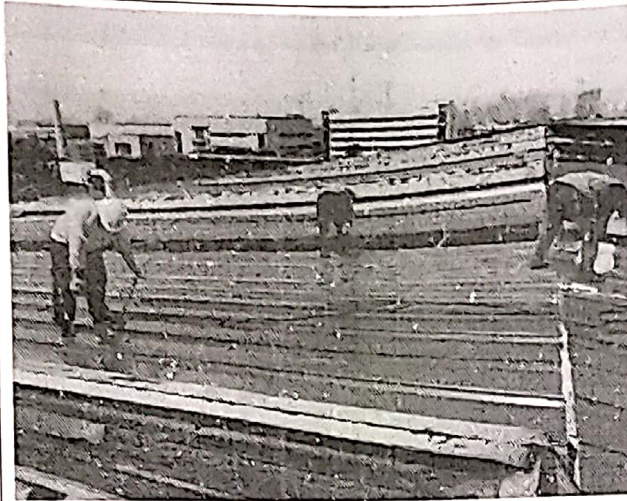

彩钢瓦屋面安装

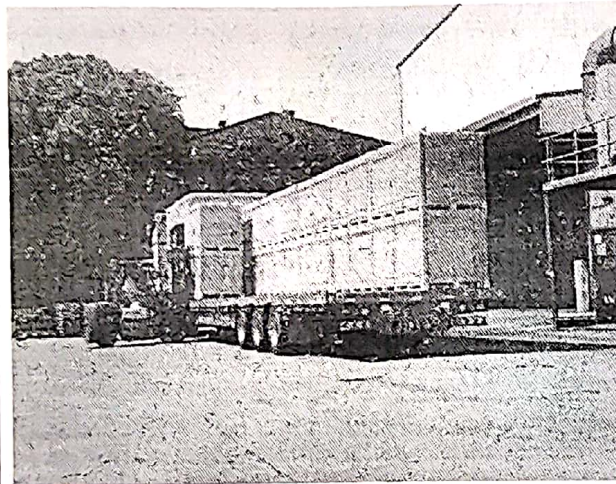

组件到场验收

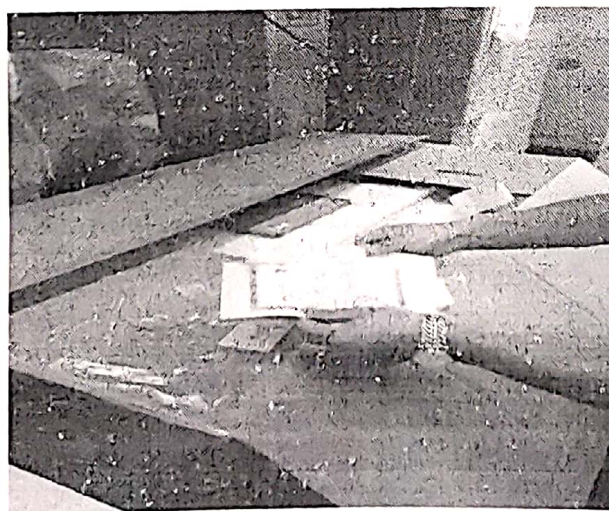

逆变器开箱

设备交付进度

组件及逆变器已全部到场

设计交付进度

图纸未出图

	质量体系运作情况	/
	施工图会审	已进行图纸会审
	设计交底	已完成设计交底
	方案审查	已交付，各专业方案已由各专监审核完毕
	技术交底	已完成技术交底
	设计变更	未有设计变更
安全	安全培训情况	新进场员工已进行安全培训
	安全交底情况	督促施工单位对危险作业点进行班前交底
	安全措施落实情况	落实不彻底，已要求施工单位认真落实，检查现场存在的安全隐患，发现问题及时整改。
	安全文明施工情况	现场安全、文明措施良好
质量	主要工序质量	工序验收质量合格
	主要原材料质量	进场原材料符合设计要求，质量证明文件齐全
	构（配）件质量	构配件符合设计要求，质量证明文件齐全
	设备质量	进场设备符合设计要求，质量证明文件齐全
	质量验评情况	/
投资	资金情况	/
	款项支付情况	/
	预算外签证	/
合同	合同签订情况	施工合同签订
	合同执行情况	按合同执行

二、本月进度情况

钢结构:

- 1、塘钢结构加固完成 30%;
- 2、彩钢瓦屋面拆除完成 50%;
- 3、彩钢瓦更换完成 47%;

光伏电站:

- 1、组件及逆变器全部到场;

三、下月进度计划

钢结构:

- 1、塘钢结构加固完成 100%;
- 2、彩钢瓦屋面拆除完成 100%;
- 3、彩钢瓦更换完成 100%;

光伏电站:

- 1、支架及组件安装完成 100%;
- 2、逆变器及并网柜安装调试完成 100%;
- 3、直流及交流电缆敷设完成 100%;
- 4、具备并网条件;

四、安全文明施工情况

事故(起)			编制安全策	施工	安全分包情况			
人身重	机械设	电网事	划文件(份)	人数	分包队	分包队	系统外	系统外

伤	备	故			伍数量	伍人数	包队伍 数量	队伍人 数
无	无	无	/	8 人	/	/	/	/

五、 施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	督促施工单位优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性	/
安全管理	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，安委会要定期对现场进行安全检查；对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。审查施工项目部<<安全文明措施>>及施工项目部施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件，实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。	/
质量管理	单位工程重点部位施工进行旁站；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。	/
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工工人是否按照技术交底内容进行施工。	/
造价管理	对施工单位申请的工程款及时进行评审	/
物资供应	协助建设单位做好建设物资进场工作，督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。	/

常州正衡电力工程监理有限公司

昆山建昌金属科技有限公司 1MWp 分布式光伏发电项目

2021 年 05 月 31 日
