

来安县华基新能源有限公司 2.5MW 光伏发电工 程项目

监理单位月报 2021 年 1 期

项目：来安县华基新能源有限公司 2.5MW 光伏发电工程项目		填报周期：2021 年 06 月 01 日—06 月 30 日		
一、项目总体建设进度汇总：				
1、班组建设（新进人员入场体检、安全交底培训）；				
2、顶管施工；				
3、夹具安装；				
4、导轨铺设；				
二、本月工程建设工作内容及完成情况				
1、支架及组件安装	导轨完成 100%； 组件完成 0% 夹具完成 100%， 顶管施工完成 100%			
2、逆变器及并网柜	并网柜 0%；逆变器 0%。			
3、现场调试	完成 0%。			
4、桥架、接地	桥架 0%；接地 0%；			
5、电缆敷设接线	完成 0%			
6、出图情况	未出图纸。			
0010、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本月到货情况，累计到货（），已到货数量（）%延误原因及催货措施
	导轨 6.25M	5 月 29 日	5 月 29 日	到货 100%
	导轨 6.35M	5 月 29 日	5 月 29 日	到货 100%
	电缆桥架	月 日	月 日	到货 0%
	夹具	5 月 29 日	5 月 29 日	到货 100%
	组件	5 月 30 日	5 月 30 日	到货 70%
	逆变器	6 月 26 日	6 月 26	到货 100%

			日	
	电缆设备	月 日	月 日	到货 0%
11、人员/机械情况	本月施工人员 10 人。			
三、截止本月工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首套组件安装	7 月 10 日	月 日	月 日	
2、全容量并网	8 月 28 日	月 日	月 日	
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题	1、现场无安全文明施工标示标牌。 2、屋顶无临边防护。 3、爬梯防护未焊接。			
未解决的协调问题 解决进展	支架材料镀锌层不符合要求			
五、下月计划主要工作内容				
1、安装组件	安装完成 100%			
2、安装桥架	安装完成 100%			
3、检修通道安装	安装完成 100%			
4、安装逆变器	安装完成 100%			
5、敷设线缆	安装完成 100%			
6、全容量并网	安装完成 100%			

填报人： 刘春宇 审核人： 唐剑 时间： 2021 年 06 月 30 日

工程现场照片



第一次会议




顶管熔接



顶管施工



导轨安装检查

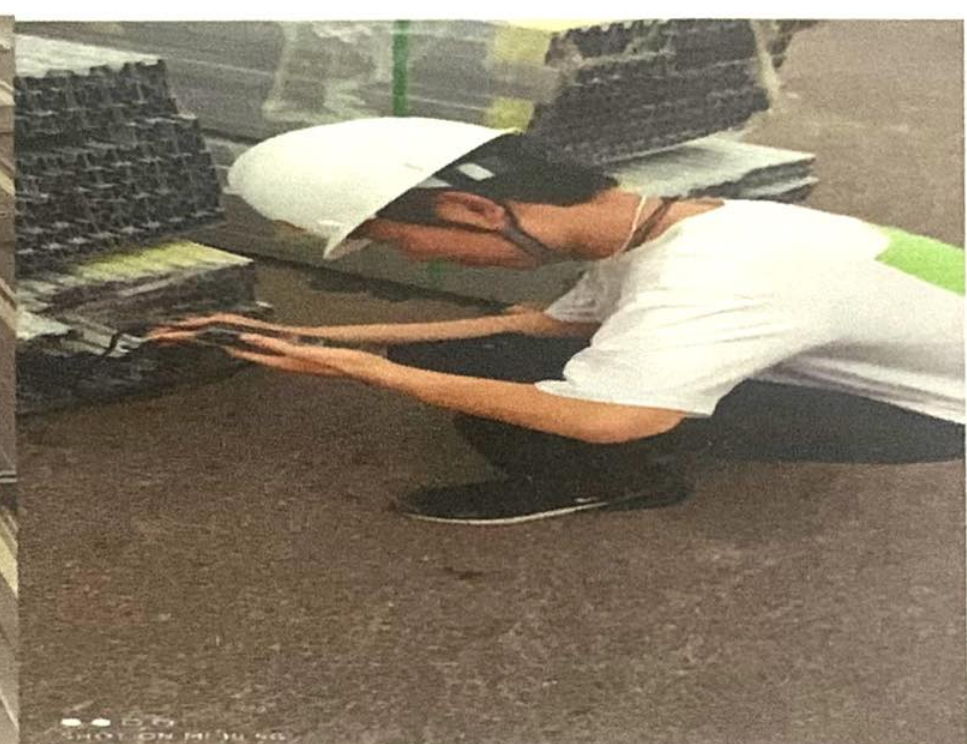

导轨安装



材料检测



材料复测

做安全措施、做拉拔试验、夹具安装、组件卸货、导轨安装；

