

来安县华基新能源有限公司 2.5MW 光伏发电工 程项目

监理单位月报 2021 年 2 期

项目：来安县华基新能源有限公司 2.5MW 光伏发电工程项目		填报周期：2021 年 08 月 01 日—08 月 31 日		
一、项目总体建设进度汇总：				
1、运维走道安装：				
2、吊装组件；				
3、组件安装：				
4、接地小黄线安装：				
5、桥架安装：				
6、逆变器安装：				
7、并网柜就位：				
8、逆变器支架制作：				
9、MC4 接头链接：				
10、逆变器吊装：				
二、本月工程建设工作内容及完成情况				
1、支架及组件安装	导轨完成 100%： 组件完成 60% 夹具完成 100%， 顶管施工完成 100%			
2、逆变器及并网柜	并网柜 0%；逆变器 10%。			
3、现场调试	完成 0%。			
4、桥架、接地	桥架 100%；接地 30%；			
5、电缆敷设接线	完成 0%			
6、出图情况	已出图纸。			
0010、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本月到货情况，累计到货（），已到货数量（）% 延误原因及催货措施
	导轨 6.25M	5 月 29 日	5 月 29 日	到货 100%
	导轨 6.35M	5 月 29 日	5 月 29 日	到货 100%



	电缆桥架	7月20日	7月20日	到货 100%
	夹具	5月29日	5月29日	到货 100%
	组件	8月18日	8月18日	到货 100%
	逆变器	6月26日	6月26日	到货 100%
	电缆设备	7月27日	7月27日	到货 100%
11、人员/机械情况		本月施工人员 10 人。		
三、截止本月工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析:				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施(简述)
1、首套组件安装	7月30日	月 日	月 日	施工人员较少, 进度较慢
2、全容量并网	8月28日	月 日	月 日	
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题	1、组件安装存在错缝, 不符合要求。 2、现场为彩钢瓦屋面, 无女儿墙, 你单位个别未做临边防护, 存在严重的安全隐患。 3、运维通道紧固件存在生锈现象, 不符合要求。 4、三角钢镀锌厚度未达到标准, 不符合要求。 5、三角钢打孔部分未做防腐, 不符合要求。 6、该项目已进场数日, 但至今监理项目部未收到任何开工资料报审及相关材料资质报审。 7、部分导轨紧固件未紧固及紧固件型号不同, 不符合要求。 8、组件压块缝隙较大, 不符合要求。 9、发出的监理通知单至今已有七份, 未见任何回复。 10、组件落灰污染, 严重影响美观。 11、现场临时用电, 未见移动配电箱, 易造成安全隐患。 12、桥架安装部分存在变形、扭曲、生锈、影响工程质量。不符合要求。 13、桥架安装部分紧固件存在生锈及个别紧固件未紧固, 不符合要求 14、部分玻璃格栅损坏, 影响工程质量, 不符合要求。 15、部分导轨存在泛黄疑似生锈。 16、组件 MC4 线搭接屋面, 不符合要求。 17、桥架电缆沟深度未达到七十, 不符合要求。			
未解决的协调问题 解决进展	三角钢镀锌厚度未达到标准, 不符合要求。			




五、下月计划主要工作内容

1、安装组件	安装完成 100%
2、安装桥架	安装完成 100%
3、检修通道安装	安装完成 100%
4、安装逆变器	安装完成 100%
5、敷设线缆	安装完成 100%
6、全容量并网	安装完成 100%

填报人：刘春宇 审核人：唐剑 时间：2021年08月31日

现场施工照片

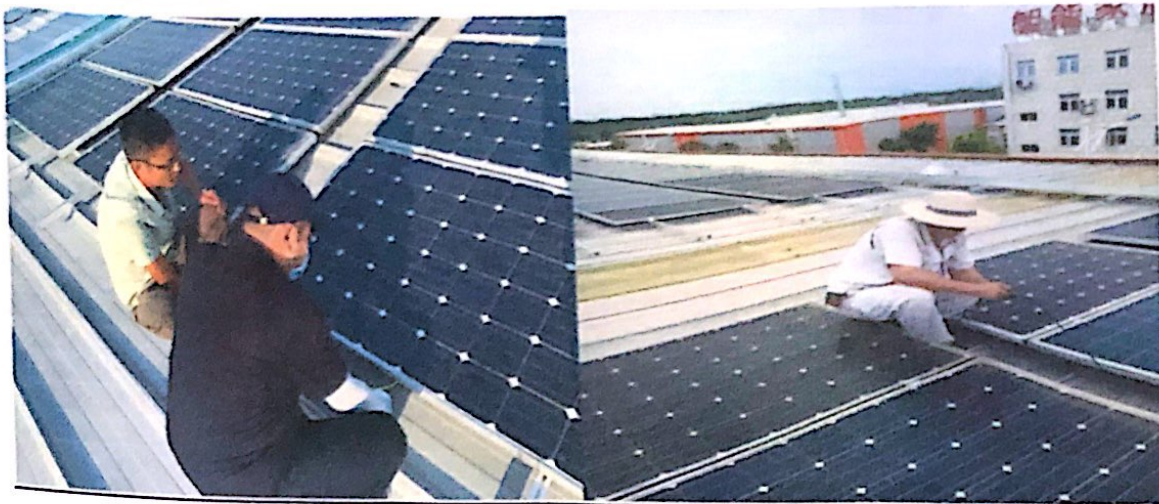

协同业主检查现场


MC4 接头链接



接地小黄线安装

组件安装



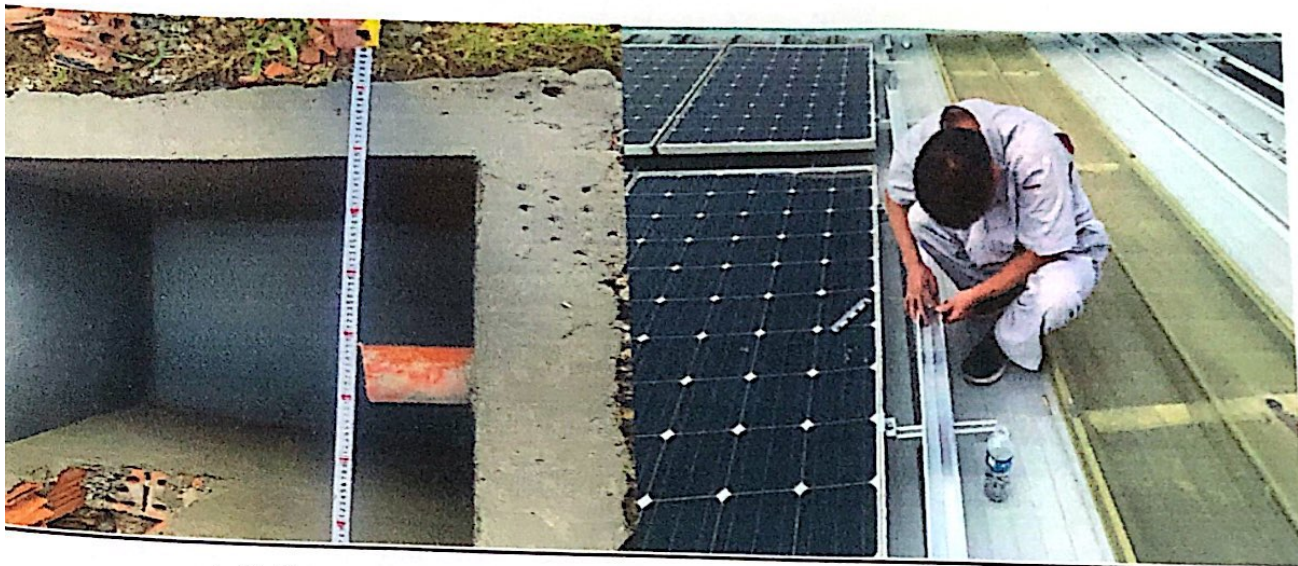

电缆井数值

桥架安装



逆变器支架制作

并网柜就位




导轨疑似泛黄生锈

玻璃格栅紧固件未紧固





运维通道紧固件生锈

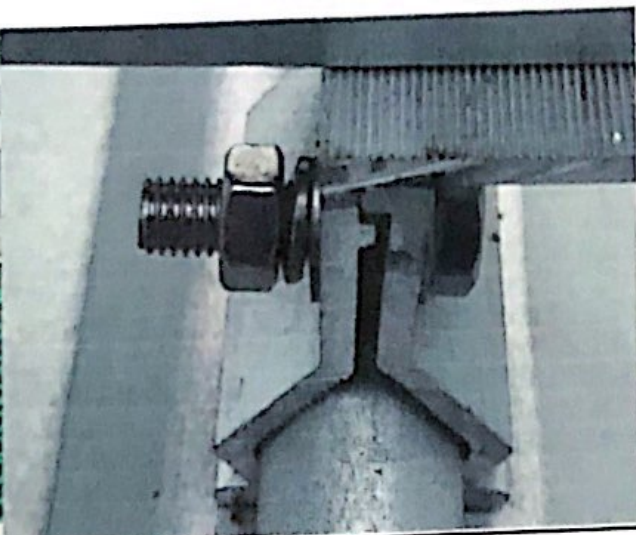


夹具紧固件未紧固



组件落灰污染



移动用电未见移动配电箱

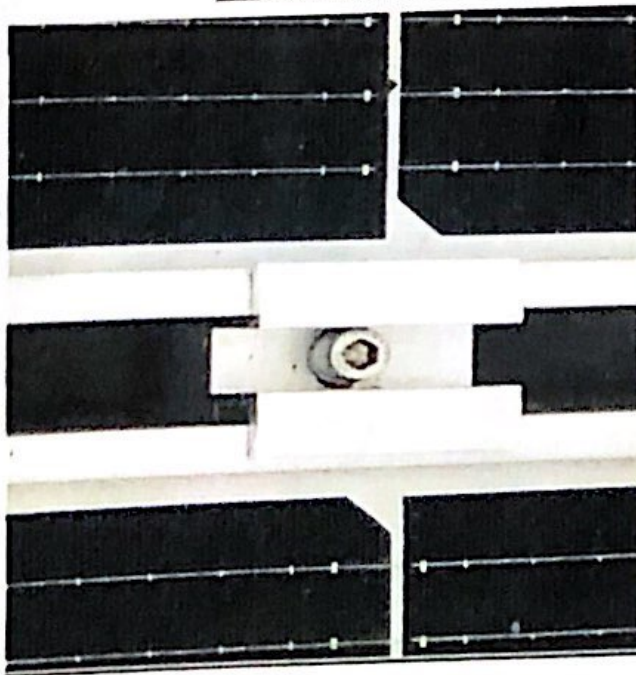

压块与组件存在缝隙




桥架扭曲





组件吊装

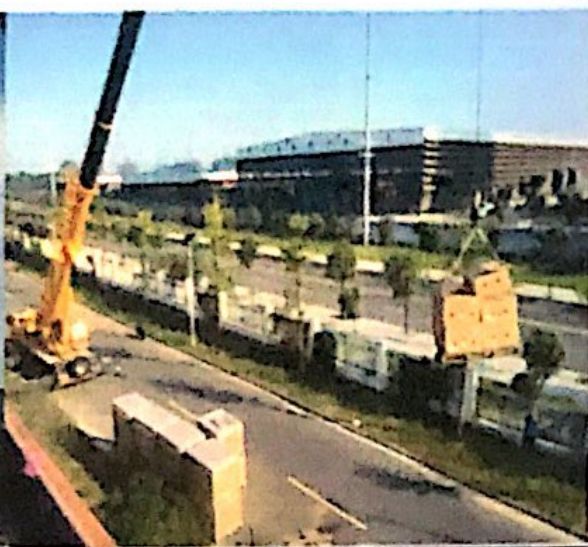

逆变器吊装



逆变器安装



逆变器支架安装



组件安装




小黄线安装





桥架安装

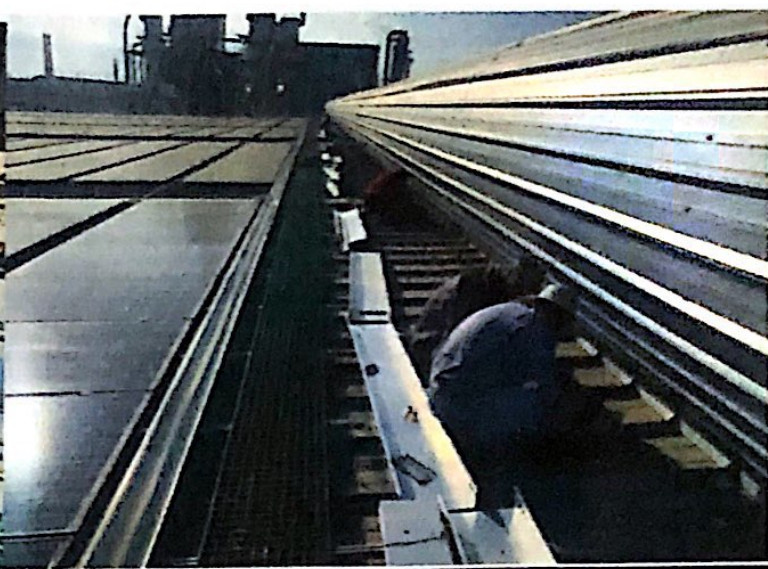

桥架安装



组件安装



组件安装

