

来安县华基新能源有限公司 2.5MW 光伏发电工程 项目

监理单位月报 2021 年 4 期

项目：来安县华基新能源有限公司 2.5MW 光伏发电工程项目		填报周期：2021 年 09 月 01 日—09 月 27 日		
一、项目总体建设进度汇总： 1、组件安装； 2、逆变器安装； 3、母线槽制作； 4、直流电缆敷设； 5、并网柜铜牌及铜牌桥架安装； 6、并网柜铜牌制作； 7、交流电缆敷设； 8、逆变器电缆头制作； 9、MC4 接头链接； 10、并网装表；				
二、本月工程建设工作内容及完成情况				
1、支架及组件安装	导轨完成 100%； 组件完成 100% 夹具完成 100%， 顶管施工完成 100%			
2、逆变器及并网柜	并网柜 100%；逆变器 100%。			
3、现场调试	完成 0%。			
4、桥架、接地	桥架 95%；接地 90%；			
5、电缆敷设接线	完成 90%			
6、出图情况	已出图纸。			
0010、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本月到货情况，累计到货（），已到货数量（）% 延误原因及催货措施
	导轨 6.25M	5 月 29 日	5 月 29 日	到货 100%
	导轨 6.35M	5 月 29 日	5 月 29 日	到货 100%

	电缆桥架	7月20日	7月20日	到货 100%
	夹具	5月29日	5月29日	到货 100%
	组件	8月18日	8月18日	到货 100%
	逆变器	6月26日	6月26日	到货 100%
	电缆设备	7月27日	7月27日	到货 100%
11、人员/机械情况	本月施工人员 10 人。			
三、截止本月工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首套组件安装	7月30日	月 日	月 日	施工人员较少，进度较慢
2、全容量并网	8月28日	月 日	月 日	
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题	1、部分压块与组件存在缝隙影响工程质量以及安全问题，影响工程质量。 2、部分组件安装未做到横平竖直严重影响美观及工程质量。 3、个别夹具紧固件未紧固，不符合要求。 4、部分夹具紧固件朝向不统一，不符合要求。 5、部分运维通道玻璃格栅未做紧固件，影响工程质量。 6、接地扁铁焊接面未刷漆，不符合要求。 7、个别桥架存在变形、扭曲，不符合要求。 8、交流电缆敷设未达到横平竖直，不符合要求。 9、直流电缆存在严重涡流情况，严重影响工程质量。 10、个别导轨存在锈蚀严重，不符合要求。 11、部分桥架紧固件生锈、未紧固，不符合要求。 12、部分运维通道紧固件及玻璃格栅紧固件生锈严重，不符合要求。 13、个别导轨存在变形、生锈，不符合要求。 14、个别桥架存在错孔，不符合要求。 15、开工至今下发通知单均未见回复。 16、前期报审资料、过程资料、实验报告未见报审。。			
未解决的协调问题 解决进展				
五、下月计划主要工作内容				
1、安装组件	安装完成 100%			

2、安装桥架	安装完成 100%
3、检修通道安装	安装完成 100%
4、安装逆变器	安装完成 100%
5、敷设线缆	安装完成 100%
6、全容量并网	安装完成 100%

填报人： 刘春宇 审核人： 唐剑 时间： 2021年09月27日


现场施工照片



组件安装



铜牌安装检查

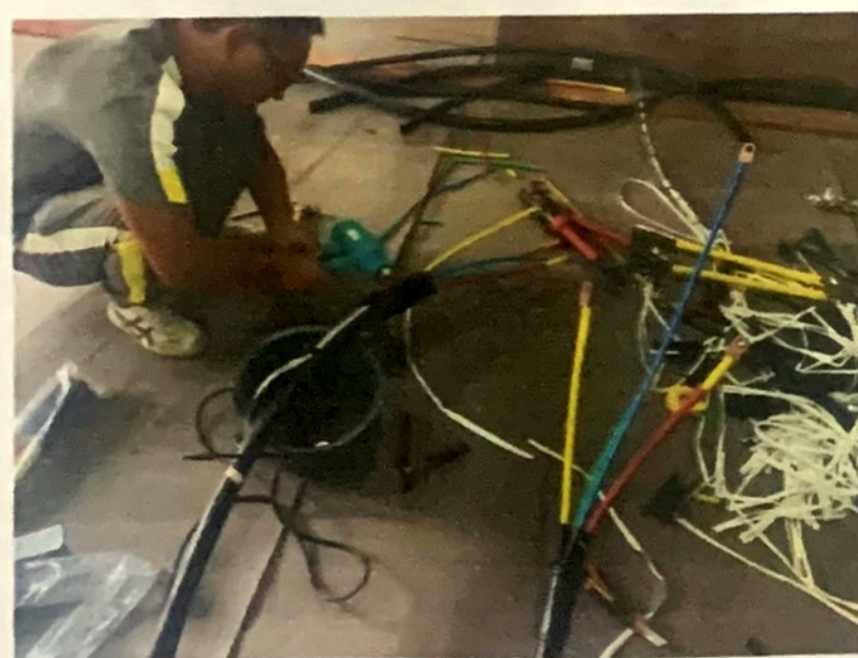

电缆头制作



装表检查



直流电缆连线



直流电缆敷设



铜牌制作



交流电缆敷设



导轨疑似泛黄生锈
