



工程名称：沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

监 理 月 报

第七期

项目监理部（章）：

总监理工程师：_____

常州正衡电力工程监理有限公司
沽源县平定堡镇 150MW 风电项目监理

日期：2021 年 12 月 31 日



监 理 月 报

一、 监理重点工作情况

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
协调	组织工作	本月组织和参与安全技术交底召开 2 期、专题例会 3 次、安全活动 1 次； 本月经过饮驰 220KV 线路的第二次质检工作。 本月经过升压站和风电场的国网公司生产质检验收。	在质量、安全、进度、投资方面严格把控、风机电装还有 4 台未完成。 质量管理方面以查找汇总问题、消缺处理问题。 在安全管理方面，查找危险源、特别是设备带电前和设备带电后落实管控措施；
进度	主要工序工作	1、升压站所有电气设备安装调试到位，其中包括主变、GIS 、SVG、3 次、5 次、7 次电容滤波器、所有 35KV 高低压柜、继电保护控制柜。 12 月 31 日升压站已带电。 2、对端站驰盛 220KV2213 间隔接引线工程及附属设备安装调试完成。12 月 31 日同升压站一起带电运行。 3、集电线路 1、2、3、4、5、6 回路 35KV 高压电缆铺设完成，但由于部分光缆的质量问题，使光纤通信存在问题，现在查找问题、进行处理，由于授电合同问题集电线路没有送电。 4、本月完成风机吊装安装合计 8	下月部分进行消缺。


		台，分别是 N01、N02、N04、N07、C13、C50、C51、L15、C36。 5、道路工程进展顺利，已全部完成。	
	设备交付进度	已全部进场就位	设备资料汇总收集落实
	设计交付进度	竣工图纸还没有完成。	下月结束，归档准备。
	质量体系运作情况	质量体系健全，运行良好	落实质量保证体系，并对运行情况进行检查
安全	安全培训情况	本月对进场员工已进行安全培训	督促施工单位对进场新员工进行安全教育
	安全交底情况	督促施工单位对危险作业点进行班前交底	继续督促施工单位进行班前交底
	安全措施落实情况	场地防护栏杆安装及用电要求施工方落实到位	防火、带电设备安全警示
	安全文明施工情况	现场安全、文明措施良好	加强现场安全管理力度
质量	主要工序质量	现阶段，要求质量严格按照业主要求监管。	安装、调试强制性质量问题执行情况良好。
	主要原材料质量	主要材料进行质量检查	把控好材料进场质量问题
	构（配）件质量	把控好进场材料质量关	严抓构配件质量问题
	质量验评情况	将不符合设计要求的地方，要求施工方进行整改	


二、安全文明施工情况

事故（起）			编制安全策划文件（份）	施 工 人 数	施工单位数 量
人身 重伤	机械设备	工程事故			

无	1、风机安装工程： 吊装一队 9800 型主吊一台；附吊 2 台。 吊装二队 11000 型主吊 1 台，附吊 2 台。	无	2 份	42 人	2 个
	2、集电线路工程： 集电线路一队，挖机 2 台。 集电线二，挖机 2 台。	无	2 份	22 人	2 个
	3、升压站工程和对端站驰盛 220KV2213 工程和饮驰 220KV 线路工程	无	2 份	21 人	2 个

附图

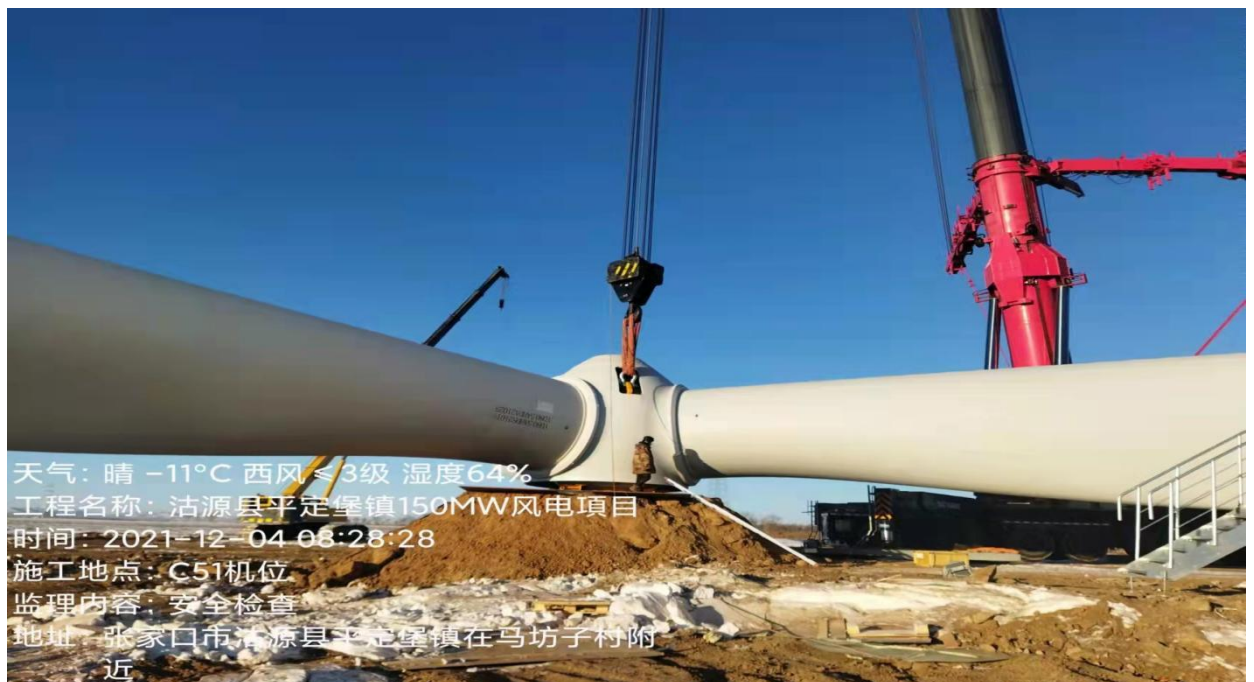

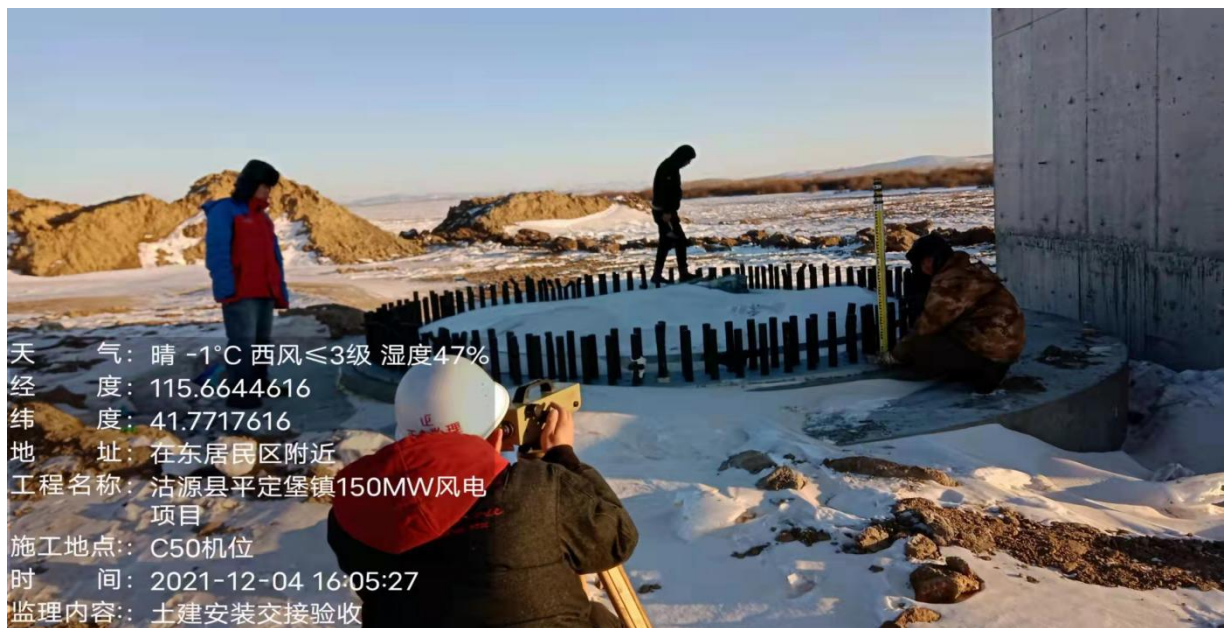













常州正衡电力工程监理有限公司 沽源县平定堡镇 150MW 风电项目监理部

2021 年 12 月 31 日
