



编号: JLYB-01

监 理 月 报

安徽鑫宇新能源有限公司 1.7MW 分布式光伏项目

2021 年 08 月

第 1 期

项目监理部 (章):

总监理工程师:



报告日期: 2021 年 08 月 31 日

常州正衡电力工程监理有限公司

监理月报

工程名称：安徽鑫宇新能源有限公司 1.7MW 分布式光伏项目

第 1 次月报开始时间：2021 年 08 月 04 日 截止日期：2021 年 08 月 31 日

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司


一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	安徽鑫宇新能源有限公司 1.7MW 分布式光伏项目		施工照片		

二、监理重点工作情况

专 业	事 项	本月重点工作情况	下月重点工作 计划
进 度	 	本月二号厂房导轨安装，汇线敷设，桥架安装，扁铁安装，运维通道安装完成。 一号厂房，导轨安装完成 30%左右，一号厂房扁铁，运维通道散料。 于 8 月 26 日三方（监理单位、业主单位、施工单位）进行对二号厂房组件安装前质量验收。	计划下月二号厂房组件安装全部完成；一号厂房导轨、桥架、运维通道、接地施工、组件安装完成；所有光伏厂区施工验收完毕，具备并网条件。



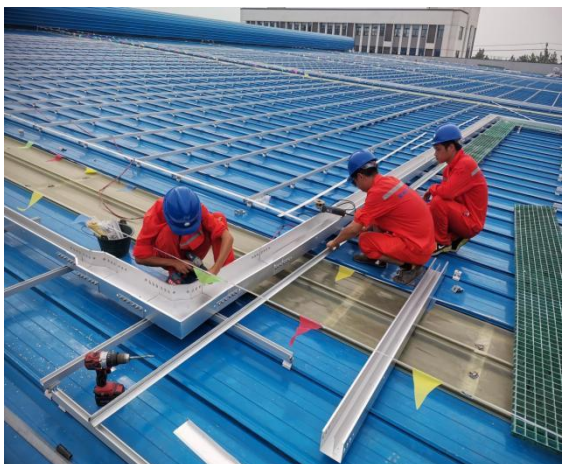



			
	设备交付进度	本月光伏导轨、桥架、组件、等到货及时。	
	设计交付进度	施工电子版图纸交付； 包括一号、二号厂房支架分布图、组件安装、电气安装等电子版图纸交付。	
	质量体系运作情况	施工人员安全意识良好，总体运行良好。	落实质量保证体系,并对运行情况进行检查
	施工图会审	根据现场实际调控	
	设计交底	无	
	方案审查	承包单位前期资料未报审	已发通知单督促施工单位报审前期资料

	技术交底	监理项目部主持召开了质量安全技术交底会议，承包单位签字	
	设计变更	暂无	
安全	安全培训情况	新进场施工人员已进行安全培训并考试	督促施工单位对进场员工进行安全教育。
	安全交底情况	督促施工单位对危险作业点进行交底	继续督促施工单位进行各危险作业点交底。
	安全措施落实情况	安全文明施工正常，施工人员安全意识较强；现场无专职安全员。	加强现场安全管理力度，安全员尽快到场。
	安全文明施工情况	现场文明、安全施工措施实施到位。	加强现场安全文明施工管理力度。
质量	主要工序质量	导轨、桥架安装进行严格检查；汇线敷设进行检查。	严格把控施工质量。
	主要原材料质量	支架材料符合设计要求	对主要设备进行开箱检查
	构（配）件质量	进场材料质量合格	把控好进场材料质量关
	设备质量	符合设计要求	进行报验、开箱检查
	质量验评情况	各工序施工符合要求，但过程资料无法同步，未上报审核。	加强过程检查力度，加大工序报验抽查力度督促资料到位

投 资	资金情况	/	/
	款项支付情况	本月无资金批复	/
	预算外签证	无	/
合 同	合同签订情况	施工合同已签订	/
	合同执行情况	按合同执行	做好合同执行工作

三、本月进度情况

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	实际本月完成	本月实际完成（完成量/总量）	累计完成（完成量/总量）
1	基础浇筑					
2	支架/导轨安装	2021.08.10	2021.08.28	2021.08.26	50%	50%
3	组件安装	2021.08.29	2021.09.15		0%	0%
4	桥架安装	2021.08.10	2021.09.10	2021.08.22	40%	40%
5	组串电缆	2021.08.23	2021.09.15	2021.08.25	40%	40%
6	接地安装	2021.08.13	2021.09.10	2021.08.23	40%	40%
7	电缆敷设	2021.09.15	2021.09.20		0%	0%
8	逆变器安装	2021.09.10	2021.09.14		0%	0%
9	配电柜安装	2021.09.10	2021.09.14		0%	0%

四、下月进度计划

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	预计完成（完成量/总量）
1	支架/导轨安装	2021.09.01	2021.09.08	100%
2	组件安装	2021.09.01	2021.09.15	100%
3	桥架安装	2021.09.03	2021.09.11	100%
4	接地安装	2021.09.05	2021.09.10	100%
5	组串电缆	2021.09.10	2021.09.15	100%
6	逆变器安装	2021.09.10	2021.09.16	100%
7	配电柜安装电缆敷设	2021.09.10	2021.09.18	100%

五、安全文明施工情况

本月安全生产情况总体良好，承包单位及施工人员安全意识较强，管理人员、施工人员安全帽佩戴正常，但现场无专职安全员，

已告知施工单位安全员尽快到场。

事故（起）			编制安全 策划文件 （份）	施工 人数	安全分包情况			
人身重伤	机械设备	电网事故			分包队 伍数量	分包队 伍人数	系统外包 队伍数量	系统外队 伍人数
无	无	无		7 人	无	/	/	/

安徽鑫宇新能源有限公司 1.7MW 分布式光伏项目监理部

2021 年 08 月 31 日
