



正衡监理

编号: JLYB-01

监 理 月 报

芜湖红方包装股份有限公司 1.1MWP 屋顶光伏项目

2021 年 06 月

第 1 期

项目监理部 (章)

总监理工程师:



报告日期: 2021 年 06 月 30 日

常州正衡电力工程监理有限公司

监理月报

工程名称：芜湖红方包装股份有限公司 1.1MWp 屋顶光伏项目

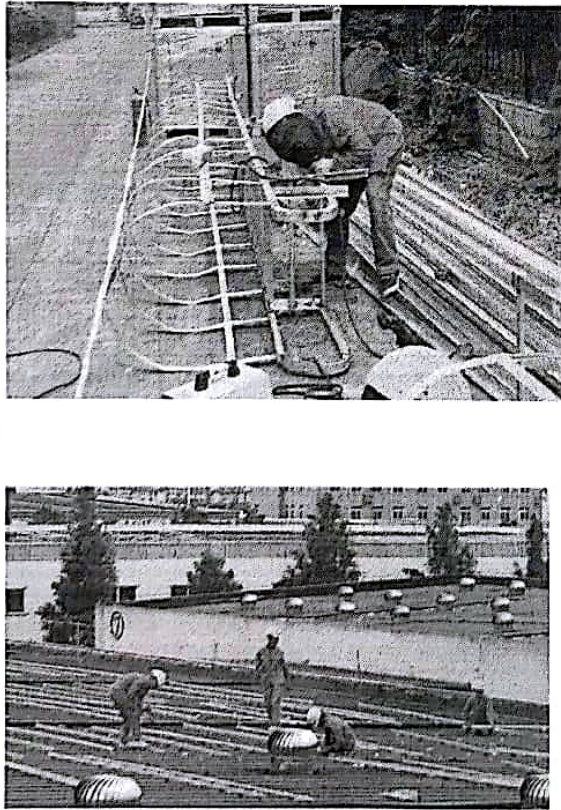
第 1 次月报开始时间：2021 年 06 月 10 日 截止日期：2021 年 06 月 30 日

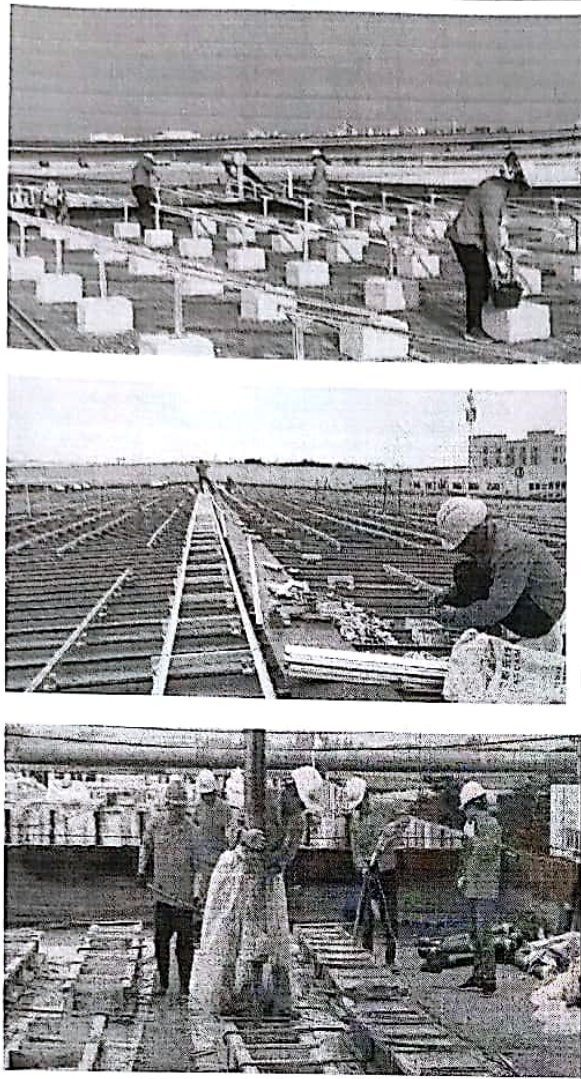
监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	芜湖红方包装股份有限公司 1.1MWp 屋顶光伏项目		施工照片	36	

二、监理重点工作情况

专 业	事 项	本月重点工作情况	下月重点工作 计划
进 度		本月红方彩钢屋面光伏支架安装全部完成，接地、检道、桥架在施工中，1#2#水泥屋面钢架支安装完成，3#屋面支架基础完成。	下月预计红方光伏组件安装完成并接线完成，所有光伏厂区施工验收完毕具备并网条件。

				
设备交付进度	本月光伏支架、组件、逆变器到货及时			
设计交付进度	施工电子版图纸交付；包括光伏区支架、组件安装电子版图纸交付。			
质量体系运作情况	承包单位素质比较差，分包单位素质比较好，总体运行良好	落实质量保证体系，并对运行情况进行检查		
施工图会审	根据现场实际调控			
设计交底	无			
方案审查	承包单位施工组织已审并整改中、措施不全	已发通知单督促施工单位报		

			审及其他资料
	技术交底	监理项目部主持召开了质量安全技术交底会议，承包单位签字	
	设计变更	暂无	
安全	安全培训情况	新进场施工人员已进行安全培训并考试	督促施工单位对进场员工进行安全教育
	安全交底情况	督促施工单位对危险作业点进行班前交底	继续督促施工单位进行班前交底
	安全措施落实情况	落实不彻底，专职安全员不能到位，已发通知单要求承包单位认真落实	监督施工单位认真落实安全措施
	安全文明施工情况	现场文明、安全施工措施实施到位	加强现场安全管理力度
质量	主要工序质量	对基础浇筑进行旁站	将对电缆线头安装制作进行旁站
	主要原材料质量	支架材料符合设计要求	对主要设备进行开箱检查
	构（配）件质量	进场材料质量合格	把控好进场材料质量关
	设备质量	符合设计要求	进行报验、开箱检查
	质量验评情况	工序施工符合要求，但过程资料无法同步，资料员完全门外汉	加强过程检查力度，加大工序报验抽查力度

			督促资料到位
投 资	资金情况	/	/
	款项支付情况	本月无资金批复	/
	预算外签证	无	/
合 同	合同签订情况	施工合同已签订	/
	合同执行情况	按合同执行	做好合同执行工作

三、本月进度情况

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	实际本月完成	本月实际完成（完成量/总量）	累计完成（完成量/总量）
1	基础浇筑	2021.06.03	2021.06.15	2021.06.22	100%	100%
2	支架安装	2021.06.09	2021.06.22	2021.06.30	80%	80%
3	组件安装	2021.06.23	2021.06.29	2021.06.30	0%	0%
4	桥架安装	2021.06.23	2021.06.30	2021.06.30	10%	10%
5	组串电缆	2021.06.23	2021.06.26	2021.06.30	0%	0%
6	接地安装	2021.06.23	2021.06.30	2021.06.30	10%	10%
7	电缆敷设	2021.06.27	2021.07.05	2021.06.30	0%	0%
8	逆变器安装	2021.07.01	2021.07.08	2021.06.30	0%	0%
9	配电柜安装	2021.06.29	2021.07.03	2021.06.30	0%	0%

四、下月进度计划

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	预计完成（完成量/总量）
1	支架安装	2021.07.01	2021.07.08	100%
2	组件安装	2021.07.12	2021.07.17	100%
3	桥架安装	2021.7.05	2021.07.10	100%
4	接地安装	2021.7.01	2021.07.07	100%
5	组串电缆	2021.7.11	2021.07.15	100%
6	逆变器安装	2021.7.18	2021.07.23	100%
7	配电柜安装电缆敷设	2021.07.26	2021.07.28	100%

五、安全文明施工情况

本月安全生产情况总体良好，承包单位安全意识淡薄，管理人

员经常不戴安全帽，现场缺少专职安全员，已发通知单要求到位，
分包单位素质比较好，工人佩戴安全帽正常，安全生产正常。

事故（起）			编制安全 策划文件 （份）	施工 人数	安全分包情况			
人身重伤	机械设备	电网事故			分包队 伍数量	分包队 伍人数	系统外包 队伍数量	系统外队 伍人数
无	无	无		12人	无	/	/	/

芜湖红方包装股份有限公司 1.1MWP 监理项目部



2021 年 06 月 30 日
