



正衡监理

编号: JLYB-03

监 理 月 报

芜湖红方/时代包装有限公司 1.1MWP 屋顶光伏项目

2021 年 08 月

第 3 期

项目监理部 (章):

总监理工程师:



报告日期: 2021 年 08 月 31 日

常州正衡电力工程监理有限公司

监理月报

工程名称: 芜湖红方包装股份有限公司/安徽时代创美包装有限公司 1.1MWp 屋顶
光伏项目

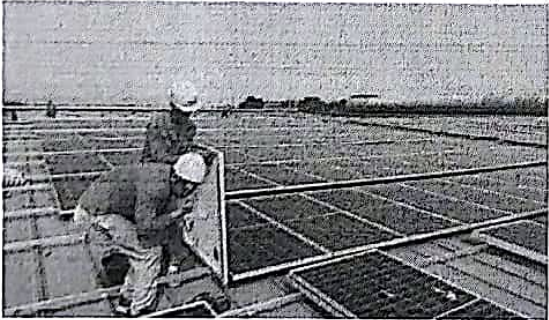
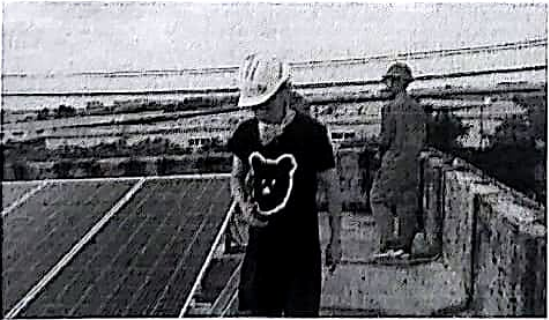
第 3 次月报开始时间: 2021 年 08 月 01 日 截止日期: 2021 年 08 月 31 日

监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	芜湖红方包装股份有限公司 1.1MWp 屋顶光伏项目		施工照片	45	
2	时代创美包装有限公司		施工照片	48	

二、监理重点工作情况

专 业	事 项	本月重点工作情况	下月重点工作 计划
进 度	 	本月红方/时代彩钢屋面光伏组件安装全部完成, 接地、检道、桥架基本完成, 逆变器安装完成, 电缆放线完成, 红方并网柜安装完成。 目前, 红方已具备并网条件, 时代即将具备并网条件。	下月预计红方/时代全部并网。

		
设备交付进度	调换组件已到货	
设计交付进度	施工电子版图纸交付； 设计图纸反复变更，没有蓝图。	
质量体系运作情况	质量能合格，总体运行	落实质量保证

		良好	体系, 并对运行情况 情况进行检查
	施工图会审	根据现场实际调控	
	设计交底	无	
	方案审查	承包单位施工组织已审 并整改中、措施已上报	已发通知单及 时报验施工过 程验收资料
	技术交底	监理项目部主持召开了 质量安全技术交底会 议, 承包单位签字	
	设计变更	暂无	
安 全	安全培训情况	新进场施工人员已进行 安全培训并考试	督促施工单位 对进场员工进 行安全教育
	安全交底情况	督促施工单位对危险作 业点进行班前交底	继续督促施工 单位进行班前 交底
	安全措施落实情况	落实不彻底, 专职 C 证 安全员不能到位, 已发 通知单要求承包单位认 真落实	监督施工单位 认真落实安全 措施
	安全文明施工情况	现场文明、安全施工措 施实施不能十分到位, 彩光部位不拉警示带, 有时工人不戴安全帽, 管理人员基本不戴安全 帽。	加强现场安全 管理力度
质 量	主要工序质量	施工质量一般, 部分已 要求及时整改	将对电缆线头 安装制作进行

			旁站
	主要原材料质量	支架材料符合设计要求	对主要设备进行开箱检查
	构（配）件质量	进场材料质量合格	把控好进场材料质量关
	设备质量	符合设计要求	进行报验、开箱检查
	质量验评情况	工序施工符合要求，但过程资料无法同步，资料员完全门外汉，组件安全前已通过建设单位验收	加强过程检查力度，加大工序报验抽查力度督促资料到位
投资	资金情况	/	/
	款项支付情况	本月无资金批复	/
	预算外签证	无	/
合同	合同签订情况	施工合同已签订	/
	合同执行情况	按合同执行	做好合同执行工作

三、本月进度情况

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	实际本月完成时间	本月实际完成（完成量/总量）	累计完成（完成量/总量）
1	支架安装	2021.06.09	2021.06.22	2021.06.30	100%	100%
2	组件安装	2021.06.23	2021.06.29	2021.07.24	100%	100%
3	桥架安装	2021.06.23	2021.06.30	2021.07.22	95%	95%
4	组串电缆	2021.06.23	2021.06.26	2021.07.30	100%	100%
5	接地安装	2021.06.23	2021.06.30	2021.07.30	95%	95%
6	电缆敷设	2021.06.27	2021.07.05		100%	100%
7	走道安装	2021.07.12	2021.07.17	2021.07.20	100%	100%
8	逆变器安装	2021.07.01	2021.07.08		100%	100%
9	并网柜安装	2021.06.29	2021.07.03		50%	50%

四、下月进度计划

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	预计完成（完成量/总量）
1	支架安装（调整）		2021.08.04	100%
2	组件安装		2021.08.06	100%
3	桥架安装		2021.08.07	100%
4	接地安装		2021.08.15	100%
5	组串电缆		2021.08.20	100%
6	逆变器安装		2021.08.25	100%
7	配电柜安装电缆敷设		2021.08.30	100%
8	并网发电		2021.09.10	100%

五、安全文明施工情况

本月安全生产情况总体良好，承包单位安全意识淡薄，管理人员经常不戴安全帽，现场缺少专职安全员，已发通知单要求到位，分包单位有时随意解开警示带，没有专职安全员管理是主要因素，工人佩戴安全帽正常，安全生产正常。

事故（起）			编制安全 策划文件 （份）	施工 人数	安全分包情况			
人身重伤	机械设备	电网事故			分包队 伍数量	分包队 伍人数	系统外包 队伍数量	系统外队 伍人数
无	无	无	3	10人	无	/	/	/

芜湖红方包装股份有限公司 1.1MWP 监理项目部

安徽时代创美包装有限公司 1.1MWP 监理项目部

2021 年 08 月 31 日
