

# 滁州和传物流机械有限公司 1.6MW 分布式光伏发电项目

## 监理单位月报 2021 年 1 期

|                                 |                                   |                               |           |                                  |
|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------|----------------------------------|
| 项目：滁州和传物流机械有限公司 1.6MW 分布式光伏发电项目 |                                   | 填报周期：2021 年 9 月 16 日—9 月 30 日 |           |                                  |
| 一、项目总体建设进度汇总：                   |                                   |                               |           |                                  |
| 1、班组建设（新进人员入场体检、安全交底培训）；        |                                   |                               |           |                                  |
| 2、导轨材料进场卸货；                     |                                   |                               |           |                                  |
| 3、组装夹具；                         |                                   |                               |           |                                  |
| 4、吊装导轨材料；                       |                                   |                               |           |                                  |
| 5、夹具安装；                         |                                   |                               |           |                                  |
| 6、导轨安装；                         |                                   |                               |           |                                  |
| 二、本月工程建设工作内容及完成情况               |                                   |                               |           |                                  |
| 1、支架及组件安装                       | 导轨完成 15%；<br>组件完成 0%<br>夹具完成 100% |                               |           |                                  |
| 2、逆变器及并网柜                       | 并网柜 0%；逆变器 0%。                    |                               |           |                                  |
| 3、现场调试                          | 完成 0%。                            |                               |           |                                  |
| 4、桥架、接地                         | 桥架 0%；接地 0%；                      |                               |           |                                  |
| 5、电缆敷设接线                        | 完成 0%                             |                               |           |                                  |
| 6、出图情况                          | 部分图纸。                             |                               |           |                                  |
| 0010、设备到货情况                     | 系统名称                              | 计划到货日期                        | 实际到货日期    | 本月到货情况，累计到货（），已到货数量（）% 延误原因及催货措施 |
|                                 | 导轨                                | 9 月 20 日                      | 9 月 20 日  | 到货 100%                          |
|                                 | 三角件                               | 10 月 10 日                     | 月 日       | 到货 0%                            |
|                                 | 电缆桥架                              | 9 月 30 日                      | 9 月 30 日  | 桥架到货 100%                        |
|                                 | 并网柜                               | 10 月 10 日                     | 月 日       | 到货 0%                            |
|                                 | 组件                                | 9 月 01 日                      | 12 月 29 日 | 到货 100%                          |



|                                |                                                                                                                                                                                                               |       |      |               |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|---------------|
|                                | 逆变器                                                                                                                                                                                                           | 10月9日 | 月 日  | 到货 0%         |
|                                | 电缆设备                                                                                                                                                                                                          | 10月9日 | 月 日  | 到货 0%         |
| 11、人员/机械情况                     | 本月施工人员 22 人，吊车 1 台，叉车 2 台。                                                                                                                                                                                    |       |      |               |
| 三、截止本月工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析： |                                                                                                                                                                                                               |       |      |               |
| 项目主节点                          | 计划日期                                                                                                                                                                                                          | 调整日期  | 完成日期 | 延误原因及赶工措施（简述） |
| 1、首套组件安装                       | 10月18日                                                                                                                                                                                                        | 月 日   | 月 日  |               |
| 2、全容量并网                        | 10月28日                                                                                                                                                                                                        | 月 日   | 月 日  |               |
| 四、主要协调问题及解决情况                  |                                                                                                                                                                                                               |       |      |               |
| 提出需要协调的问题                      | 1、现场为彩钢瓦屋面，无女儿墙，你单位未做临边防护，存在严重的安全隐患。<br>2、由于现场采光带区域较多，危险系数较大，存在严重安全隐患。<br>3、现场爬梯不牢固，存在严重安全隐患。<br>4、现场施工区域未见任何安全警示、提醒标示标语，无任何安全文明施工迹象，并且安全隐患较为严重。<br>5、导轨存在阳极氧化膜检测数值不符合规范要求，影响施工质量。<br>6、现场部分导轨壁厚不符合要求，影响施工质量。 |       |      |               |
| 未解决的协调问题解决进展                   | 1、截止目前未见做临边防护，存在严重的安全隐患。<br>2、由于现场采光带区域较多，未见铺安全挂网，存在严重安全隐患。<br>3、爬梯存在不牢固，存在严重安全隐患。<br>4、现场施工区域未见任何安全警示、提醒标示标语，无任何安全文明施工迹象，并且安全隐患较为严重。                                                                         |       |      |               |
| 五、下月计划主要工作内容                   |                                                                                                                                                                                                               |       |      |               |
| 1、安装组件                         | 安装完成 100%                                                                                                                                                                                                     |       |      |               |
| 2、安装桥架                         | 安装完成 100%                                                                                                                                                                                                     |       |      |               |
| 3、检修通道安装                       | 安装完成 100%                                                                                                                                                                                                     |       |      |               |
| 4、安装逆变器                        | 安装完成 100%                                                                                                                                                                                                     |       |      |               |
| 5、敷设线缆                         | 安装完成 100%                                                                                                                                                                                                     |       |      |               |
| 6、安装并网柜                        | 安装完成 100%                                                                                                                                                                                                     |       |      |               |
| 7、全容量并网                        | 安装完成 100%                                                                                                                                                                                                     |       |      |               |

填报人：刘春宇 审核人：唐剑 时间：2021年9月30日




工程现场照片




夹具组装



夹具安装

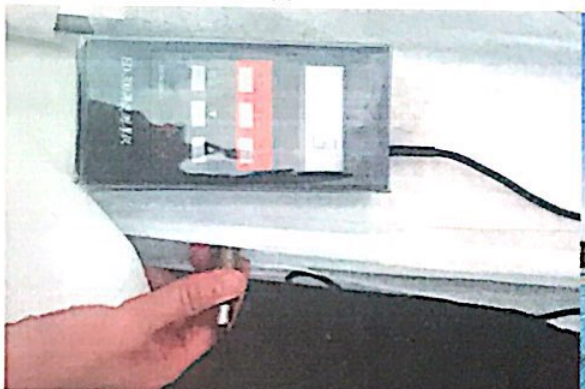

检测导轨材料

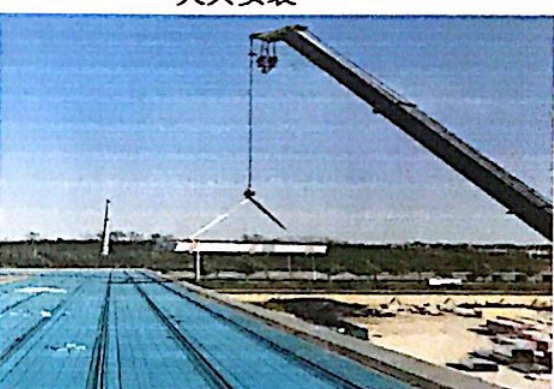

吊装导轨材料



复测导轨材料

做安全措施、做拉拔试验、夹具安装、组件卸货、导轨安装；

