

滁州和传物流机械有限公司 1.6MW 分布式光伏发电项目

监理单位月报 2021 年 3 期

项目：滁州和传物流机械有限公司 1.6MW 分布式光伏发电项目		填报周期：2021 年 11 月 1 日—11 月 30 日		
一、项目总体建设进度汇总： 1、班组建设（新进人员入场体检、安全交底培训）完成： 2、夹具、导轨安装完成： 3、组件安装完成： 4、并网柜安装完成： 5、桥架安装完成： 6、检修通道安装完成， 7、逆变器安装完成 8、光伏小线安装完成 9、接地扁铁安装完成 10、组件小黄线安装完成				
二、本月工程建设工作内容及完成情况				
1、支架及组件安装	导轨完成 100%： 组件完成 100% 夹具完成 100%			
2、逆变器及并网柜	并网柜 100%；逆变器 100%。			
3、现场调试	完成 100%。			
4、桥架、接地	桥架 100%；接地 100%；			
5、电缆敷设接线	完成 100%			
6、出图情况	部分图纸。			
0010、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本月到货情况，累计到货（），已到货数量（）%延误原因及催货措施
	导轨	9 月 20 日	9 月 20 日	到货 100%
	三角件	10 月 10 日	10 月 15 日	到货 100%
	电缆桥架	9 月 30 日	9 月 30 日	桥架到货 100%




	并网柜	10月10日	10月10日	到货100%
	组件	9月1日	9月1日	到货100%
	逆变器	10月9日	10月9日	到货100%
	电缆设备	10月9日	10月28日	到货100%
11、人员/机械情况		本月施工人员22人，吊车1台，叉车2台。		
三、截止本月工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首套组件安装	10月18日	月 日	月 日	/
2、全容量并网	10月28日	11月15日	11月19日	
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题	1、现场为彩钢瓦屋面，无女儿墙，你单位未做临边防护，存在严重的安全隐患。 2、由于现场采光带区域较多，危险系数较大，存在严重安全隐患。 3、现场爬梯不牢固，存在严重安全隐患。 4、现场施工区域未见任何安全警示、提醒标示标语，无任何安全文明施工迹象，并且安全隐患较为严重。 5、导轨存在阳极氧化膜检测数值不符合规范要求，影响施工质量。 6、现场部分导轨壁厚不符合要求，影响施工质量。			
未解决的协调问题 解决进展	1、截止目前未见做临边防护，存在严重的安全隐患。 2、由于现场采光带区域较多，未见铺安全挂网，存在严重安全隐患。 3、爬梯存在不牢固，存在严重安全隐患。 4、现场施工区域未见任何安全警示、提醒标示标语，无任何安全文明施工迹象，并且安全隐患较为严重。			
五、下月计划主要工作内容				
1、安装组件	安装完成100%			
2、安装桥架	安装完成100%			
3、检修通道安装	安装完成100%			
4、安装逆变器	安装完成100%			
5、敷设线缆	安装完成100%			



6、安装并网柜	安装完成 100%
7、全容量并网	安装完成 100%

填报人： 唐剑 审核人： 唐剑 时间： 2021 年 11 月 30 日

工程现场照片

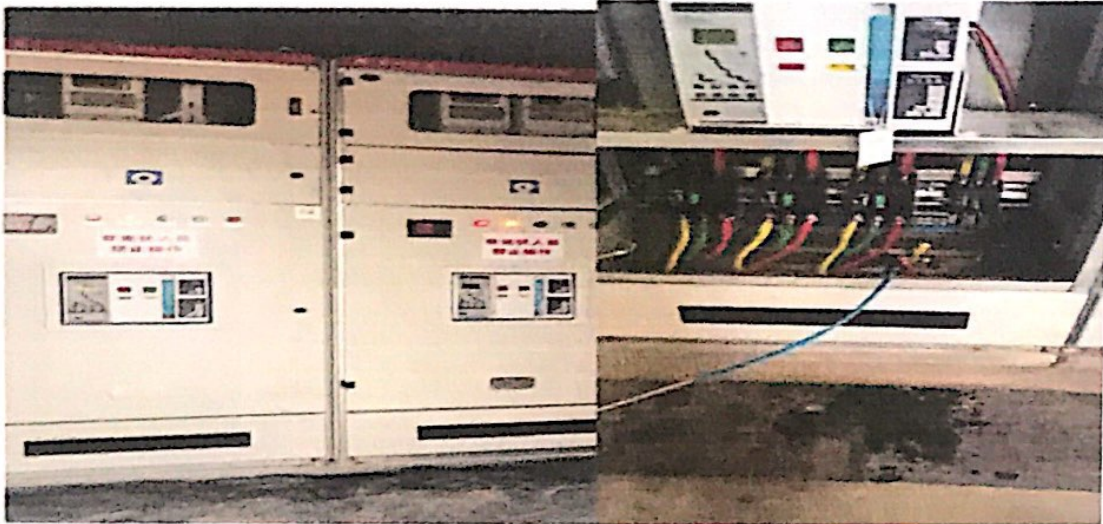

并网发电

并网柜电缆头制作

