



正衡监理

编号: JLYB-01

监 理 月 报

镁联科技（芜湖）有限公司 600KWP 屋顶光伏项目

2021 年 10 月

第 1 期

项目监理部（章）:

总监理工程师:



报告日期: 2021 年 10 月 31 日

常州正衡电力工程监理有限公司

镁联科技（芜湖）有限公司屋顶光伏发电项目部

监理月报

工程名称：镁联科技（芜湖）有限公司 600KWP 屋顶光伏项目

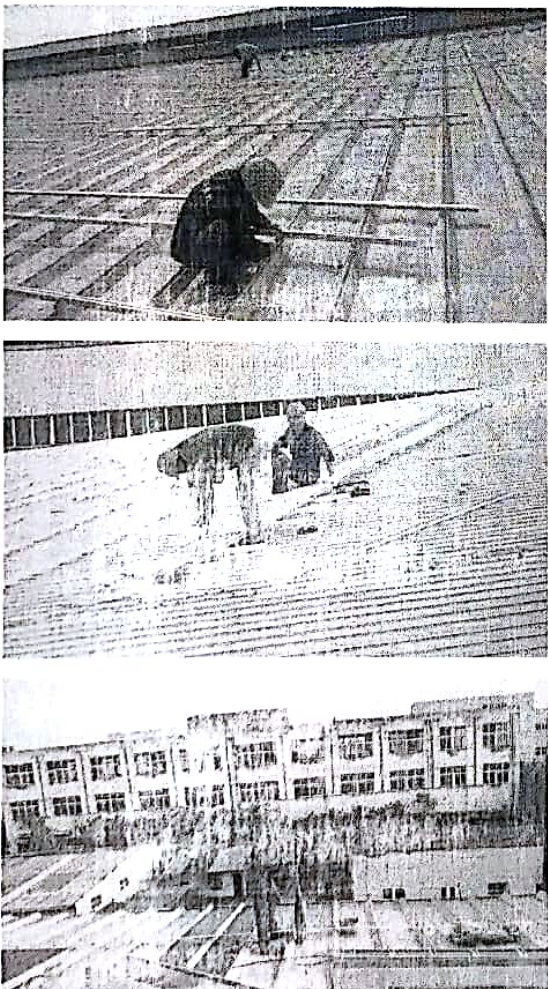
月报开始时间：2021 年 09 月 22 日 截止日期：2021 年 10 月 31 日


监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司


一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	镁联科技（芜湖）有限公司 600KWP 屋顶光伏项目		施工照片	45	

二、监理重点工作情况

专 业	事 项	本月重点工作情况	下月重点工作 计划
进 度		本月屋面光伏组件安装全部完成，接地、检道、桥架基本完成，逆变器、并网柜安装完成，电缆接线完成，已基本具备并网条件。	下月并网。



	 		
	设备交付情况	所有设备到货	
	设计交付情况	施工图纸交付；设计蓝图全面。	
	质量体系运行情况	质量能合格，总体运行良好	落实质量保证体系，并对运行情况进行检查
	施工图审查	根据现场实际调控	
	设计交底	无	
	方案审查	承包单位施工组织未上报	已发通知单及时报验施工前期及过程验收资料
	技术交底	监理项目部主持召开了质量安全技术交底会议，承包单位签字	
	设计变更	暂无	

安全	安全培训情况	新进场施工人员已进行安全培训并考试	督促施工单位对进场员工进行安全教育
	安全交底情况	督促施工单位对危险作业点进行班前交底	继续督促施工单位进行班前交底
	安全措施落实情况	落实不彻底，专职 C 证安全员不能到位，已发通知单要求承包单位认真落实	监督施工单位认真落实安全措施
	安全文明施工情况	现场文明、安全施工措施实施不能到位，彩光部位拉警示带，工人佩戴安全帽正常。	继续加强现场安全管理力度
质量	主要工序质量	施工质量良好，部分已要求及时整改	将对电缆线头安装制作进行旁站
	主要原材料质量	支架材料符合设计要求	对主要设备进行开箱检查
	构（配）件质量	进场材料质量合格	把控好进场材料质量关
	设备质量	符合设计要求	进行报验、开箱检查
	质量验评情况	工序施工符合要求，但过程资料无法同步，资料员没在现场，组件安全后已通过建设单位验收	加强过程检查力度，加大工序报验抽查力度督促资料到位
投	资金情况	/	/

资	款项支付情况	本月无资金批复	/
	预算外签证	无	/
合 同	合同签订情况	施工合同已签订	/
	合同执行情况	按合同执行	做好合同执行工作

三、本月进度情况

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	实际本月完成时间	本月实际完成（完成量/总量）	累计完成（完成量/总量）
1	支架安装	2021.09.22	2021.09.30	2021.10.18	100%	100%
2	组件安装	2021.09.30	2021.10.04	2021.10.27	100%	100%
3	桥架安装	2021.10.01	2021.10.03	2021.10.20	100%	100%
4	组串电缆	2021.10.04	2021.10.06	2021.10.22	100%	100%
5	接地安装	2021.10.01	2021.10.15	2021.10.29	95%	95%
6	交流电缆敷设	2021.10.07	2021.10.10	2021.10.24	100%	100%
7	走道安装	2021.10.03	2021.10.05	2021.10.22	100%	100%
8	逆变器安装	2021.10.10	2021.10.13	2021.10.28	100%	100%
9	并网柜安装	2021.10.10	2021.10.14	2021.10.29	100%	100%

四、下月进度计划

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	预计完成（完成量/总量）
1	支架安装（调整）			已100%
2	组件安装			已100%
3	桥架安装			已100%
4	接地安装			已100%
5	组串电缆			已100%
6	逆变器安装			已100%
7	配电柜安装电缆敷设			已100%
8	并网发电	2021.11.10	2021.11.02	预计

五、安全文明施工情况

本月安全生产情况总体良好，现场缺少专职安全员在现场，工人佩戴安全帽基本正常，安全生产正常。

事故（起）			编制安全 策划文件 （份）	施工 人数	安全分包情况			
人身重伤	机械设备	电网事故			分包队 伍数量	分包队 伍人数	系统外包 队伍数量	系统外队 伍人数
无	无	无	无	6人	无	/	/	/

镁联科技（芜湖）有限公司 600KWP 光伏监理项目部

2021 年 10 月 31 日
