



编号: ZHJL-GK-YB-004

监 理 月 报

工程名称: 沐阳国凯新能源有限公司新建 10.1556MWp 屋顶分
布式光伏发电项目

2021 年 12 月

项目监理部(章):

总监理工程师: 夏新华

日期: 2021 年 12 月 31 号

监 理 月 报

开始时间 2021 年 12 月 1 日 结束日期 2021 年 12 月 31 日

一、 监理重点工作情况

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度	主要工作	1、组件安装检查，组串接线检查。 2、桥架安装，直流、交流电缆放线。 3、逆变器安装，接地扁铁连接。	1、消缺整改。
	设备交付进度	支架已到场、组件到场、电缆全部到场，逆变器到场。	督促施工方尽快完成消缺
	设计交付进度	图纸完成	最终图纸移交
	质量体系运作情况	质量体系健全，运行良好	落实质量保证体系，并对运行情况进行检查
	施工图会审	完成	
	设计交底	完成	
	方案审查	资料正在审查	审查过程资料
	技术交底	完成	
	设计变更	目前现场先按图纸施工	若有变更及时解决
安全	安全培训情况	进场员工已进行安全培训	督促施工单位对进场新员工进行安全教育，安全文明施工加强。
	安全交底情况	督促施工单位对危险作业点进行班前交底	继续督促施工单位进行班前交底
	安全措施落实情况	场地安装及用电安全都已落实	吊装、防火、带电设备安全警示
	安全文明施工情况	现场安全、文明措施良好	加强现场安全管理力度
质量	主要工序质量	现阶段，要求质量严格按照业主要求监管。	强制性质量问题绝不放过
	主要原材料	主要材料进行质量检查	把控好材料进场质量问题

	质量		
	构（配）件质量	把控好进场材料质量关	严抓构配件质量问题
	设备质量	按照要求进行质量验收	查看进场设备合格证书
	质量验评情况	将不符合设计要求的地方，要求施工方进行整改，然后进行一次验收。	施工方整改后，进行二次验收。

二、本月进度情况

- 1、屋面组件安装完成，直流放线完成；屋面组件安装完成，直流、交流放线完成。
- 2、逆变器安装完成，逆变器电缆接线完成，并网柜接线完成。
- 3、桥架安装，直流电缆放线完成，运维走道安装完成；交流电缆敷设接线完成。
- 4、供电局验收通过，电表安装完成，并网发电。

三、下月进度计划

- 1、并网完成，消缺整改。
- 2、资料签字盖章移交。

四、安全文明施工情况


事故（起）			编制安全策	施工	施工单位
人身重伤	机械设备	电网事故	划文件（份）	人数	数量
无	无	无	1 份	8 人	1
施工安全 文明交底	每日班前 会已交代	施工现场文明施工情况		良好	

五、施工重点工作情况


专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	支架、组件安装	屋面全部完成，整改消缺
安全管理	施工人员安全帽佩戴，反光服穿着， 吊装安全管理，现场防火措施齐全。	安全吊装、屋面临时用电安全，动火作业等。
质量管理	发现有质量问题并要求施工方整改	发现有质量问题并要求施工方整改，整改完成后，进行查验。
技术管理	参与过程中重要（关键）环节的施 工技术交底会，监督检查执行情况。	检查现场施工质量
物资供应	督促施工单位进行	

附图

直流线缆套管

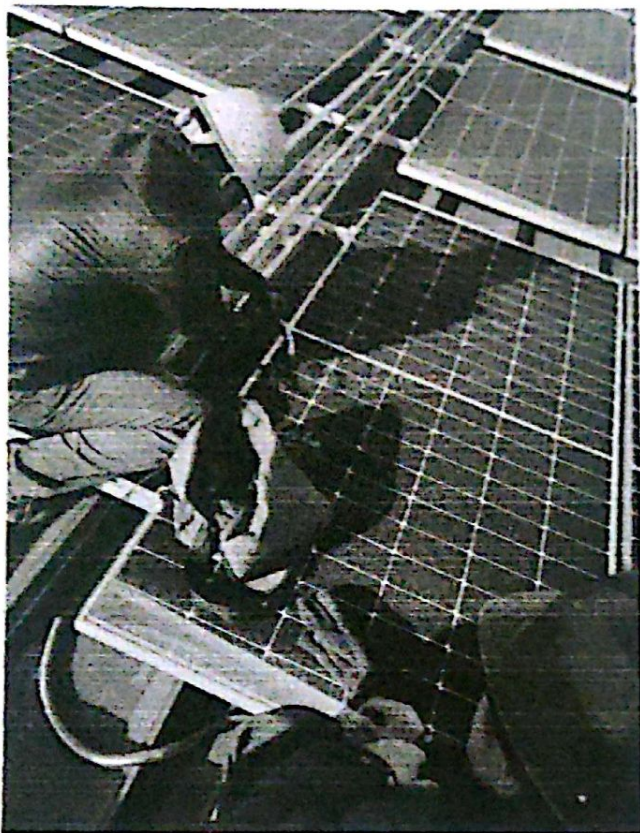

运维走道安装

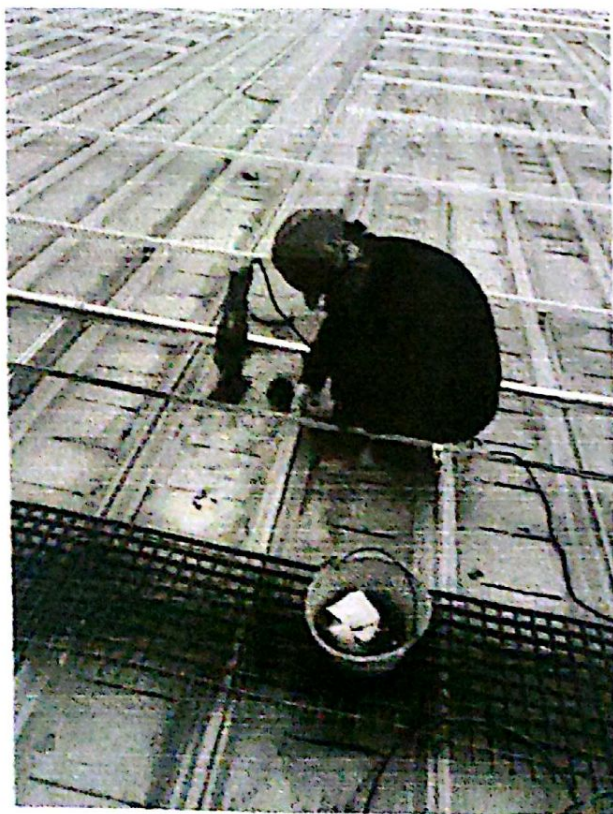

接地扁铁主体连接



逆变器处直流线套管

