

编号：SKQN-ZDTQGF02-JLYB-001

监 理 月 报

工程名称：正大天晴 0.8MW 工商业分布式光伏发电项目

2021 年 10 月 第 01 期

监理项目部（章）：_____

总监理工程师：李俊平_____




报告日期：2021 年 10 月 31 日

监理月报

1. 本月工程实施情况（形象进度表、照片）

- 1) 建设单位组织各方在项目地点正大天晴药业公司 209 会议室组织进行工地开工动员会，并查看现场；
- 2) 建设单位现场负责人吴见喜组织天晴厂、监理、施工方进行项目协调会，并查看现场；
- 3) 设计、施工、监理现场勘察场地；
- 4) 项目部组件和配套设施落实；
- 5) 场外组件支架配重块开始预制，共三种型号配重块；
- 6) 屋面施工前的各项准备工作，报审相关技术方案、安全培训考试等工作；
- 7) 组件全部到场，共 1566 块；施工场地屋面综合制剂车间开始测量放线；

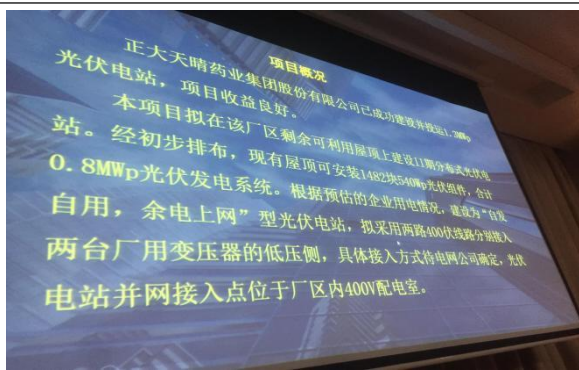

2. 本月监理工作情况（质量、安全、进度、投资、合同）

- 1) 参加建设单位组织的开工动员会、协调会及查看现场；
- 2) 下发两份关于进度的联系单、一份关于配重块浇筑质量的整改通知单（已整改）；
- 3) 参加天晴厂安全生产部的安全培训和安全考试，监督施工单位安全培训交底；
- 4) 审核施工单位施工吊装方案；
- 5) 组织召开监理例会，汇报上周工作，本周工作计划；
- 6) 组件进场检查；
- 7) 监理进场资料准备完成；
- 8) 检查旁站场外预制配重块、平行检查进场 U 型螺栓材料、开箱检查进场组件；
- 9) 见证取样配重块砼养件送检；
- 10) 检查特种机械操作人员证件；
- 11) 复验综合制剂车间放线情况。

3. 工程存在问题及建议

配重块拆模后因振捣不实出现个别离析、蜂窝、气孔现象，下发一份监理通知单要求按工艺规范要求整改，整改基本符合要求。

4. 下月监理工作重点

- 1) 审查施工单位施工方案；
- 2) 旁站配重块、支架及组件吊装、电缆头制作、电气调试试验；平行检查配重块就位、支架安装、组件安装、电缆敷设等工作；进场材料/构配件/设备平行检验、开箱检查；
- 3) 检查验收施工单位基础定位放线、支架安装、组件安装工序质量；
- 4) 检查施工单位现场施工进度与进度计划完成情况；
- 5) 日常巡视检查及验收施工单位各分项工程施工质量、安全施工情况。

常州正衡电力工程监理有限公司

正大天晴 0.8MW 工商业分布式光伏发电项目

2021 年 10 月 31 日
