



编号：ZHJL-YB-2022-01-25

监 理 月 报

工程名称：承德滦平县光伏加电取暖改造工程

60MW 屋顶分布式光伏发电项目

2022 年 01 月 第 04 期

项目监理部（章）：

总监理工程师：徐耀生

报 告 日 期：2022 年 01 月 25 日

监 理 月 报

工程名称：承德滦平县光伏加电取暖改造工程 60MW 屋顶分布式光伏发电项目 月 次 第 4 次

月报开始时间 2022 年 01 月 01 日

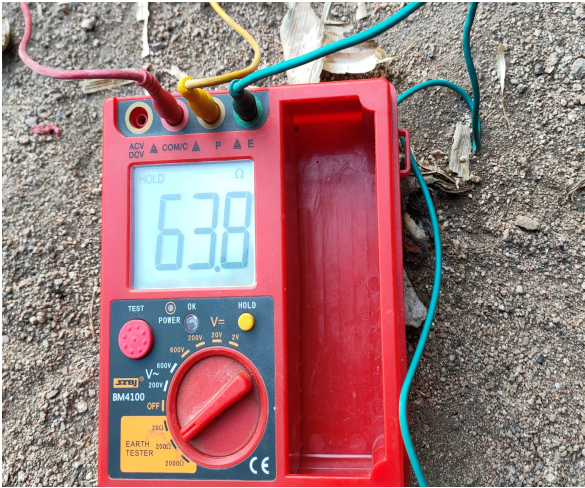
结束日期 2022 年 01 月 25 日

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

建设单位：润沐（滦平）新能源发展有限公司		资料类型	资料数量	备注
施工单位：河北舒阳新能源科技有限公司		影像	5	/
专业	形象进度照片	本月重点工作情况		下月重点工作计划

进度	滦平县大屯镇逆变器并网箱安装		滦平县大屯镇逆变器、并网箱累计安装完成 56 户。	已经安装完成的 120 户全额并网发电。
				
				
	继续加大虎什哈镇和大屯镇的确户力度，同时辐射周边乡镇的农户。			

滦平县虎什哈镇逆变器并网箱安装   防雷接地电阻测试不符合设计要求 		
设备交付进度	光伏组件累计到场 26.07892MW； 逆变器到场 1200 台。	并网箱、电表箱、交流电缆。

	设计交付进度	未见施工蓝图	提供正式施工蓝图
	质量体系运作情况	较差	落实质量保证体系，并对运行情况进行检查。
	施工图会审	无	进行图纸会审
	设计交底	无	进行设计交底
	方案审查	施工组织设计已经审批	报验各项方案
	技术交底	已经对支架 组件安装人员进行交底。	对施工人员进行电气施工安全技术交底。
	设计变更	无	/
安全	安全培训情况	新进场员工已进行安全培训	对新进场员工已进行安全培训
	安全交底情况	督促施工单位对危险作业点进行班前交底	落实 施工班前安全交底会议
	安全措施落实情况	落实不彻底，已要求施工单位认真落实。	严格按照安全文明施工条例执行。
	安全文明施工情况	较差 习惯性违章较多	严格杜绝习惯性违章
质量	主要工序质量	防雷接地电阻测试结果不符合设计要求	增加接地极
	主要原材料质量	乙方采购材料未报验。	严格按照设计图纸要求，进行采购。
	构（配）件质量	甲供材料检验合格	严格按照设计图纸要求，进行采购。
	设备质量	逆变器检验合格	严格按照设计图纸要求，进行采购
	质量验评情况	安装完成的支架、组件符合设计要求，验评结果合格。	施工资料必须与工程同步
投资	资金情况	无	按照合同条款进行
	款项支付情况	无支付	按照合同条款进行支付
	预算外签证	无	/
合同	合同签订情况	已经签订施工合同	提供施工合同
	合同执行情况	无	严格按照合同条款执行

二、本月进度情况

序号	任 务 名 称	计划开始 时 间	计划结束 时 间	施工开始 日 期	施工结束 日 期	本月实际 完成(完成 量/计划总 量)	累计完成 (完成量 / 计划总 量)	备注
1	虎什哈 镇逆变器并 网箱安装	2022.01.01	2022.01.31	2022.01.01	2022.01.20	实际安装 完成 64 户	未并网 发电	
2	大屯镇 逆变器并 网箱安装	2022.01.01	2022.01.31	2022.01.01	2022.01.25	实际安装 56 户	未并网 发电	

三、下月进度计划

序号	任 务 名 称	计划开始 时 间	计划结束 时 间	施工开始 日 期	施工结束 日 期	下月计划 完成(完成 量/总量)	本月实际 完成(完成 量/总量)	权值
1	虎什哈 镇并网 121 户	2022.02.10	2022.02.28					
2	大屯镇 并网 87 户	2022.02.10	2022.02.28					

四、安全文明施工情况

事故（起）			编制安全策 划文件(份)	施工 人数	安全分包情况			
人身 重伤	机械 设备	电网 事故			逆变器 安装队 伍数量	分包队 伍人数	系统外包队 伍数量	系统外队伍人数
无	无	无	无	20 人	8	/	无	/

hu 五、施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	督促施工单位优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性。	合理安排施工人员进场施工，具备验收条件的农户进行验收，及时并网发电。
安全管理	督促施工单位报审《安全应急预案》，安全监理工程师要定期对现场进行安全检查；对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。	实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正，屡教不改者下发工程考核单；对待疫情要进行常态化管理，严禁高中风险地区人员到场施工。
质量管理	组件到场进行开箱检查；支架底座膨胀螺栓拉拔试验进行旁站；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。	督促施工单位按照施工工艺和设计要求及规范要求施工。
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。	参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，监督检查执行情况。
造价管理	对施工单位申请的工程款及时进行评审	对工程量实施计量，及时审核施工项目部报送的工程量清单、进度款支付申请。
物资供应	协助建设单位做好建设物资进场工作，督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。	交流电缆、电表箱及时到场。
