



编号：ZHJL-YB-2022-02-28

监 理 月 报

工程名称：承德滦平县光伏加电取暖改造工程

60MW 屋顶分布式光伏发电项目

2022 年 02 月 第 05 期

项目监理部（章）：

总监理工程师：徐耀生

报 告 日 期：2022 年 02 月 28 日

监 理 月 报

工程名称：承德滦平县光伏加电取暖改造工程 60MW 屋顶分布式光伏发电项目 月 次 第 5 次

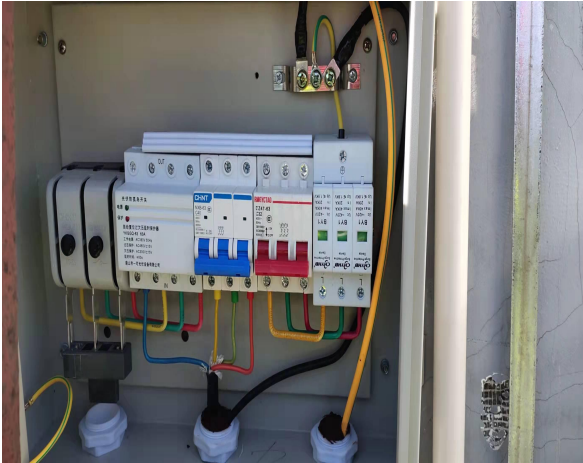
月报开始时间 2022 年 02 月 16 日

结束日期 2022 年 02 月 28 日

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

建设单位：润沐（滦平）新能源发展有限公司		资料类型	资料数量	备注
施工单位：河北舒阳新能源科技有限公司		影像	2	/
专业	形象进度照片	本月重点工作情况		下月重点工作计划

进度	滦平县虎什哈镇逆变器并网箱安装 	滦平县虎什哈镇逆变器、并网箱安装完成 7 户，累计安装完成 71 户。	已经安装完成的 127 户全额并网发电。 继续加大虎什哈镇和大屯镇的确户力度，同时辐射周边乡镇的农户。
			

	设备交付进度	/	并网箱、电表箱、交流电缆。
	设计交付进度	未见施工蓝图	提供正式施工蓝图
	质量体系运作情况	较差	严禁以包代管
	施工图会审	无	进行图纸会审
	设计交底	无	进行设计交底
	方案审查	施工组织设计已经审批	报验各项方案
	技术交底	已经对支架 组件安装人员进行交底。	对施工人员进行电气施工安全技术交底。
	设计变更	无	/
安全	安全培训情况	新进场员工已进行安全培训	对新进场员工已进行安全培训
	安全交底情况	督促施工单位对危险作业点进行班前交底	落实 施工班前安全交底会议
	安全措施落实情况	落实不彻底，已要求施工单位认真落实。	严格按照安全文明施工条例执行。
	安全文明施工情况	较差 习惯性违章较多	严格杜绝习惯性违章
质量	主要工序质量	防雷接地电阻测试结果不符合设计要求	增加接地极
	主要原材料质量	乙方采购材料未报验。	严格按照设计图纸要求，进行采购。
	构（配）件质量	甲供材料检验合格	严格按照设计图纸要求，进行采购。
	设备质量	逆变器检验合格	严格按照设计图纸要求，进行采购
	质量验评情况	/	施工资料必须与工程同步
投资	资金情况	无	按照合同条款进行执行
	款项支付情况	无支付	按照合同条款进行支付
	预算外签证	无	/
合同	合同签订情况	已经签订施工合同	提供施工合同
	合同执行情况	无	严格按照合同条款执行

二、本月进度情况

序号	任 务 名 称	计划开始 时 间	计划结束 时 间	施工开始 日 期	施工结束 日 期	本月实际 完成(完成 量/计划总 量)	累计完成 (完成量 / 计划总 量)	备注
1	虎什哈 镇逆变器并 网箱安装	2022.02.10	2022.02.28	2022.02.23	2022.02.28	实际安装 完成7户, 累计安装 71户。	未并网 发电	
2	大屯镇 逆变器并 网箱安 装	2022.02.10	2022.02.28	/	/	本月未施 工,累计安 装56户。	未并网 发电	

三、下月进度计划

序号	任 务 名 称	计划开始 时 间	计划结束 时 间	施工开始 日 期	施工结束 日 期	下月计划 完成(完成 量/总量)	本月实际 完成(完成 量/总量)	权值
1	虎什哈 镇并网 121户	2022.03.01	2022.03.31					
2	大屯镇 并网87 户	2022.03.01	2022.03.31					

四、安全文明施工情况

事故(起)			编制安全策 划文件(份)	施工 人数	安全分包情况			
人身 重伤	机械 设备	电网 事故			逆变器 安装队 伍数量	分包队 伍人数	系统外包队 伍数量	系统外队伍人数
无	无	无	无	2人	1	/	无	/

五、施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	督促施工单位优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性。	合理安排施工人员进场施工，具备验收条件的农户进行验收，及时并网发电。
安全管理	督促施工单位报审《安全应急预案》，安全监理工程师要定期对现场进行安全检查；对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。	实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正，屡教不改者下发工程考核单；对待疫情要进行常态化管理，严禁高中风险地区人员到场施工。
质量管理	组件到场进行开箱检查；支架底座膨胀螺栓拉拔试验进行旁站；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。	督促施工单位按照施工工艺和设计要求及规范要求施工。
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。	参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，监督检查执行情况。
造价管理	对施工单位申请的工程款及时进行评审	对工程量实施计量，及时审核施工项目部报送的工程量清单、进度款支付申请。
物资供应	协助建设单位做好建设物资进场工作，督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。	交流电缆、电表箱及时到场。
