



编号：ZHJL-YB-2022-07-30

监 理 月 报

工程名称：承德滦平县光伏加电取暖改造工程

60MW 屋顶分布式光伏发电项目

2022 年 07 月 第 10 期

项目监理部（章）：

总监理工程师：徐耀生

报 告 日 期：2022 年 07 月 30 日

监 理 月 报

工程名称：承德滦平县光伏加电取暖改造工程 60MW 屋顶分布式光伏发电项目 月 次 第 10 次

月报开始时间 2022 年 07 月 01 日

结束日期 2022 年 07 月 30 日

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

一、监理工作重点

建设单位：润沐（滦平）新能源发展有限公司			
监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司			
施工单位：河北舒阳新能源科技有限公司			
专业	事 项	本 月 重 点 工 作 情 况	下 月 重 点 工 作 计 划
协调	组织、参加工作	1. 主持召开 2 次监理例会(腾讯会议)； 2. 大屯镇户用电站并网发电 14 户，监理人员全程跟踪旁站； 3. 编写下发 2 份户用电站质量问题整改单； 4. 大屯镇户用电站送电 14 户（7 个并网点）并网发电容量为 164.175kW； 5. 存放光伏组件的露天仓库巡视检查，监控设备运行正常，1 名看护人员在岗。	1. 解决疑难户问题； 2. 按照监理项目部下发的户用电站质量问题整改单的内容进行整改； 3. 存放光伏组件的露天仓库巡视检查； 4. 剩余户用电站并网发电； 5. 报验施工过程资料。
进度	质量体系运作情况	无人施工	严禁以包代管
	技术交底	无人施工	剩余户用电站并网发电
	方案审查	无	报验光伏设备安装工程的质量检验评定表。
	设备交付进度	无	无
	施工图会审	无	/
	设计交底	无	/
	设计交付进度	无	提供正式施工蓝图
	设计变更	无	/
安全	安全交底情况	无人施工	落实 施工班前安全交底会议
	安全措施落实情况	无人施工	严格按照安全文明施工条例执行。
	安全文明施工情况	无人施工	严格杜绝习惯性违章

	安全交底情况	无人施工	落实 施工班前安全交底会议
质量	主要工序质量	无人施工	按照整改单，逐条整改。
	主要原材料质量	无	严格按照设计图纸要求，进行采购。
	构（配）件质量	甲供材料检验合格	严格按照设计图纸要求，进行采购。
	设备质量	逆变器检验合格	严格按照设计图纸要求，进行采购
	质量验评情况	光伏支架、组件安装合格，防雷接地焊接质量不合格，防腐不规范，防火封堵不合格。	按照整改单，逐条整改。
投资	资金情况	无	按照合同条款进执行
	款项支付情况	无支付	按照合同条款进行支付
合同	合同签订情况	已经签订施工合同	提供施工合同
	合同执行情况	无	严格按照合同条款执行

二、安全文明施工情况

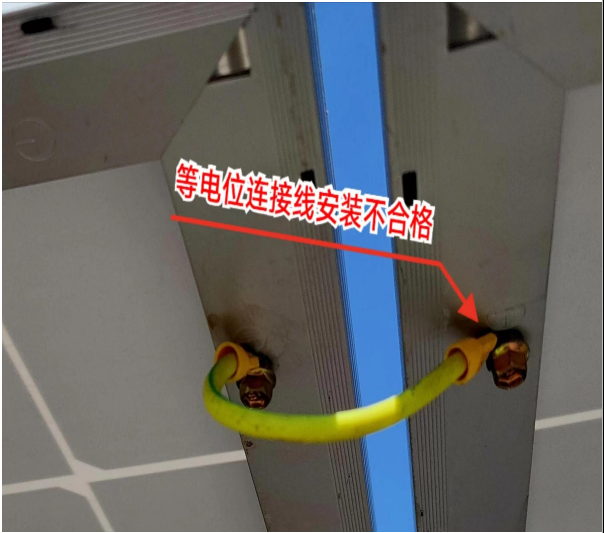
事故（起）			编制安全策划文件（份）	施工人数	施工单位数量
人身重伤	机械设备	电网事故			
无	无	无	无	现场 1 名管理人员	无

三、施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	无人施工	合理安排施工人员进场整改，具备验收条件的户用电站进行验收，及时并网发电。
安全管理	无人施工	实施安全监理，对待疫情要进行常态化管理，严禁高中风险地区人员到场施工。
质量管理	无人施工	督促施工单位按照施工工艺和设计要求及规范要求施工。
技术管理	无人施工	参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，监督检查执行情况。
造价管理	无	对工程量实施计量，及时审核施工项目部报送的工程量清单、进度款支付申请。

物资供应	无	存放组件的露天仓库增加防雨措施，增加消防设施，设专人 24 小时进行看护，并填写巡视记录。
------	---	---

四、附图

文字描述	虎什哈镇户用电站巡检	大屯镇户用电站巡检
照片		
文字描述	大屯镇户用电站并网发电	存放光伏组件的仓库巡视检查
照片		
