

飞荣达科技（江苏）有限公司 4.78MW 分布式光伏发电项目（一期）


监理单位月报 2021 年 1 期

项目：飞荣达科技（江苏）有限公司 4.78MW 分布式光伏发电项目（一期）		填报周期：2021 年 11 月 18 日—11 月 30 日		
一、项目总体建设进度汇总：				
1、班组建设（新进人员入场体检、安全交底培训）；				
2、导轨材料进场卸货；				
3、水泥基础进场卸货；				
4、吊装水泥基础；				
5、吊装支架材料；				
6、支架安装，				
二、本月工程建设工作内容及完成情况				
1、支架及组件安装	支架完成 50%； 组件完成 0% 水泥基础完成 70%			
2、逆变器及并网柜	并网柜 0%；逆变器 0%。			
3、现场调试	完成 0%。			
4、桥架、接地	桥架 0%；接地 0%；			
5、电缆敷设接线	完成 0%			
6、出图情况	部分图纸。			
0010、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本月到货情况，累计到货（），已到货数量（）%延误原因及催货措施
	导轨	11 月 16 日	11 月 18 日	到货 70%
	三角件	11 月 16 日	11 月 18 日	到货 70%
	电缆桥架	12 月 3 日	月 日	桥架到货 0%
	并网柜	12 月 15 日	月 日	到货 0%
	组件	12 月 1 日	月 日	到货 0%

	逆变器	11月18日	11月20	到货50%
	电缆设备	12月12日	月 日	到货0%
11、人员/机械情况 本月施工人员22人，吊车1台，叉车2台。				
三、截止本月工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首套组件安装	12月08日	月 日	月 日	
2、全容量并网	12月30日	月 日	月 日	
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题	1、现场施工区域未见任何安全警示、提醒标示标语，无任何安全文明施工迹象。 2、部分三角件及支架出现锈蚀、镀锌层掉落，不符合设计及规范要求。 3、支架紧固件镀锌层氧化严重，影响施工质量。 4、部分水泥基础破损，影响施工质量。 5、至今为止已开工数日至今未见施工图纸及报审资料。 6、检测发现三角件存在镀锌层不符合规范要求，影响工程质量。 7、吊装水泥基础所用托盘为木质并且固定不牢固，存在严重安全隐患。 8、支架安装存在扭曲，不符合要求。 9、现场个别施工人员未带安全帽，存在安全隐患。			
未解决的协调问题 解决进展				
五、下月计划主要工作内容				
1、安装组件	安装完成100%			
2、安装桥架	安装完成100%			
3、检修通道安装	安装完成100%			
4、安装逆变器	安装完成100%			
5、敷设线缆	安装完成100%			
6、安装并网柜	安装完成100%			
7、全容量并网	安装完成100%			

 填报人： 刘春宇 审核人： 刘春宇 时间： 2021年11月30日

工程现场照片

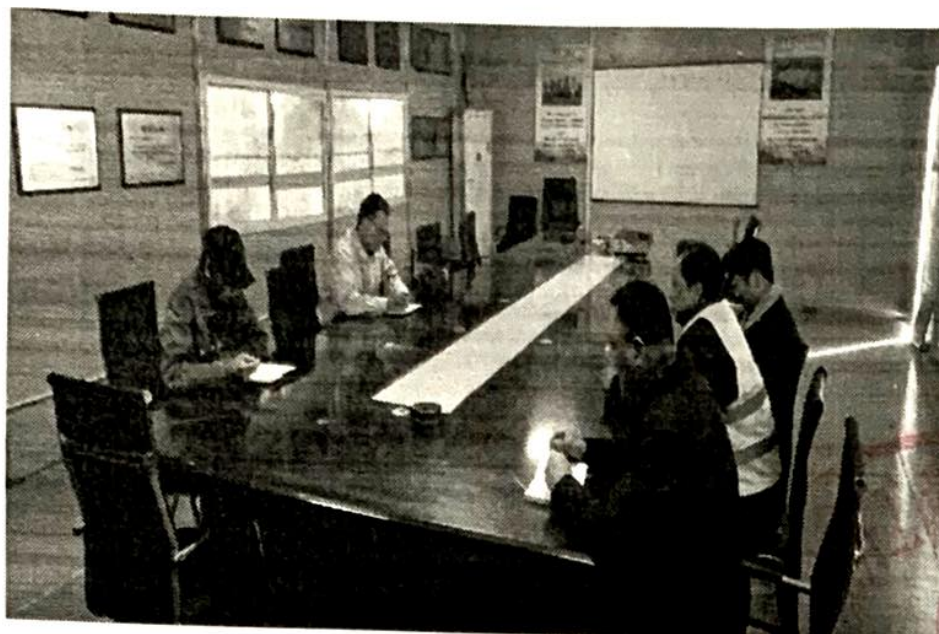


监理例会




分摊水泥基础



支架安装



吊装水泥基础



吊装旁站



水泥基础到货

做安全措施、做拉拔试验、夹具安装、组件卸货、导轨安装；
