

安徽宿州 120MWp 户用分布式光伏发电项目

项目监理月报

(第三期)

2022-03-25-2022-04-25



安徽宿州 120MWp 户用分布式光伏发电项目项
监理技术咨询部

2022 年 04 月 25 日

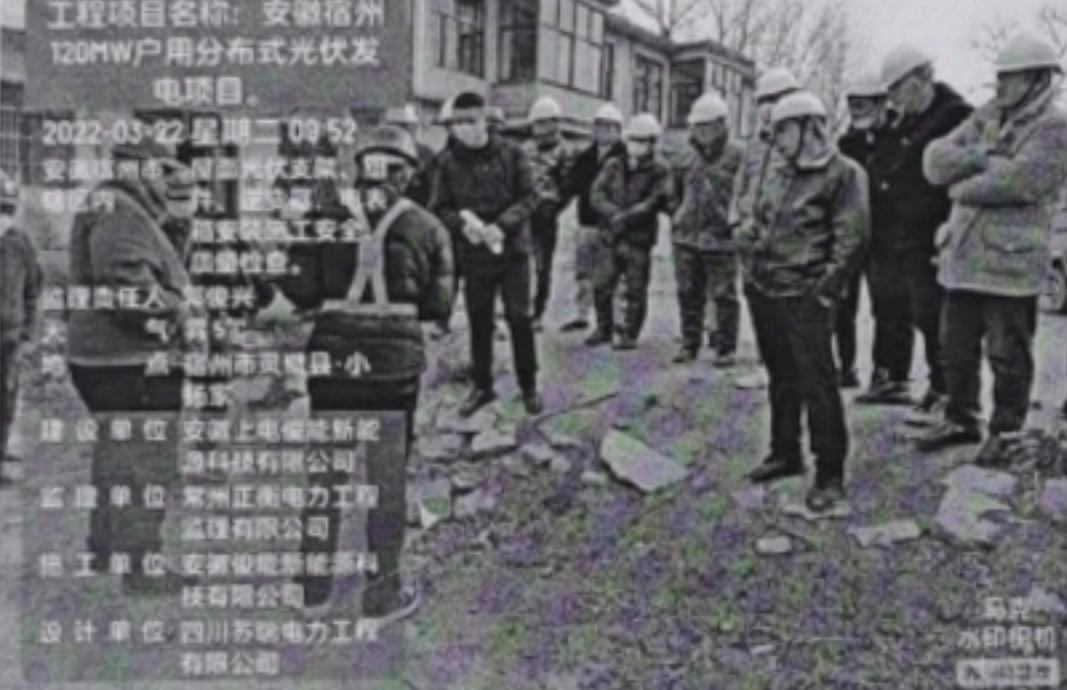
安徽宿州 120MW 户用布式光伏发电项目月报

2022-02-25-2022-3-25 日第 2 期

建设单位：安徽上电俊能新能源科技有限公司	填报周期：2022-02-25-2022-3-25 日																				
一、项目总体建设进度汇总： 1、支架、组件本月完成 436 户，累计安装完成 2068 户，完成率 37.15%。 2、逆变器、电表箱安装本周完成 550 户，累计安装完成 2026 户，完成率 36.4%。 3、并网情况：本月并网 6.29475MW，累计并网 26.46MW，完成占比 22.05%。 4、光伏组件、逆变器累计到场： <table border="1"> <thead> <tr> <th>名 称</th> <th>厂家规格型号</th> <th>本月到货</th> <th>备 注</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>组件</td> <td>中南光电型号 540</td> <td>7679 片</td> <td>累计到货 25139 片，到货占比 90.18%</td> </tr> <tr> <td>组件</td> <td>亿晶光电型号 535</td> <td>6388 片</td> <td>累计到货 36988 片，到货占比 71.56%</td> </tr> <tr> <td>逆变器</td> <td></td> <td>590 台</td> <td>累计到货 38883 台，到货占比 39.06%</td> </tr> <tr> <td>支架</td> <td>荣 诚 创 辉 41×41×2.0</td> <td>302 吨</td> <td>累计到货 1335 吨，到货占比 64.88%</td> </tr> </tbody> </table>		名 称	厂家规格型号	本月到货	备 注	组件	中南光电型号 540	7679 片	累计到货 25139 片，到货占比 90.18%	组件	亿晶光电型号 535	6388 片	累计到货 36988 片，到货占比 71.56%	逆变器		590 台	累计到货 38883 台，到货占比 39.06%	支架	荣 诚 创 辉 41×41×2.0	302 吨	累计到货 1335 吨，到货占比 64.88%
名 称	厂家规格型号	本月到货	备 注																		
组件	中南光电型号 540	7679 片	累计到货 25139 片，到货占比 90.18%																		
组件	亿晶光电型号 535	6388 片	累计到货 36988 片，到货占比 71.56%																		
逆变器		590 台	累计到货 38883 台，到货占比 39.06%																		
支架	荣 诚 创 辉 41×41×2.0	302 吨	累计到货 1335 吨，到货占比 64.88%																		
二、项目安全施工管理。 现场施工安全管控措施基本管控实施到位，安全管理受控。																					
三、下月计划主要工作内容 继续全辖区光伏安装施工。																					

工程现场照片：（含文字描述）

文字描述		
照片		
文字描述		

照片	工程项目名称: 安徽宿州 120MW 户用分布式光伏发电项目。 2022-03-09 星期三 10:54 安徽省宿州市 埇桥光伏支架、组件、逆变器、电表箱安装施工安全、质量检查。 监理单位: 郭俊兴 天气: 晴 地点: 宿州市埇桥区 艺林汽车装饰厂 经纬度: 33.546847N, 117.631212E 建设单位: 安徽上电储能新能源科技有限公司 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 施工单位: 安徽俊能新能源科技有限公司 设计单位: 四川苏瑞电力工程有限公司 	工程项目名称: 安徽宿州 120MW 户用分布式光伏发电项目。 2022-03-18 星期五 08:22 安徽省宿州市 埇桥光伏支架、组件、逆变器、电表箱安装施工安全、质量检查。 监理单位: 郭俊兴 天气: 多云 地点: 宿州市埇桥区 孙圩村 经纬度: 33.546847N, 117.631212E 建设单位: 安徽上电储能新能源科技有限公司 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 施工单位: 安徽俊能新能源科技有限公司 设计单位: 四川苏瑞电力工程有限公司 
文字描述	灵璧县新进场作业人员现场安全教育	
照片	工程项目名称: 安徽宿州 120MW 户用分布式光伏发电项目。 2022-03-22 星期二 09:52 安徽省宿州市 埇桥光伏支架、组件、逆变器、电表箱安装施工安全、质量检查。 监理单位: 郭俊兴 天气: 晴 地点: 宿州市灵璧县 小杨庄 经纬度: 33.546847N, 117.631212E 建设单位: 安徽上电储能新能源科技有限公司 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 施工单位: 安徽俊能新能源科技有限公司 设计单位: 四川苏瑞电力工程有限公司 	工程项目名称: 安徽宿州 120MW 户用分布式光伏发电项目。 2022-03-07 星期一 11:45 安徽省宿州市 埇桥光伏支架、组件、逆变器、电表箱安装施工安全、质量检查。 监理单位: 郭俊兴 天气: 晴 地点: 宿州市埇桥区 孙圩村 经纬度: 33.546847N, 117.631212E 建设单位: 安徽上电储能新能源科技有限公司 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 施工单位: 安徽俊能新能源科技有限公司 设计单位: 四川苏瑞电力工程有限公司 
文字描述		
照片	工程项目名称: 安徽宿州 120MW 户用分布式光伏发电项目。 2022-03-22 星期二 11:05 安徽省宿州市 埇桥光伏支架、组件、逆变器、电表箱安装施工安全、质量检查。 监理单位: 郭俊兴 天气: 多云 地点: 宿州市灵璧县 杨寨 经纬度: 33.546847N, 117.631212E 建设单位: 安徽上电储能新能源科技有限公司 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 施工单位: 安徽俊能新能源科技有限公司 设计单位: 四川苏瑞电力工程有限公司 	工程项目名称: 安徽宿州 120MW 户用分布式光伏发电项目。 2022-03-09 星期三 11:01 安徽省宿州市 埇桥光伏支架、组件、逆变器、电表箱安装施工安全、质量检查。 监理单位: 郭俊兴 天气: 晴 地点: 宿州市埇桥区 孙圩村 经纬度: 33.546847N, 117.631212E 建设单位: 安徽上电储能新能源科技有限公司 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 施工单位: 安徽俊能新能源科技有限公司 设计单位: 四川苏瑞电力工程有限公司 
