

安徽宿州 120MWp 户用分布式光伏发电项目

项目监理月报

(第六期)

2022-06-26-2022-08-30



安徽宿州 120MWp 户用分布式光伏发电项目项
监理技术咨询部

2022 年 08 月 30 日

安徽宿州 120MW 户用布式光伏发电项目月报

2022 年 08 月 31 日第 6 期

建设单位：安徽上电俊能新能源科技有限公司

填报周期：2022.06.26-2022.08.30 日

一、项目总体建设进度汇总：

- 1、支架、组件本月完成 137 户，累计安装完成 3052 户，完成率 54.35%。
- 2、逆变器、电表箱安装本月完成 173 户，累计安装完成 2994 户，完成率 52.85%。
- 3、并网情况：本月并网 6.99MW，累计并网 49.014MW，完成占比 40.85%。
- 4、本月项目受疫情影响较大，进度缓慢。
- 5、光伏组件、逆变器累计到场：

名 称	厂家规格型号	本月到货	备 注
组件	中南光电型号 540	5287 片	累计到货 51683 片，到货占比 100% 第一批供货合同完成。
组件	亿晶光电型号 535	859	累计到货 65983 片，到货占比 100% 第一批供货合同完成。
逆变器		199 台	累计到货 4520 台，到货合同占比 72.02%
支架	荣 诚 创 辉 41×41×2.0	61 吨	累计到货 2085 吨，到货合同占比 54.41%

二、项目安全施工管理。

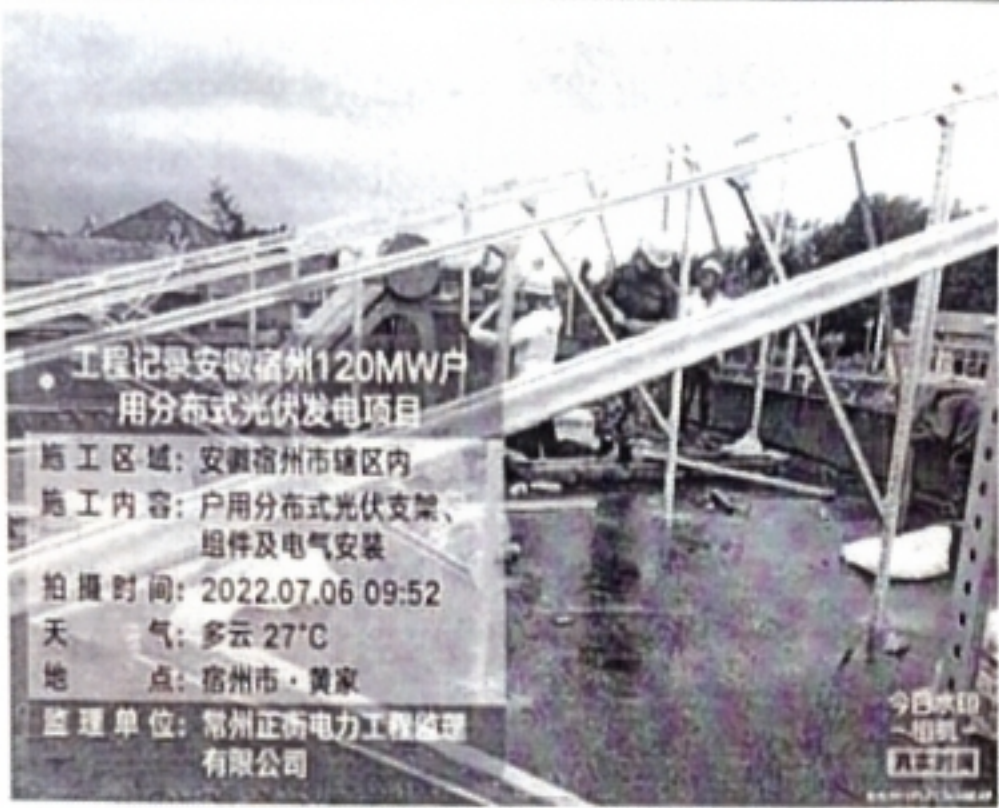
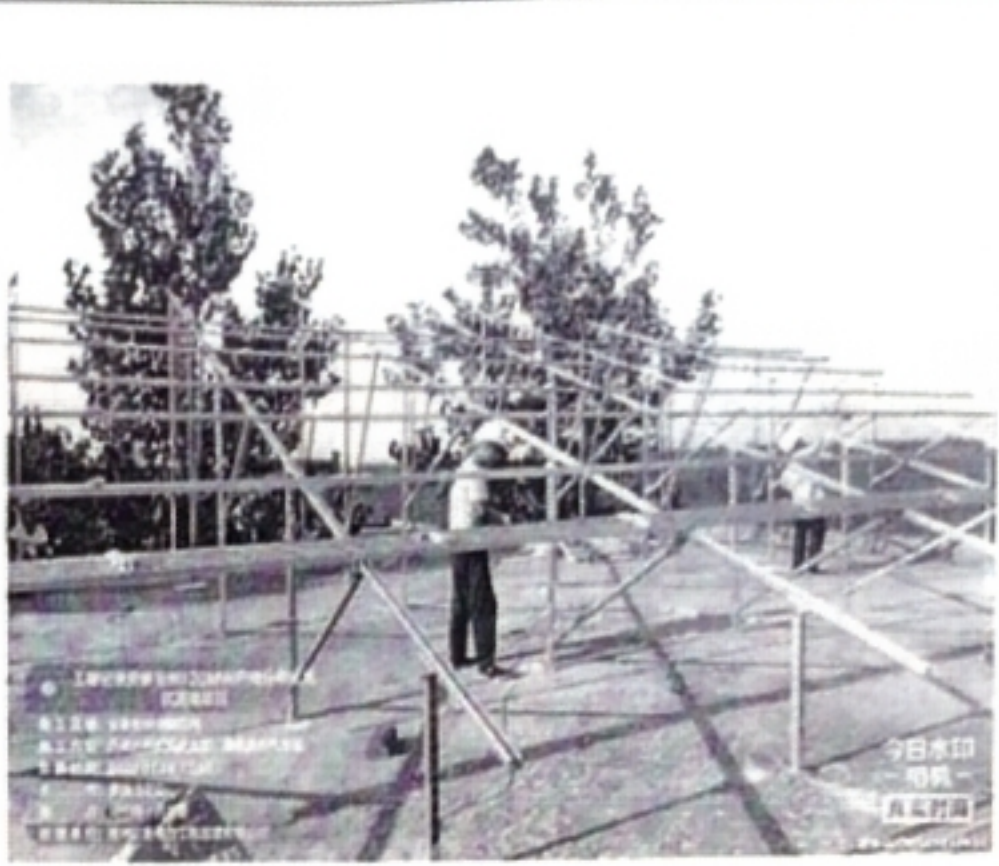
现场施工安全管控措施基本管控实施到位，安全管理受控。

三、下月计划主要工作内容

继续全辖区光伏安装施工。

工程现场照片：（含文字描述）

文字描述	照片
工程记录安徽宿州120MW户用分布式光伏发电项目 施工区域：安徽宿州市辖区内 施工内容：户用分布式光伏支架、组件及电气安装 拍摄时间：2022.07.05 09:11 天气：多云 27℃ 地点：宿州市·霸王郢孜 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司	 工程记录安徽宿州120MW户用分布式光伏发电项目 施工区域：安徽宿州市辖区内 施工内容：户用分布式光伏支架、组件及电气安装 拍摄时间：2022.07.02 17:03 天气：多云 34℃ 地点：宿州市·149乡道 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

文字描述		
照片		
文字描述		
照片		
文字描述		
照片		
