

安徽宿州 120MWp 户用分布式光伏发电项目

项目监理月报

(第七期)

2022-06-26-2022-08-30



安徽宿州 120MWp 户用分布式光伏发电项目项
监理技术咨询部

2022 年 08 月 30 日

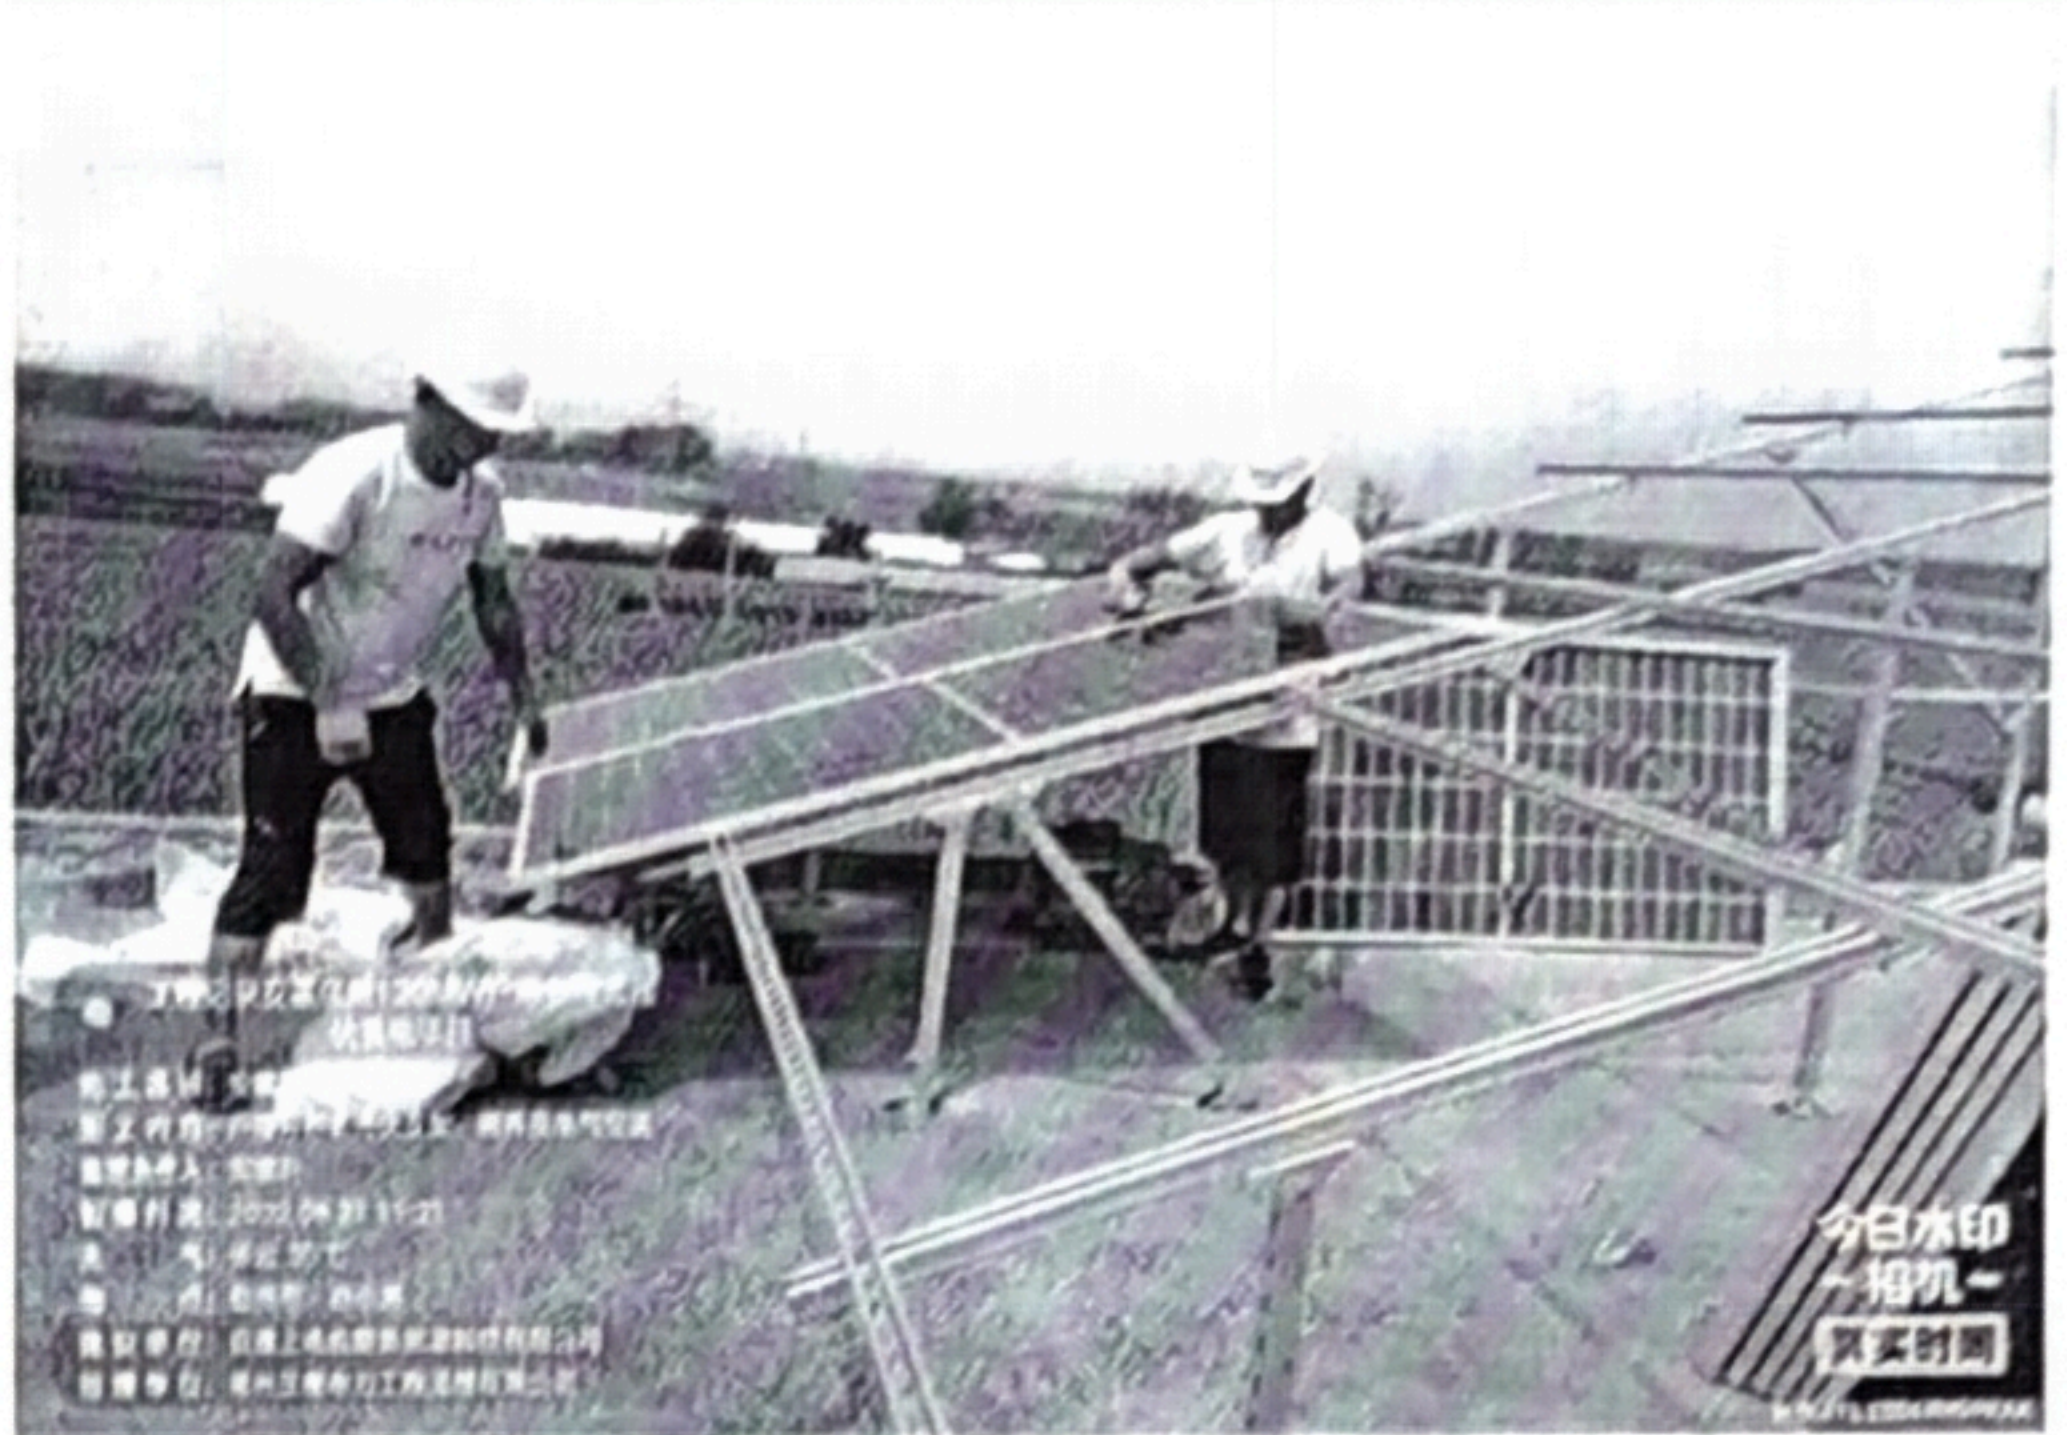
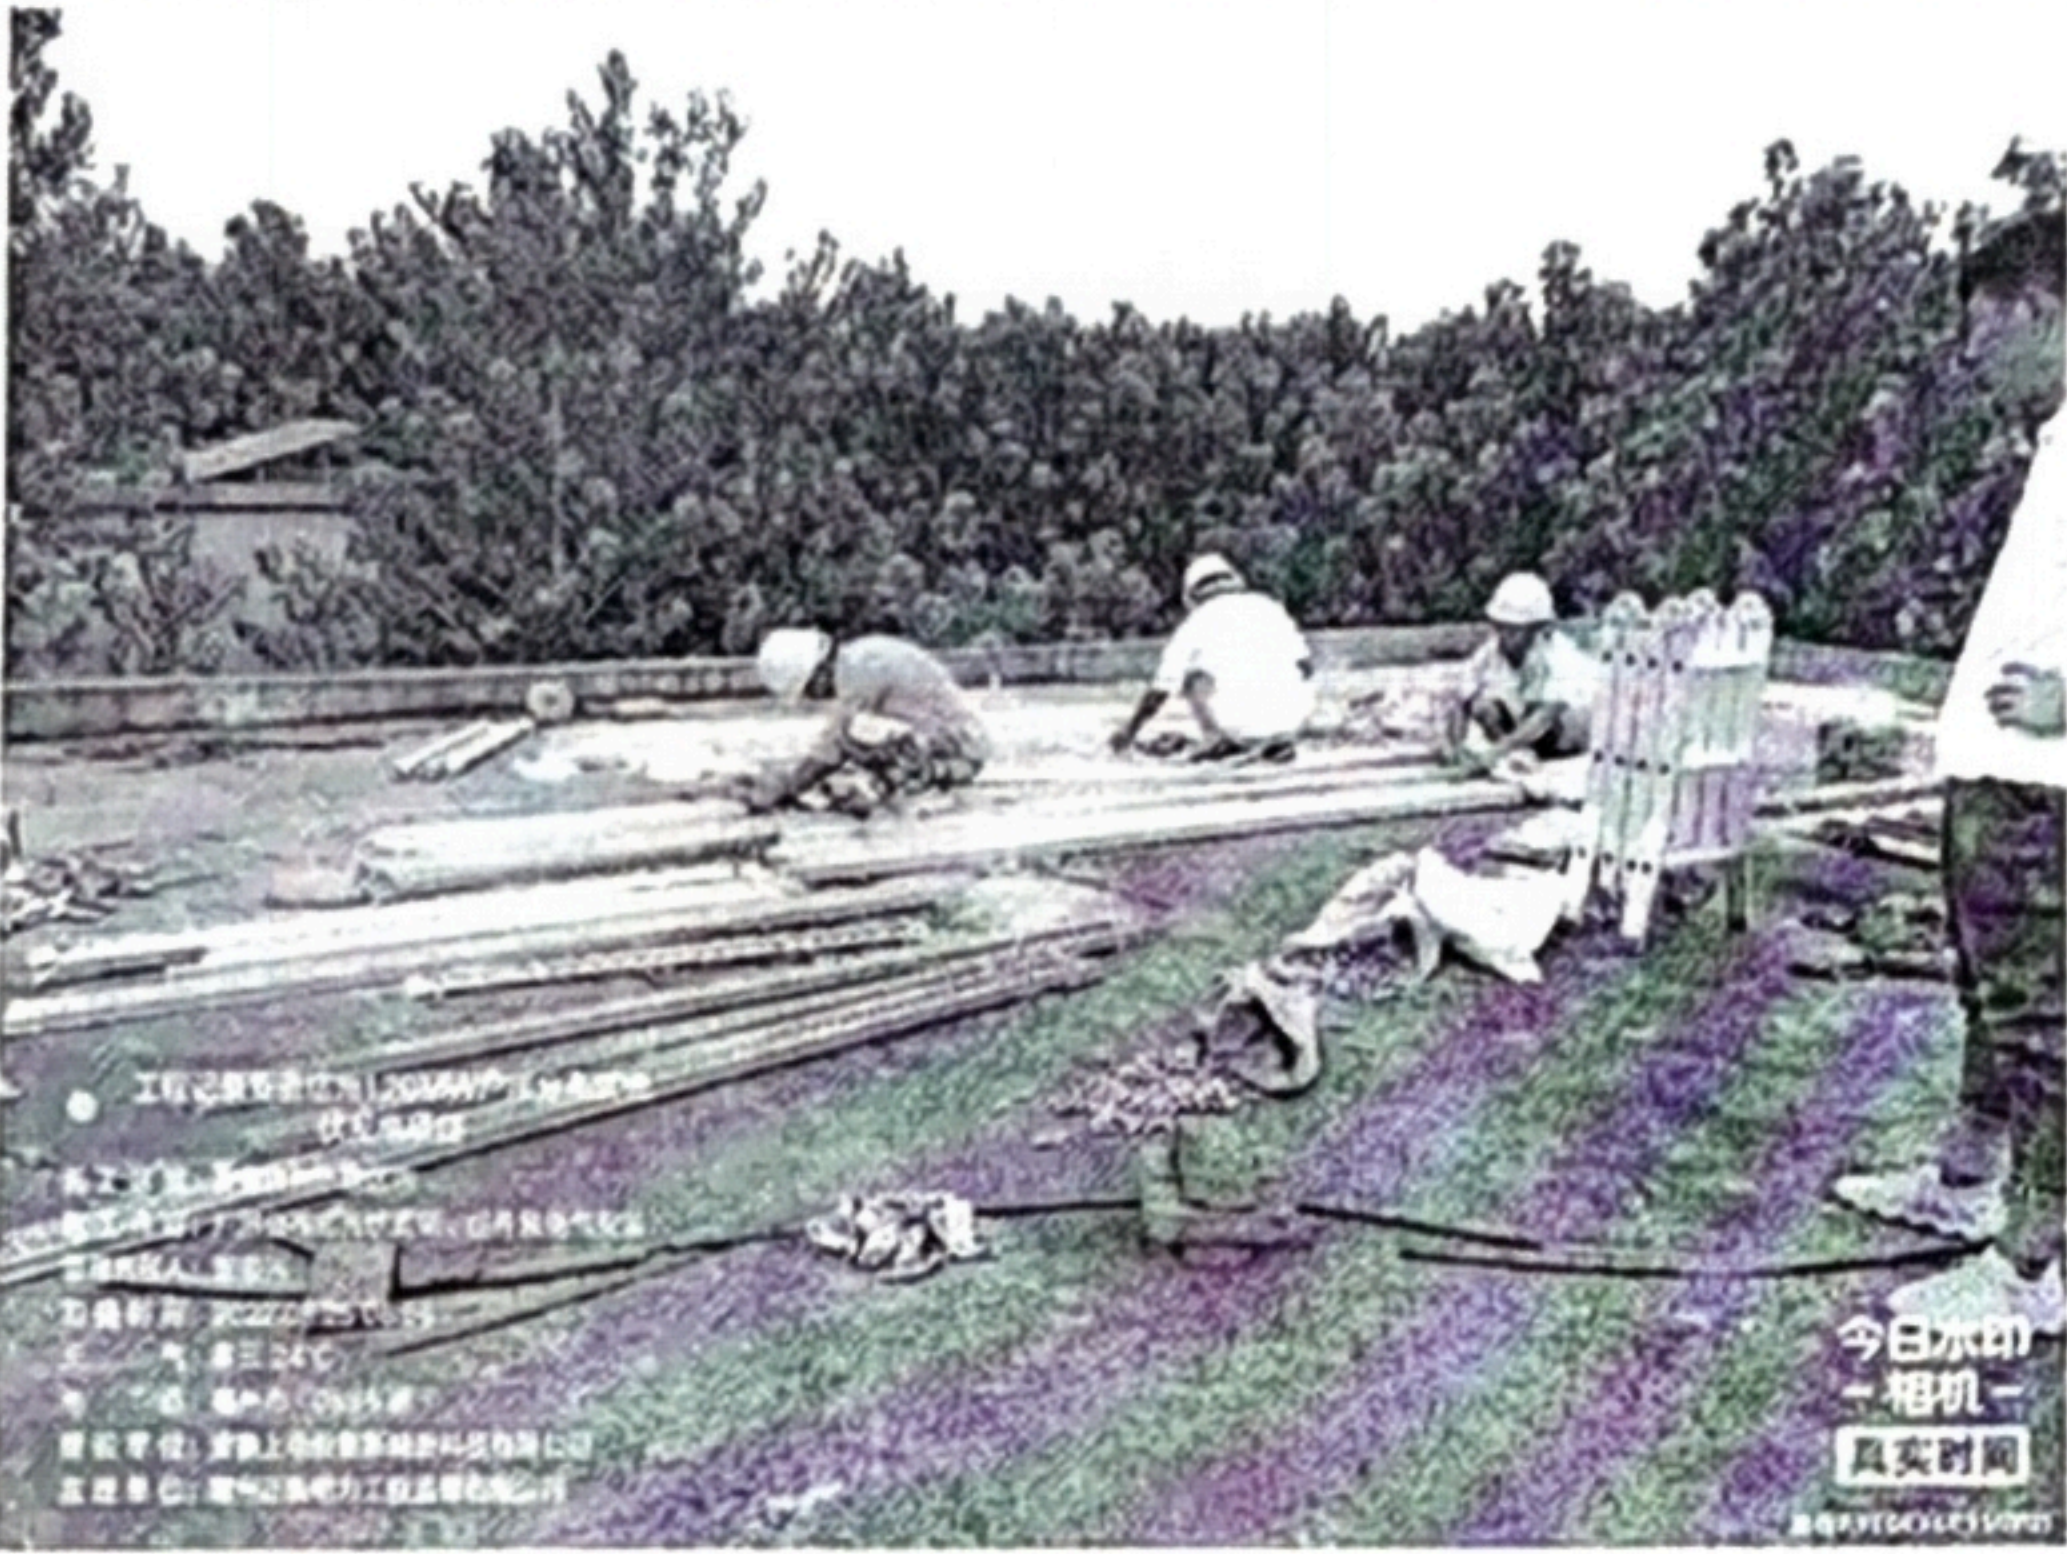
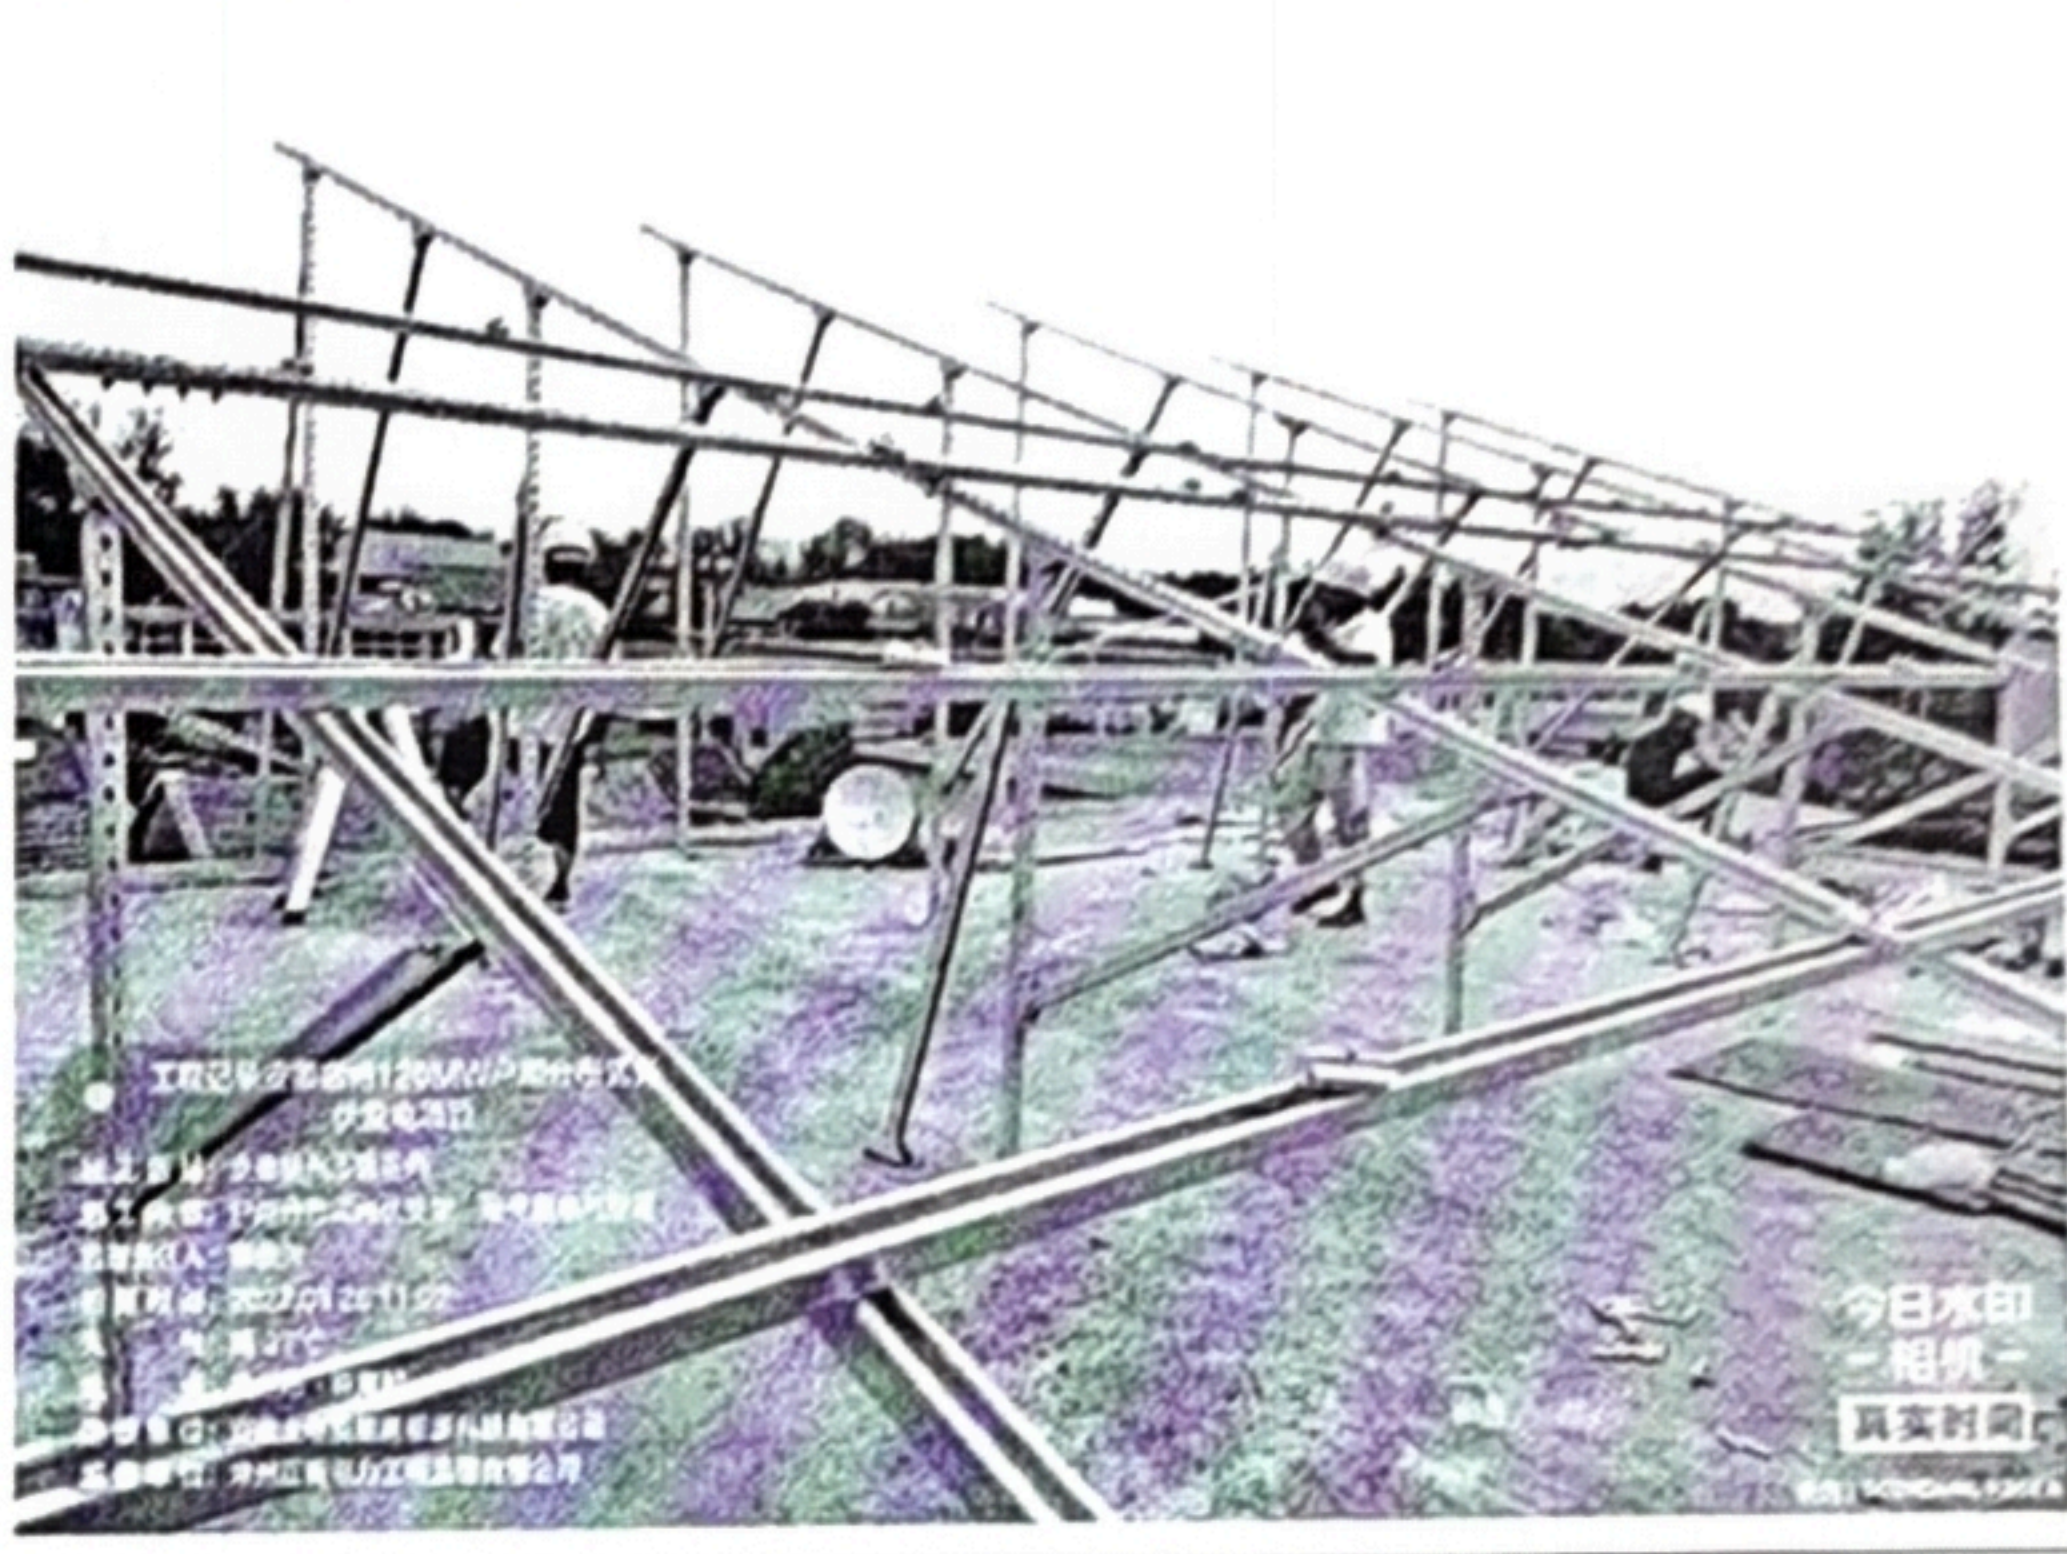
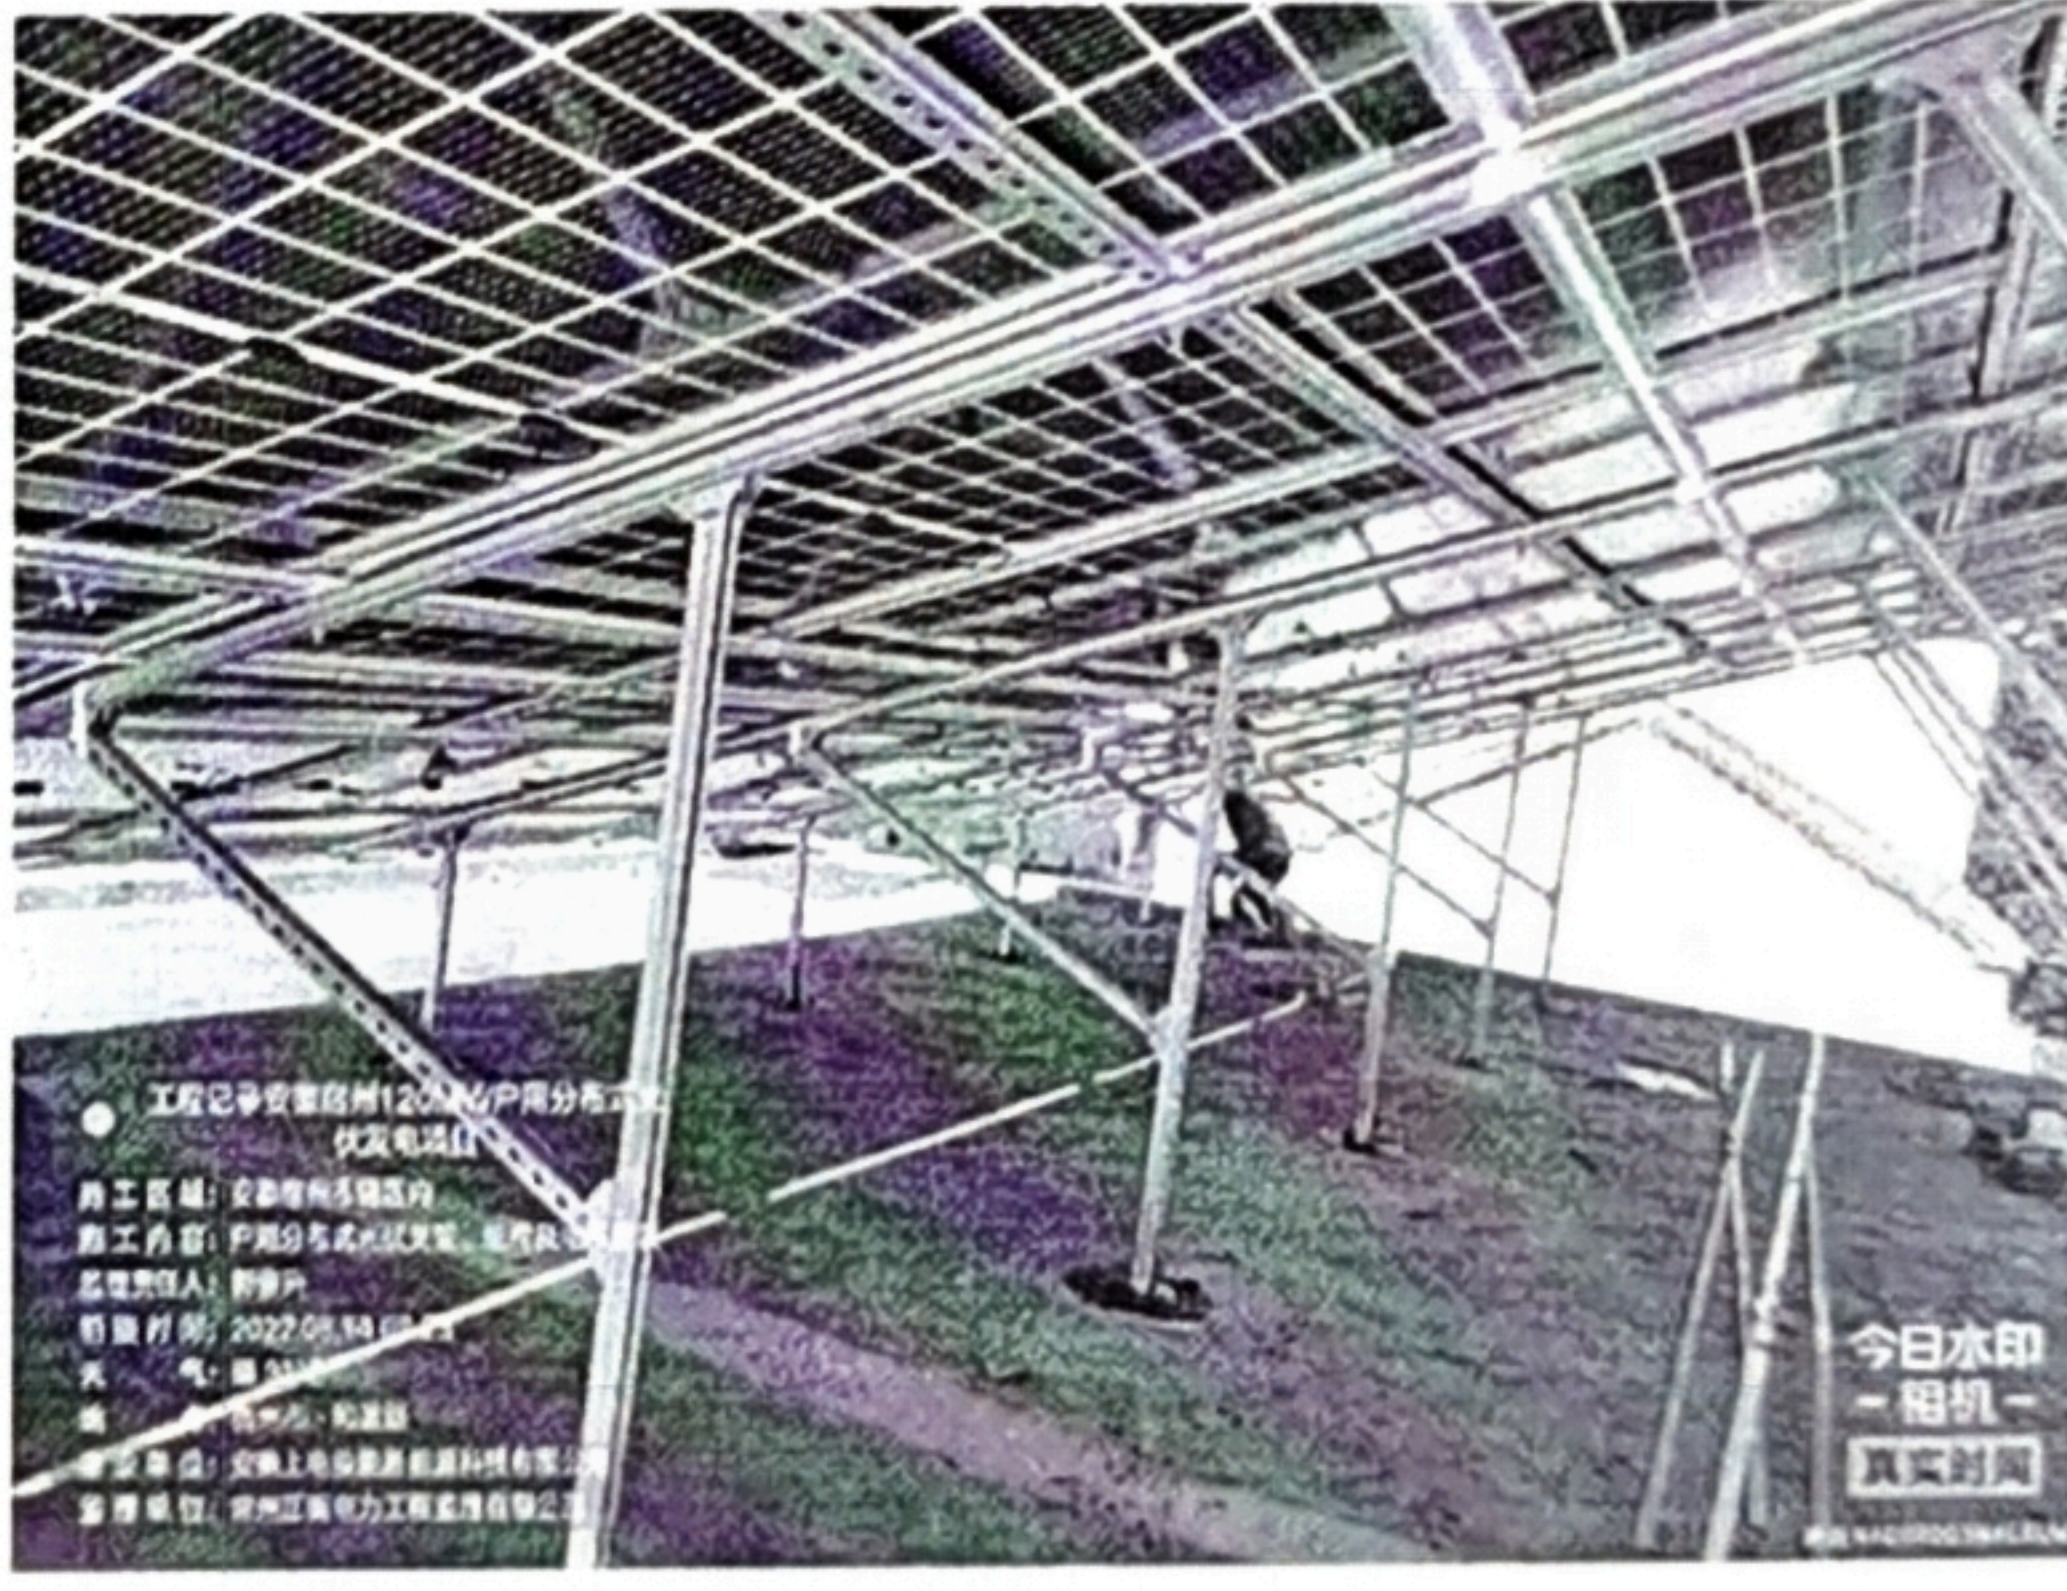
安徽宿州 120MW 户用布式光伏发电项目月报

2022 年 08 月 30 日第 7 期

建设单位：安徽上电俊能新能源科技有限公司		填报周期：2022.07.26-2022.08.27 日	
一、项目总体建设进度汇总：			
1、支架、组件本月完成 193 户，累计安装完成 3248 户，完成率 54.62%。			
2、逆变器、电表箱安装本月完成 103 户，累计安装完成 3147 户，完成率 55.30%。			
3、并网情况:本月并网 4.970MW，累计并网 53，174MW，完成占比 44.31.%。			
4. 本月项目受疫情影响较大，进度缓慢。			
5、光伏组件、逆变器累计到场：			
名 称	厂家规格型号	本月到货	备 注
组件	中南光电型号 540	5287 片	累计到货 51683 片，到货占比 100% 第一批供货合同完成。
组件	亿晶光电型号 535	4900 片	累计到货 65983 片，到货占比 100% 第一批供货合同完成。第二批合同 到货占比 8.13%。
逆变器		199 台	累计到货 4520 台，到货合同占比 72.02%
支架	荣 诚 创 辉 41×41×2.0	183 吨	累计到货 2310 吨，到货合同占比 57.18%
二、项目安全施工管理。			
现场施工安全管控措施基本管控实施到位，安全管理受控。			
三、下月计划主要工作内容			
继续全辖区光伏安装施工。			

工程现场照片：（含文字描述）

文字描述		
照片		

文字描述		
照片	 工程记录安徽宿州120MW户用分布式光伏项目 施工区：安徽宿州埇桥区 施工内容：户用分布式光伏安装、光伏支架安装 项目负责人：李俊峰 拍摄时间：2022.05.23 14:00 天气：晴 24℃ 地点：埇桥区 埇桥街道李俊峰家 监理单位：安徽上能新能源科技有限公司 监理单位：宿州江能电力工程有限公司 今日水印相机 真实时间	 工程记录安徽宿州120MW户用分布式光伏项目 施工区：安徽宿州埇桥区 施工内容：户用分布式光伏安装、光伏支架安装 项目负责人：李俊峰 拍摄时间：2022.05.23 11:20 天气：晴 24℃ 地点：埇桥区 埇桥街道李俊峰家 监理单位：安徽上能新能源科技有限公司 监理单位：宿州江能电力工程有限公司 今日水印相机 真实时间
文字描述		
照片	 工程记录安徽宿州120MW户用分布式光伏项目 施工区：安徽宿州埇桥区 施工内容：户用分布式光伏安装、光伏支架安装 项目负责人：李俊峰 拍摄时间：2022.05.23 11:20 天气：晴 24℃ 地点：埇桥区 埇桥街道李俊峰家 监理单位：安徽上能新能源科技有限公司 监理单位：宿州江能电力工程有限公司 今日水印相机 真实时间	 工程记录安徽宿州120MW户用分布式光伏项目 施工区：安徽宿州埇桥区 施工内容：户用分布式光伏安装、光伏支架安装 项目负责人：李俊峰 拍摄时间：2022.05.23 11:20 天气：晴 24℃ 地点：埇桥区 埇桥街道李俊峰家 监理单位：安徽上能新能源科技有限公司 监理单位：宿州江能电力工程有限公司 今日水印相机 真实时间
文字描述		
照片	 工程记录安徽宿州120MW户用分布式光伏项目 施工区：安徽宿州埇桥区 施工内容：户用分布式光伏安装、光伏支架安装 项目负责人：李俊峰 拍摄时间：2022.05.23 11:20 天气：晴 24℃ 地点：埇桥区 埇桥街道李俊峰家 监理单位：安徽上能新能源科技有限公司 监理单位：宿州江能电力工程有限公司 今日水印相机 真实时间	 工程记录安徽宿州120MW户用分布式光伏项目 施工区：安徽宿州埇桥区 施工内容：户用分布式光伏安装、光伏支架安装 项目负责人：李俊峰 拍摄时间：2022.05.23 11:20 天气：晴 24℃ 地点：埇桥区 埇桥街道李俊峰家 监理单位：安徽上能新能源科技有限公司 监理单位：宿州江能电力工程有限公司 今日水印相机 真实时间
