



正衡监理

编号: ZHJL-YB-001

监 理 月 报

工程名称: 扬州申曜新能源科技有限公司天富龙后续 4MW 分
布式光伏发电项目

2022 年 6 月

项目监理部 (章):

总监理工程师



日期: 2021 年 6 月 30 号



扫描全能王 创建

监 理 月 报

开始时间 2022 年 6 月 17日 结束日期 2022 年 6 月 30 日

一、 监理重点工作情况

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度	主要工作	1、开工资料审批,项目开工。 2、图纸会审,设计交底。 3、施工人员三级教育落实完毕。技术安全交底完成。 4、内饰厂区厂房加固。 5、威英厂区厂房加固。 6、入场材料开箱检验。 7、内饰厂区支架、组件安装。 8、安全、消防防护措施检查。	1. 内饰厂区支架安装、组件安装。 2. 桥架,直流电缆、接地网敷设。 3、逆变器、并网柜安装。 4、内饰厂区厂房加固。 5、威英厂区厂房加固。 6、安全、隐蔽旁站 7、过程资料审批,分项工程验收。 8、安全、消防防护措施检查。 9、疫情防控。
	设备交付进度	1、支架全部到场。 2、直流电缆全部到货。 3、组件到货 60 箱。 4、逆变器到货 18 台。 5、通讯模块 20 台; 6、加固檩条、钢管斜撑、扁钢全部到场。	1、天富龙内饰组件全部到货,交流电缆到货,桥架、检修通道全部到货。 2、威英 3#厂房预制块到位
	设计交付进度	图纸完成	最终图纸移交
	质量体系运作情况	质量体系健全,运行良好	落实质量保证体系,并对运行情况进行检查
	施工图会审	完成	
	设计交底	完成	
	方案审查	开工资料审查完成	审查过程资料
	技术交底	完成	
	设计变更	目前现场先按图纸施工	若有变更及时解决
安全	安全培训情况	进场员工已进行安全培训	督促施工单位对进场新员工进行安全教育,安全文明施工落实。
	安全交底情况	督促施工单位对危险作业点进行班前交底	继续督促施工单位进行班前交底
	安全措施落实情况	场地安装及用电安全都已落实	吊装、防火、带电设备安全警示
	安全文明施	现场安全、文明措施良好	加强现场安全管理力度



	工情况		
质量	主要工序质量	严格按照设计及规范要求监管。	强制性质量问题绝不放过
	主要原材料质量	主要材料进行质量检查	把控好材料进场质量问题
	构(配)件质量	把控好进场材料质量关	严抓构配件质量问题
	设备质量	按照要求进行质量验收	查看进场设备合格证书
	质量验评情况	1、组件安装压块压接不实，放线偏差超过规范要求。	要求施工单位及时整改消缺。

二、本月进度情况

- 1 天富龙二期项目开工资料审批、项目部建立完毕，17 号项目开工。
- 2、项目质量安全会议召开，施工人员三级教育落实完毕。安全交底完成。
- 3、天富龙内饰厂区 101 厂房加固完成 70%，光伏夹具安装完毕，檩条分散完成。
- 4、天富龙内饰厂区 102 厂房加固工程开始施工，斜撑安装 5%。
- 5、天富龙 201 厂房夹具、支架安装完毕，组件吊装 29 箱，组件安装 880 片。
- 6、威英化纤 1#厂房钢柱焊接、檩条安装加固完毕。
- 7、支架、檩条、开箱检验完毕。组件到场检测完毕。
- 8、本周安徽、南京爆发疫情，加固人员生源地、行程码涉及疫区，已按照政府命令居家隔离，加固人员暂时无法施工。(2022、6、28 日起)

三、下月进度计划

- 1、天富龙内饰组件全部到货，交流电缆到货，桥架、检修通道到货安装；
- 2、天富龙内饰 101 厂房支架安装完毕，组件安装 50%；
- 3、天富龙内饰 102 厂房加固完成，支架安装完成，组件安装 50%。
- 4、天富龙 201 厂房组件安装完毕，桥架施工，直流电缆放线完成，交流电缆放线完成。逆变器安装完成；
- 5、威英 3#厂房预制块到位安装。



四、安全文明施工情况

事故（起）			编制安全策	施工	施工单位
人身重伤	机械设备	电网事故	划文件（份）	人数	数量
无	无	无	1 份	20 人	1
施工安全 文明交底	每日班前 会已交代	施工现场文明施工情况		良好	

五、施工重点工作情况


专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	1、开工资料报审，项目开工。 2、图纸会审，设计交底。 3、质量安全会议召开，施工人员三级教育落实完毕。技术安全交底完成。 4、天富龙内饰厂区 101 厂房加固完成 70%，光伏夹具安装完毕，檩条分散完成。 5、天富龙内饰厂区 102 厂房加固工程开始施工，斜撑安装 5%。 6、天富龙 201 厂房夹具、支架安装完毕，组件吊装 29 箱，组件安装 880 片。 7、威英化纤 1#厂房钢柱焊接、檩条安装加固完毕。 8、安全、消防防护措施落实。	1、天富龙内饰组件全部到货，交流电缆到货，桥架、检修通道到货安装； 2、天富龙内饰 101 厂房支架安装完毕，组件安装 50%； 3、天富龙内饰 102 厂房加固完成，支架安装完成，组件安装 50%。 4、天富龙 201 厂房组件安装完毕，桥架施工，直流电缆放线完成，交流电缆放线完成。逆变器安装完成； 5、威英 3#厂房预制块到位安装。
安全管理	施工人员安全帽佩戴，反光服穿着，吊装安全管理，现场防火措施落实。	安全吊装、屋面临时用电安全，动火作业等。
质量管理	发现有质量问题并要求施工方整改	发现有质量问题并要求施工方整改，整改完成后，进行查验。



技术管理	参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，监督检查执行情况。	检查现场施工质量
物资供应	督促施工单位进行	

附图

组件安装

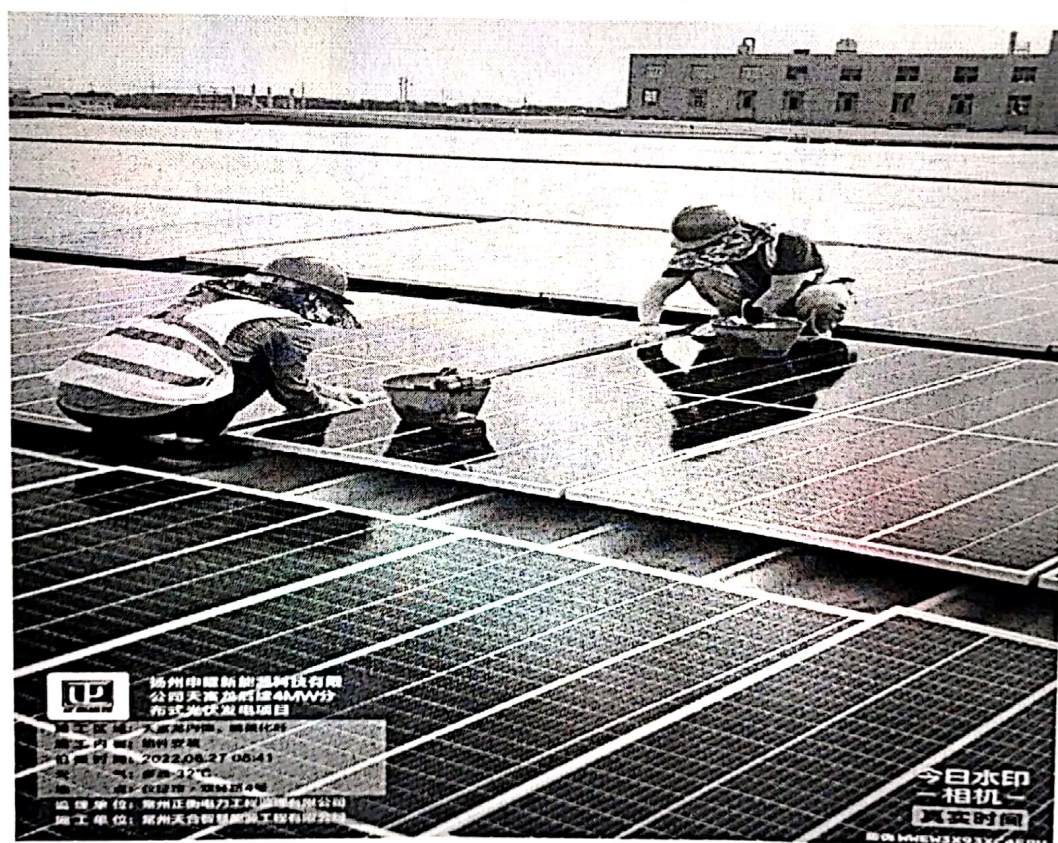


扫描全能王 创建


屋顶加固



组件入场检测

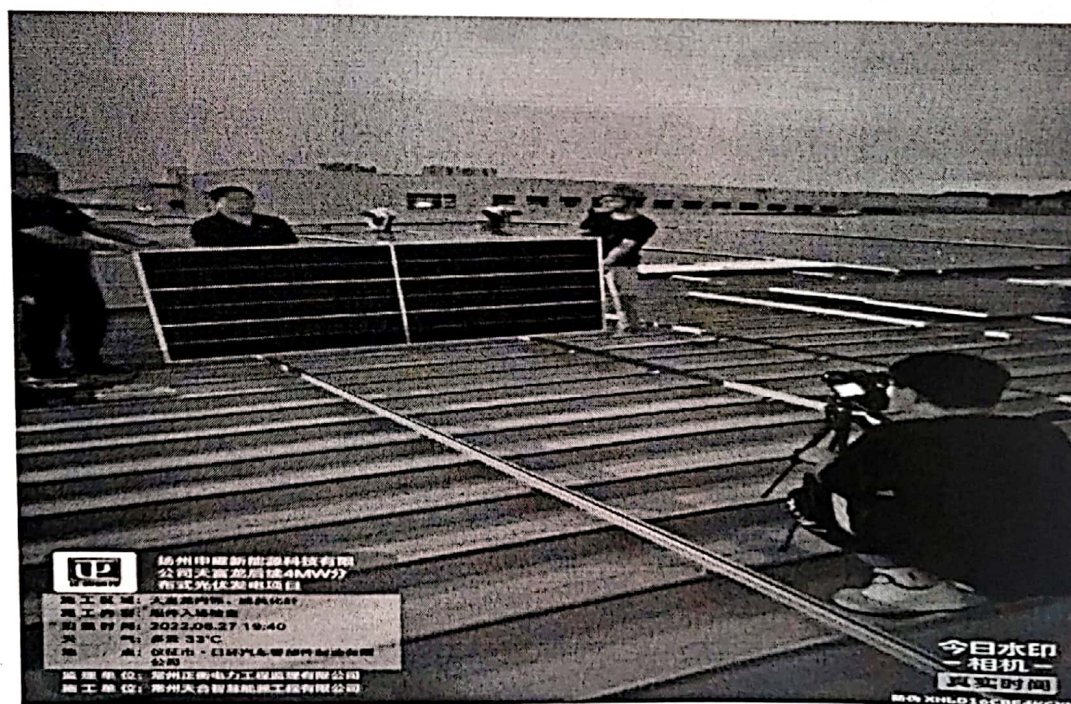

组件吊装

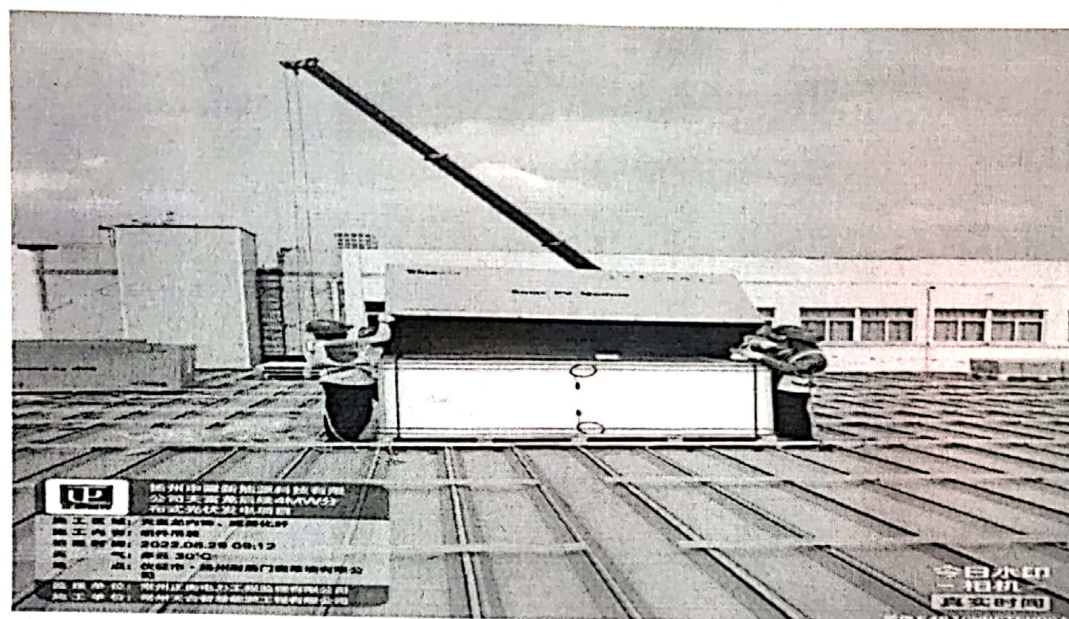

抗拉实验

